



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

**CODIGO:** 040103  
**REGIÓN:** ENRIQUILLO  
**PROVINCIA:** BARAHONA  
**MUNICIPIO:** BARAHONA  
**DISTRITO MUNICIPAL:** LA GUÁZARA

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 4 de mayo de 2023

**TÉCNICOS:** 1. Ing. Edward Acosta  
 2. Arq. Zunilda Del Rosario

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m <sup>2</sup> )	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	SECTOR LA CARRETERA, CALLE DUARTE	142.50	1.00	2	11.05	2	284.54	22.1
TRAMO B	SECTOR EL 3, CALLE BERTA PIMENTEL	194.90	1.01	2			394.36	
TRAMO C	SECTOR EL 3, CALLE SR. GILBERTO FELIZ				71.85	2		143.7
TRAMO D	SECTOR LOS MAMEYES, CALLE ROSENDO GARO	115.40	1.03	2			237.56	
TRAMO E	SECTOR LOS MAMEYES, CALLE RAFAEL GARO	21.50	1.19	2	17.8	2	51.18	35.6
TRAMO F	SECTOR BARRIO LOS MAESTROS, CALLE RAMONA FELIZ				80.55	2		161.1
TRAMO G	SECTOR LA Q, CALLE 1				121.5	2		243
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
<b>Total</b>							<b>967.64</b>	<b>605.50</b>

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,811,766.33  
 Monto desembolsado RD\$ 2,811,766.34 (100%)  
 Avance de obra 99.34%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: ENRIQUILLO  
PROVINCIA: BARAHONA  
MUNICIPIO: BARAHONA  
DISTRITO MUNICIPAL: LA GUÁZARA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 4 de mayo de 2023


## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 967.64 metros cuadrados de aceras y 605.50 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

## NOTAS


1. Las aceras y contenes se construyeron bajo los parámetros de construcción recomendados.
2. Se construyeron más aceras que contenes debido a que en muchos tramos ya existían contenes.

## IMÁGENES

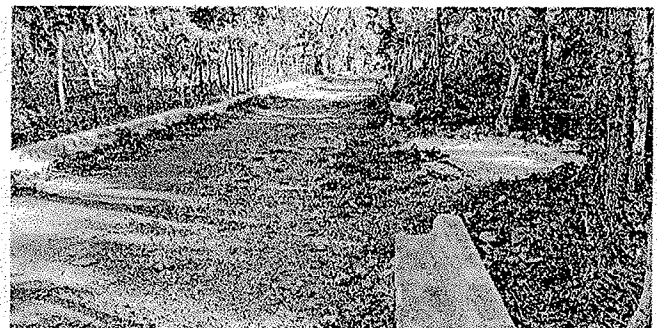





# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

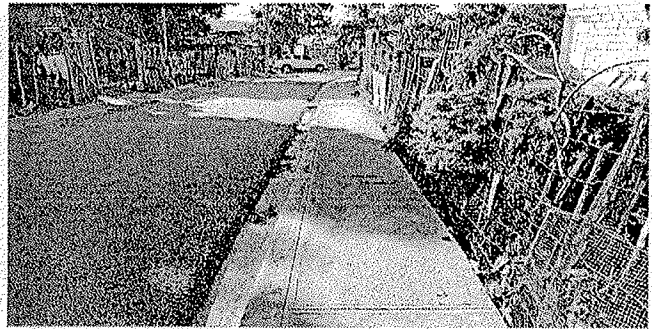

Suministra los datos de este reporte,

  
ING. EDWARD ACOSTA  
Técnico

  
ARQ. ZUNILDA DEL ROSARIO  
Técnico
