

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 040501

REGIÓN: ENRIQUILLO

PROVINCIA: BARAHONA

MUNICIPIO: VICENTE NOBLE

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 23 de marzo de 2023

TÉCNICOS:

1. Ing. Ana Indhira Ramírez

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE JOSE DE JESUS OTAÑO PARTE ATRÁS	76.90	1.00	1	65.15	2	76.9	130.3
TRAMO B	CALLE JOSE DE JESUS OTAÑO PARTE ATRÁS	70.25	1.00	2	70.25	2	140.5	140.5
TRAMO C	CALLE JOSE DE JESUS OTAÑO PARTE ATRÁS				65.40	1		65.4
TRAMO D	CARRETERA VICENTE NOBLE BARAHONA	355.70	1.00	1	355.70	1	355.7	355.7
TRAMO E	BARRIO LA 40 CALLE A				206.7	2		413.4
TRAMO F	BARRIO LA 40 CALLE B				41.9	1		41.9
TRAMO G	BARRIO LA 40 CALLE C				71.2	2		142.4
TRAMO H	BARRIO LA 40 CALLE D				267.6	2		535.2
TRAMO I	BARRIO LA 40 CALLE E	121.10	1.00	1	111.1	1	121.1	111.1
TRAMO J								
TOTAL							694.20	1935.90


AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,846,529.73

Monto desembolsado RD\$ 3,846,529.74 (100%)

Avance de obra 153.22%

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA



SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 23 de marzo de 2023



REGIÓN: ENRIQUILLO
PROVINCIA: BARAHONA
MUNICIPIO: VICENTE NOBLE
DISTRITO MUNICIPAL: -

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 694,20 metros cuadrados de aceras y 1,935,90 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Este ayuntamiento está construyendo por contrato.
2. Este tiene construido mas contenes que aceras y la alcaldesa nos informó que están esperando el programa de asfaltado.
3. En este recorrido estuvo presente al momento de la visita la alcaldesa Sr. Marlies Novas Labourt.

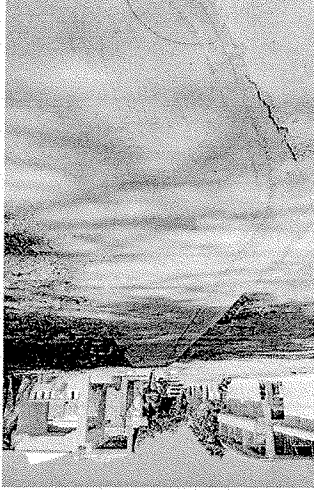




IMÁGENES

Suministra los datos de este reporte,

Ing. Ana Ramirez
ING. ANA INDIRA RAMIREZ

Técnico

Técnico

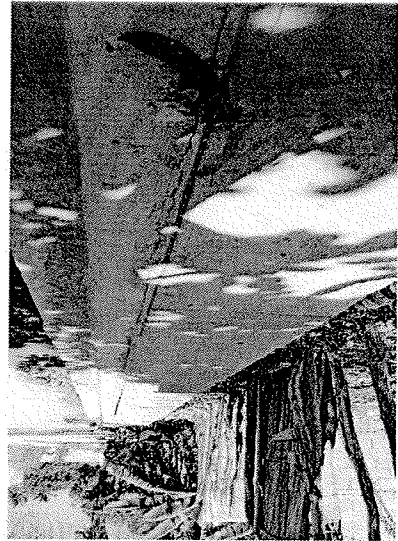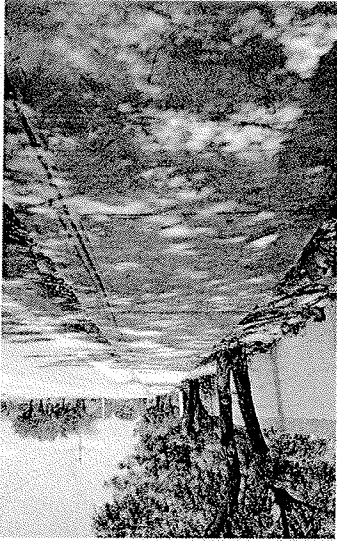

—DOMINICANA—
LIGA MUNICIPAL

