



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CODIGO: 040502

REGIÓN: ENRIQUILLO

PROVINCIA: BARAHONA

MUNICIPIO: VICENTE NOBLE

DISTRITO MUNICIPAL: CANOA

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 19/05/2022


1. Ing. Danilo Mercado

TÉCNICOS: 2. Elisabeht Aguilera

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/PRINCIPAL Li (PROXIMO AL LICEO)	31.76	0.70	1	31.76	1	22.232	31.76
TRAMO B	C/PRINCIPAL Li (PROXIMO AL LICEO)	76.90	0.88	1	77.30	1	67.672	77.3
TRAMO C	C/PRINCIPAL Li (PROXIMO AL LICEO)	271.90	0.75	1	271.90	1	203.925	271.9
TRAMO D	C/PRINCIPAL Li (PROXIMO AL LICEO)	51.10	0.72	1	53.1	1	36.792	53.1
TRAMO E	C/PRINCIPAL Li (PROXIMO AL LICEO)	26.20	0.80	1	29.9	1	20.96	29.9
TRAMO F	C/PRINCIPAL Li (PROXIMO AL LICEO)	32.30	0.80	1	35.5	1	25.84	35.5
TRAMO G	C/PRINCIPAL Li (PROXIMO AL LICEO)	68.60	0.85	1	72	1	58.31	72
Total							435.731	571.46

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado	RD\$ 3,038,002.20	
Monto desembolsado	RD\$ 1,519,001.11	50%
Avance de obra	66.88%	



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: ENRIQUILLO

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 19/05/2022

PROVINCIA: BARAHONA

MUNICIPIO: VICENTE NOBLE

DISTRITO MUNICIPAL: CANOA


## REPORTE

A la fecha de 19/05/2022 se ha ejecutado 435.73 metros cuadrados de aceras y 571.46 metros lineales de contén, lo que corresponde al 66.88% del fondo asignado para este territorio.

## NOTAS

1. Se construirán aceras con un ancho promedio de 0.85 mt.

## IMÁGENES

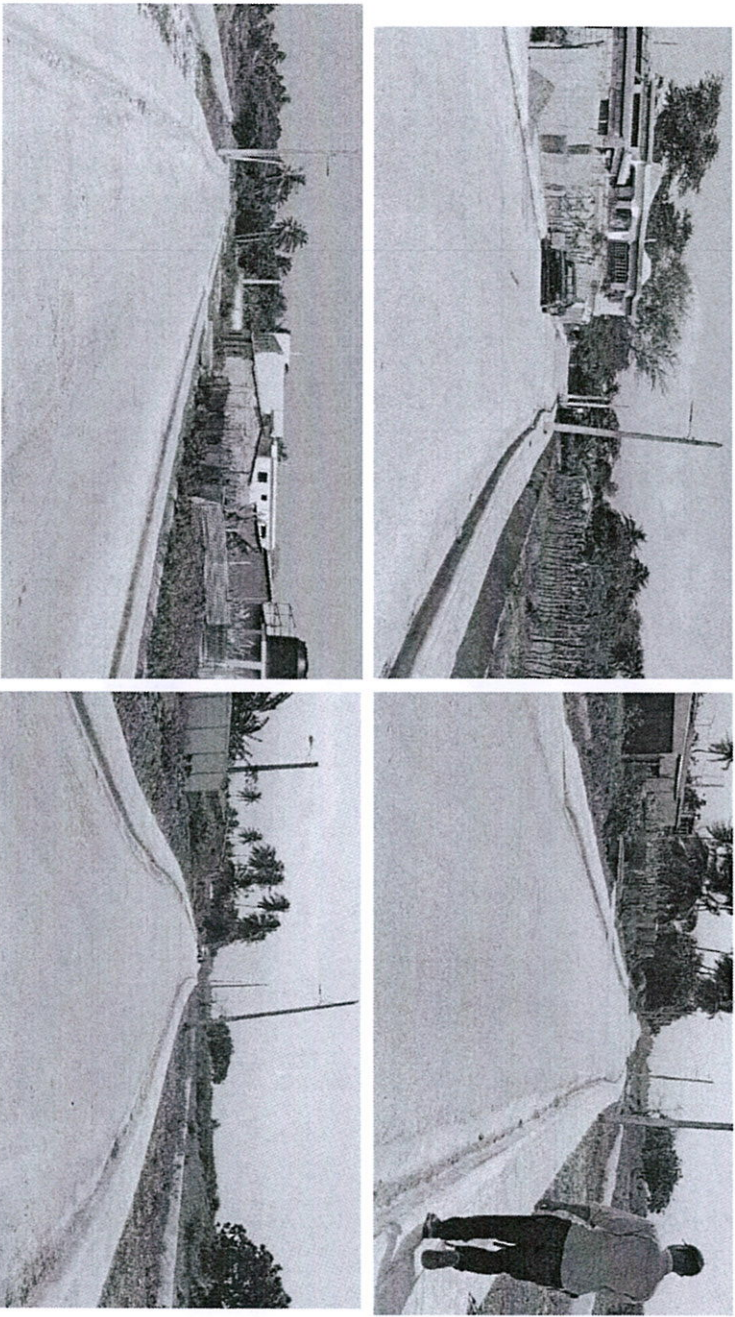

Suministra los datos de este reporte,

  
ING. DANILO MERCADO  
Técnico

  
ELISABETH AGUILERA  
Técnico

