

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 040901

REGIÓN: ENRIQUILLO

PROVINCIA: BARAHONA

MUNICIPIO: LAS SALINAS

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 6 de octubre de 2022

1. Ing. Staylin Mendoza

2. Ing. Camila Moya

TÉCNICOS:

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	SECTOR MEJORAMIENTO SOCIAL				330.93	2		661.85
TRAMO B	SECTOR EL MILLÓN				161.00	2		322
TRAMO C	SECTOR EL MILLÓN (ENTRANDO POR LA CADA BLOSI Y ZUÑA)				112.70	2		225.4
TRAMO D	SECTOR LAS FLORES C/ LUPERÓN PARTE ATRÁS				245.85	2		491.7
TRAMO E								
TRAMO F								
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J							0.00	1700.95
Total								

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,116,631.64

Monto desembolsado RD\$ 1,558,315.83 (50%)

Avance de obra 141.38%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: ENRIQUILLO
PROVINCIA: BARAHONA
MUNICIPIO: LAS SALINAS
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 6 de octubre de 2022


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 1,700.95 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. El gobierno local ejecutó vía contrato.
2. El gobierno local Únicamente consruyó contenes.
3. Los contenes construidos muestran buena terminación.
4. En ciertas zonas fue requerido un relleno para poder hacer el contén debido a la topografía de la vía.

IMÁGENES

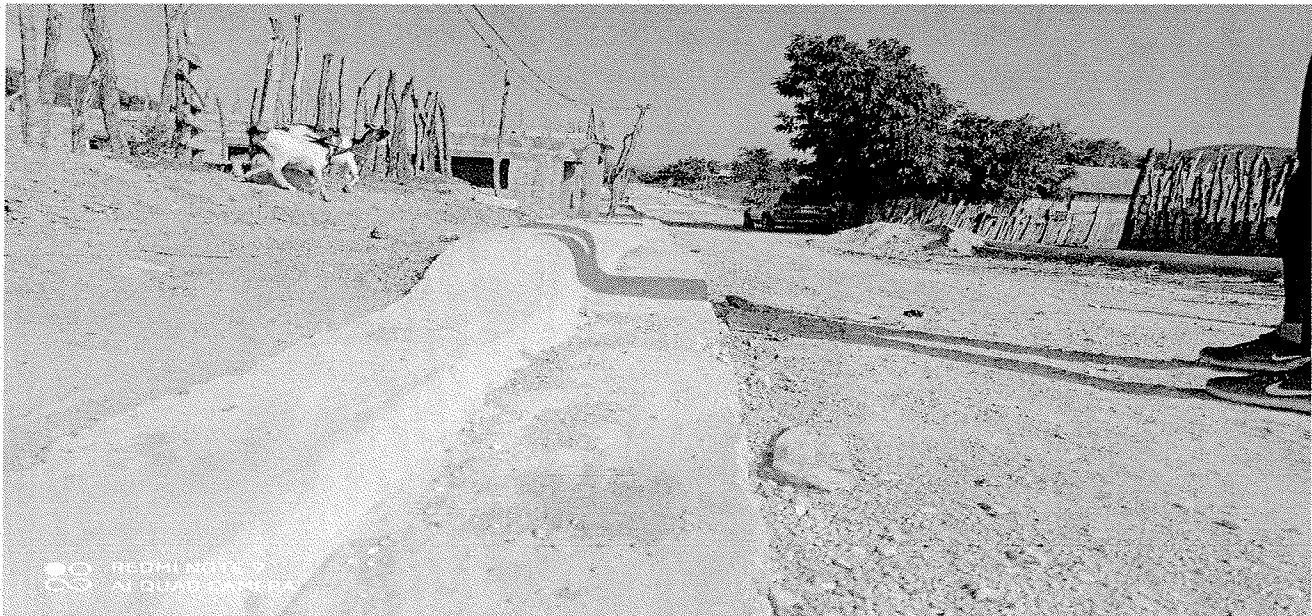




LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

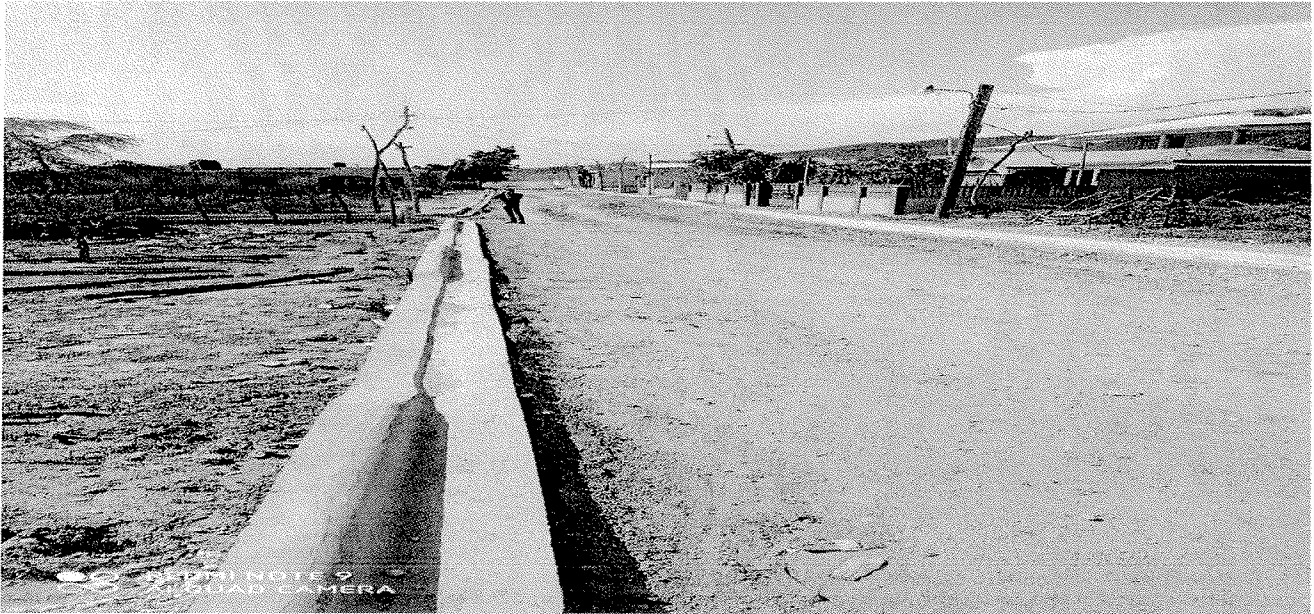

Suministra los datos de este reporte,



ING. STAYLIN MENDOZA

Técnico



ING. CAMILA MOYA

Técnico

