



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 041101

REGIÓN: ENRIQUILLO

PROVINCIA: BARAHONA

MUNICIPIO: JAQUIMEYES

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 14 de junio de 2022

1. Ing. Ana Indhira Rámirez

TÉCNICOS: 2. Ing. Asamín Ferreras

EN SEGUNDA VISITA (DE CIERRE) 18 de mayo del 2023

1-Arq. Zunilda del Rosario Guerrero

2-Ing. Danilo Mercado

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO G	CALLE PRINCIPAL LOS CODITOS				54.30	1.00		54.30
TRAMO H								
TRAMO I	CALLE D OLEO				44.30	1.00		44.30
TRAMO J	CALLE D OLEO				49.20	1.00		49.20
TRAMO K								
TRAMO L	CALLE MILCIADES BATISTA				45.80	1.00		45.80
TRAMO M	SECTOR: LOS CODITOS, CALLE SR. MILCIADES.				49.80	2.00		99.60
TRAMO N	SECTOR: EL LICEO, CALLE SRA. CELANIA				47.30	2.00		94.60
TRAMO O	SECTOR: EL LICEO, CALLE EL LICEO HASTA EL DREANAJE				14.90	1.00		14.90
TRAMO P	SECTOR: EL LICEO, CALLE EL LICEO				18.50	2.00		37.00
TRAMO Q	SECTOR: EL LICEO, CALLE EL LICEO				30.70	1.00		30.70
TRAMO R	SECTOR: EL LICEO, CALLE EL LICEO				44.30	2.00		88.60




LIGA MUNICIPAL – DOMINICANA –

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO S	SECTOR: EL LICEO, CALLE EL LICEO				65.50	2.00		131.00
TRAMO T	SECTOR: EL LICEO, CALLE KICO				76.00	2.00		152.00
TRAMO U	SECTOR: EL LICEO, CALLE KICO				8.70	1.00		8.70
TRAMO V	SECTOR: EL LICEO, CALLE KICO				28.10	2.00		56.20
TRAMO W	CALLE: COMANDANTE RICHARD				92.40	2.00		184.80
TRAMO X	CALLE: MALE BUBUTA				49.50	2.00		99.00
Total							-	1,190.70

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,989,414.63
 Monto desembolsado RD\$ 2,989,414.63 (100%)
 Avance de obra 103.18%



LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: ENRIQUILLO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 14 de junio de 2022

PROVINCIA: BARAHONA

MUNICIPIO: JAQUIMEYES

DISTRITO MUNICIPAL: -

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 1,190.70 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.



NOTAS


1. Esta alcaldía esta ejecutando por contrato. Pudimos evidenciar que los contenes están muy por debajo del nivel del terreno, por lo que le comunicamos a ellos que deben arreglar esas plantilla y la repuesta del contratista fue que ellos usaron equipo topográfico y que en es área cuando llueve los patio se llenan de agua, por tanto ese es el nivel que llevan.
2. Lo reportado aquí es lo construido hasta el momento.

NOTAS: 2DA. VISITA DE CIERRE




1. Esta obra (aceras y contes) se ejecuto por contrato.
2. En algunos tramos de contenes ejecutados fué necesario excavar un promedio de 0.45m de profundidad para encontrar la pendiente ideal para el drenaje pluvial.
3. Algunos tramos ejecutados de contenes están por debajo del nivel de la rasante de la calle.


IMÁGENES

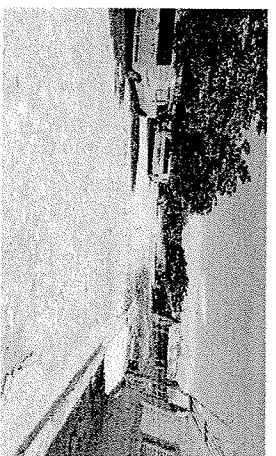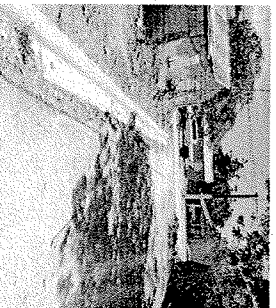





LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

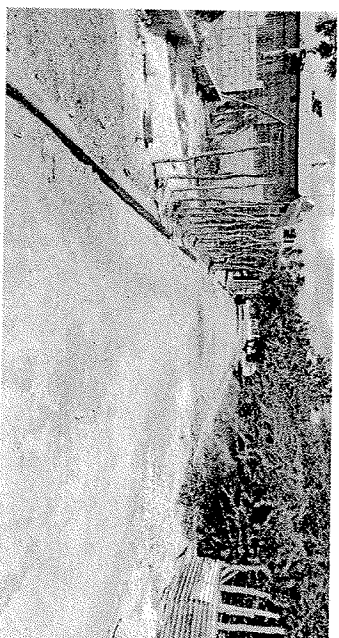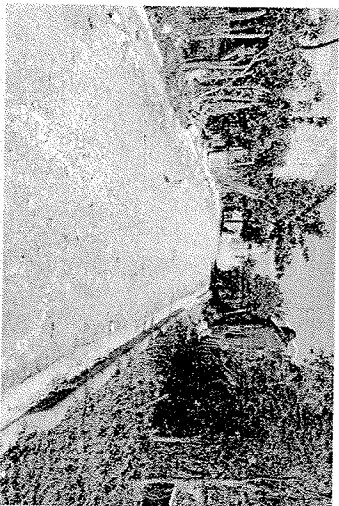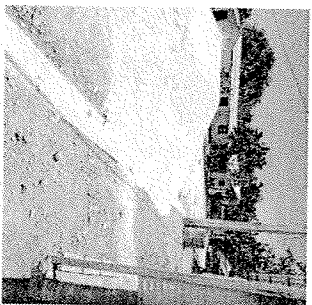



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

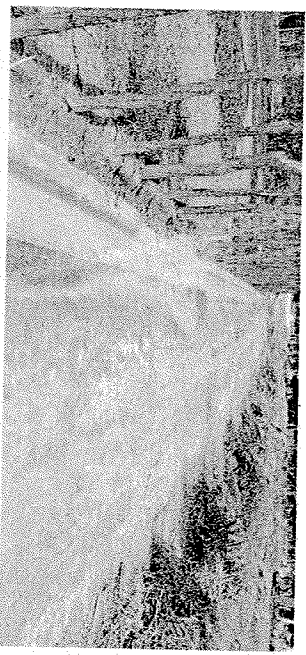

Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ


Técnico

ING. ASAMÍN FERRERAS

Técnico


ARQ. ZUNILDA DEL ROSARIO G.

Técnico


ING. JUAN DANILLO MERCADO

Técnico
