



LIGA MUNICIPAL  
- DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 24 de junio de 2022  
 1. Ing. Danilo Mercado  
 TÉCNICOS: 2. Ing. Asamín Ferreras

CODIGO: 050502  
 REGIÓN: CIBAO NOROESTE  
 PROVINCIA: DAJABÓN  
 MUNICIPIO: EL PINO  
 DISTRITO MUNICIPAL: MANUEL BUENO

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	Carr. Arroyo La Jagua			1	370.20	1	370.2	370.2
TRAMO B	Carr. Arroyo La Jagua			1	351.80	1	351.8	351.8
TRAMO C	Carr. Arroyo La Jagua			1	24.40	1	24.4	24.4
Total						0	746.4	746.4

**AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA**

Monto asignado RD\$ 2,801,680.07  
 Monto desembolsado RD\$ 1,400,840.04 50%  
 Avance de obra 67.20%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NOROESTE

PROVINCIA: DAJABÓN

MUNICIPIO: EL PINO

DISTRITO MUNICIPAL: MANUEL BUENO

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 24 de junio de 2022


## REPORTE

A la fecha de 24/06/2022 se ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 746.40 metros lineales de contén, lo que corresponde al 67.2% del fondo asignado para este territorio.

## NOTAS

1. Estan ejecutando por contrato.
2. Han realizado corte de terreno y movimiento de palizada para ampliar la via.
3. Estan realizando mas contenes que Aceras para aprovechar el Plan de Asfaltado.

## IMÁGENES

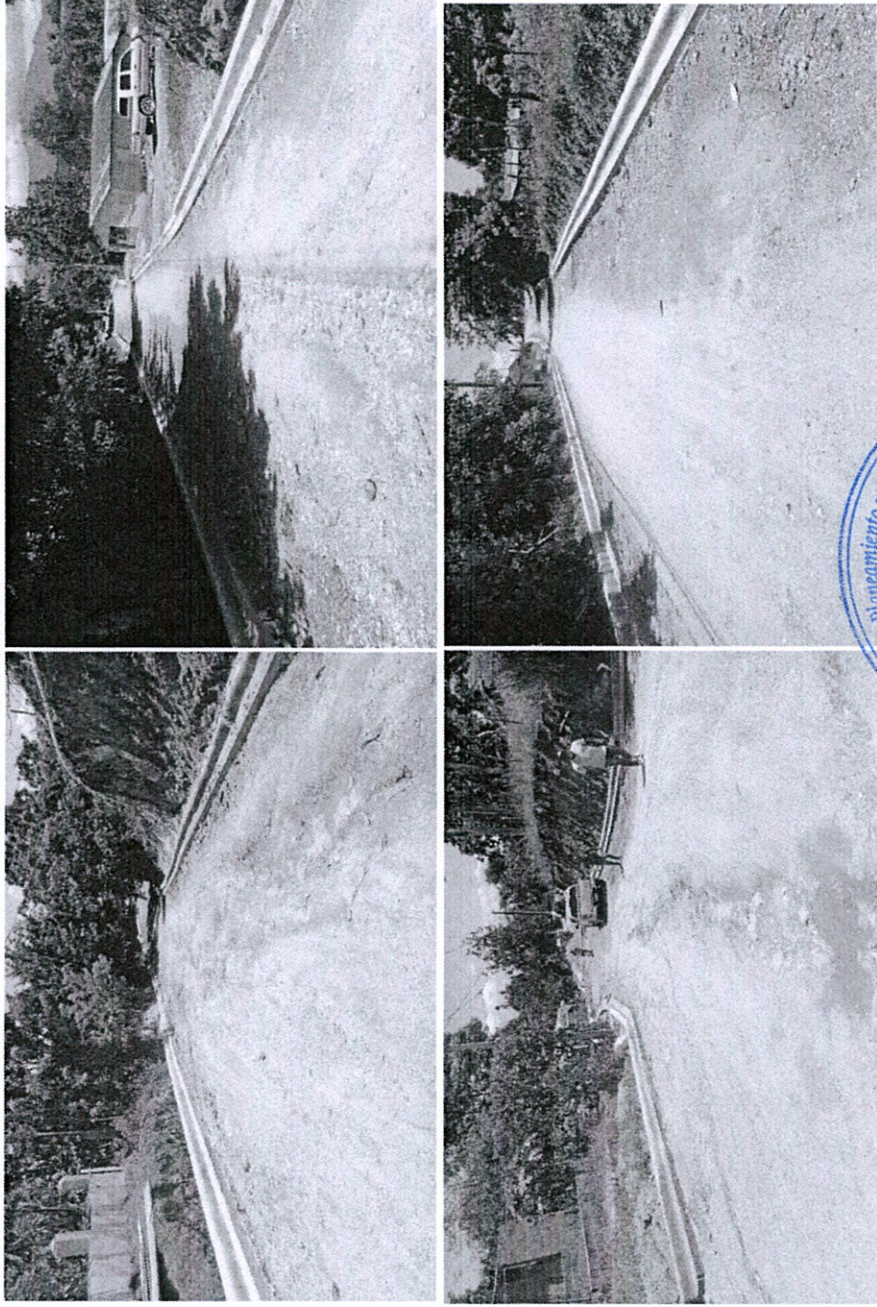

Suministra los datos de este reporte,

  
ING. DANILO MERCADO  
Técnico



ING. ASAMÍN FERRERAS  
Técnico
