



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE AVANCE DE OBRA

CODIGO: 050502

REGIÓN: CIBAO NOROESTE

PROVINCIA: DAJABÓN

MUNICIPIO: EL PINO

DISTRITO MUNICIPAL: MANUEL BUENO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 27 de septiembre de 2022


1. Ing. Asamín Ferreras

TÉCNICOS: 2. Ing. Richard Cabrera

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CARR. ARROYO LA JAGUA				370.20	1		370.2
TRAMO B	CARR. ARROYO LA JAGUA				351.80	1		351.8
TRAMO C	CARR. ARROYO LA JAGUA				24.40	1		24.4
TRAMO D	ENTRADA AL FOGONAZO				71.90	1		71.9
TRAMO E								
TRAMO F								
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							0.00	818.30

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,801,680.07
Monto desembolsado RD\$ 2,801,680.08 (100%)
Avance de obra 73.67%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NOROESTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 27 de septiembre de 2022

PROVINCIA: DAJABÓN

MUNICIPIO: EL PINO

DISTRITO MUNICIPAL: MANUEL BUENO


INFORME DE AVANCE DE OBRA


A la fecha de 27/09/2022 se ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 818.30 metros lineales de contén, lo que corresponde al 73.67% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS


1. En este distrito todavía le faltan metros por construir de contén

IMÁGENES

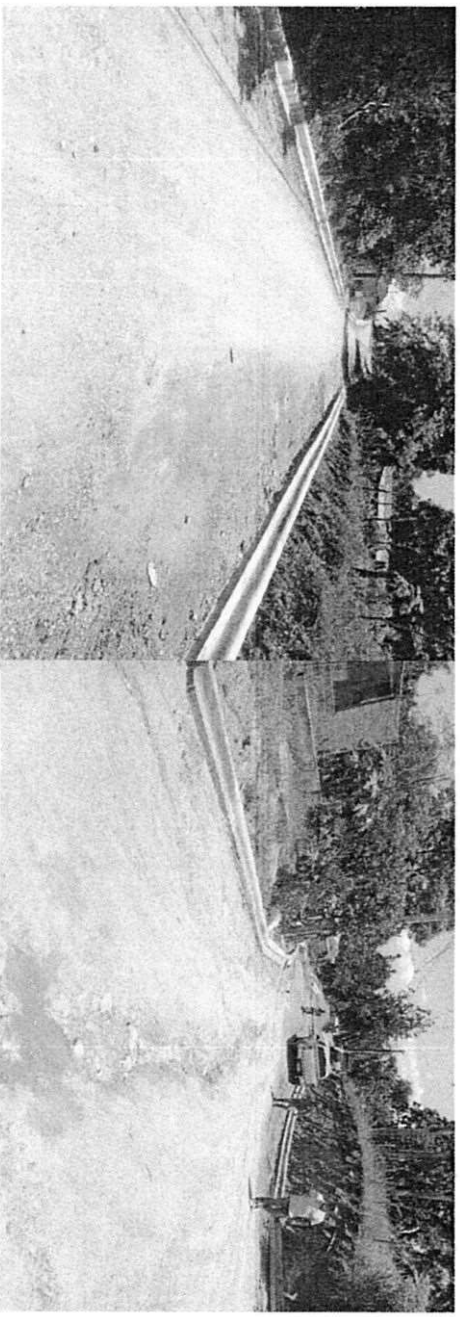



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

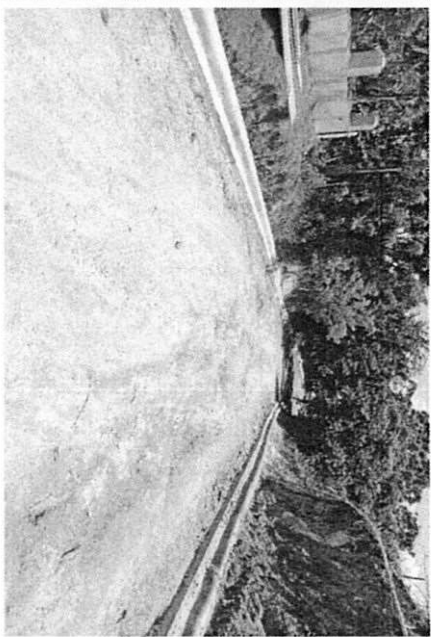

Suministra los datos de este reporte,



ING. ASAMIN FERRERAS
Técnico



ING. RICHARD CABRERA
Técnico

