



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 060401

REGIÓN: CIBAO NORDESTE

PROVINCIA: DUARTE

MUNICIPIO: PIMENTEL

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 30/3/23

1. Arq. Zunilda Del Rosario

TÉCNICOS: 2. Ing. Richard Cabrera

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	HERMANA MIRABAL	214.84	1.04	2	213.14	2	446.8672	426.28
TRAMO B	HERMANA MIRABAL	110.70	0.92	1	110.70	1	101.844	110.7
TRAMO C	LOS HERNANDEZ	257.20	0.91	1	257.20	1	234.052	257.2
TRAMO D	LOS HERNANDEZ	87.70	0.98	2	87.70	2	171.892	175.4
TRAMO E	LOS HERNANDEZ	145.40	0.97	1	145.00	1	141.038	145
TRAMO F	RESPALDO JOSE REYES	54.60	0.80	1	54.60	1	43.68	54.6
Total							1139.37	1169.18

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 4,543,999.95

Monto desembolsado RD\$ 2,271,999.98 (50%)

Avance de obra 102.08%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORDESTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 30/3/23

PROVINCIA: DUARTE

MUNICIPIO: PIMENTEL

DISTRITO MUNICIPAL: -



INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,139.37 metros cuadrados de aceras y 1,169.18 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. Esta obra fue ejecutada por contrato.
2. Se pudo observar una buena terminación en la acera y contenes.
3. Se observó una variación del ancho de las aceras por falta de espacio por las viviendas.

IMÁGENES

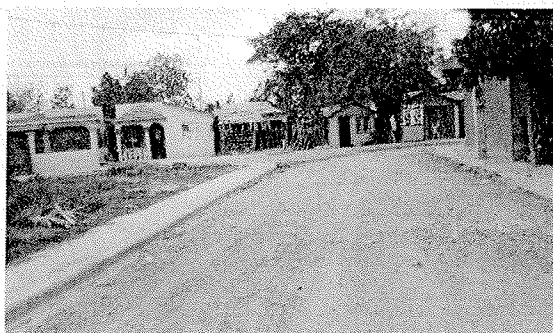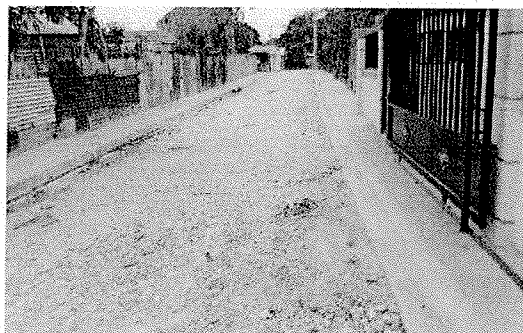



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

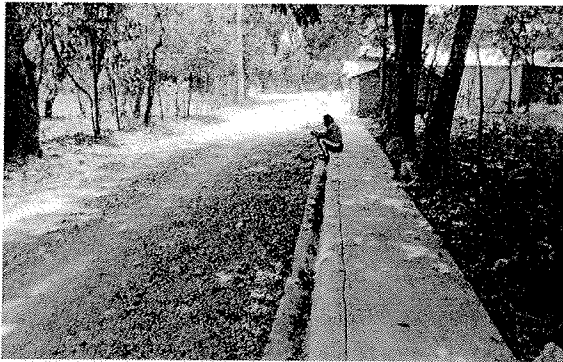

Suministra los datos de este reporte,

Zunilda Del Rosario G.
ARQ. ZUNILDA DEL ROSARIO
Técnico

RC
ING. RICHARD CABRERA
Técnico
