



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CODIGO: 080203

REGIÓN: YUMA

PROVINCIA: EL SEIBO

MUNICIPIO: MICHES

DISTRITO MUNICIPAL: LA GINA

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 5 de abril de 2022

2. Ing. Edward Acosta

TÉCNICOS: 3. Ing. Richard Cabrera

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	JUVENCINO ORTIZ	75.70	1.00	2	75.70	2	151.4	151.4
TRAMO B	PUEBLO NUEVO CEMENTERIO	55.40	1.00	2	55.40	2	110.8	110.8
TRAMO C	PUEBLO NUEVO CALLE IGLESIA	76.40	1.00	2	76.40	2	152.8	152.8
TRAMO D	CALLE SILVIA DIAZ	122.90	1.00	2	122.9	2	245.8	245.8
TRAMO E	CALLE ESTEBAN ARIAS	154.50	1.00	2	154.5	2	309	309
TRAMO F	CALLE DOLORES ROA	75.90	1.00	2	75.9	2	151.8	151.8
TRAMO G	LOS MAURICIO	17.80	1.00	2	17.8	2	35.6	35.6
Total							1157.2	1157.2

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado	RD\$ 2,945,165.24	
Monto desembolsado	RD\$ 1,472,582.62	(50%)
Avance de obra	147.39%	



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: YUMA

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 5 de abril de 2022

PROVINCIA: EL SEIBO

MUNICIPIO: MICHES

DISTRITO MUNICIPAL: LA GINA


REPORTE

A la fecha de 05/04/2022 se ha ejecutado 1,157.20 metros cuadrados de aceras y 1,157.20 metros lineales de contén, lo que corresponde al 147.39% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS





1. Estos datos fueron suministrados por la junta distral, luego del levantamiento que hicieron con la ficha que se le entrego.
2. El gobierno local ejecutó una mayor cantidad de aceras y contenes de las estimadas.

IMÁGENES

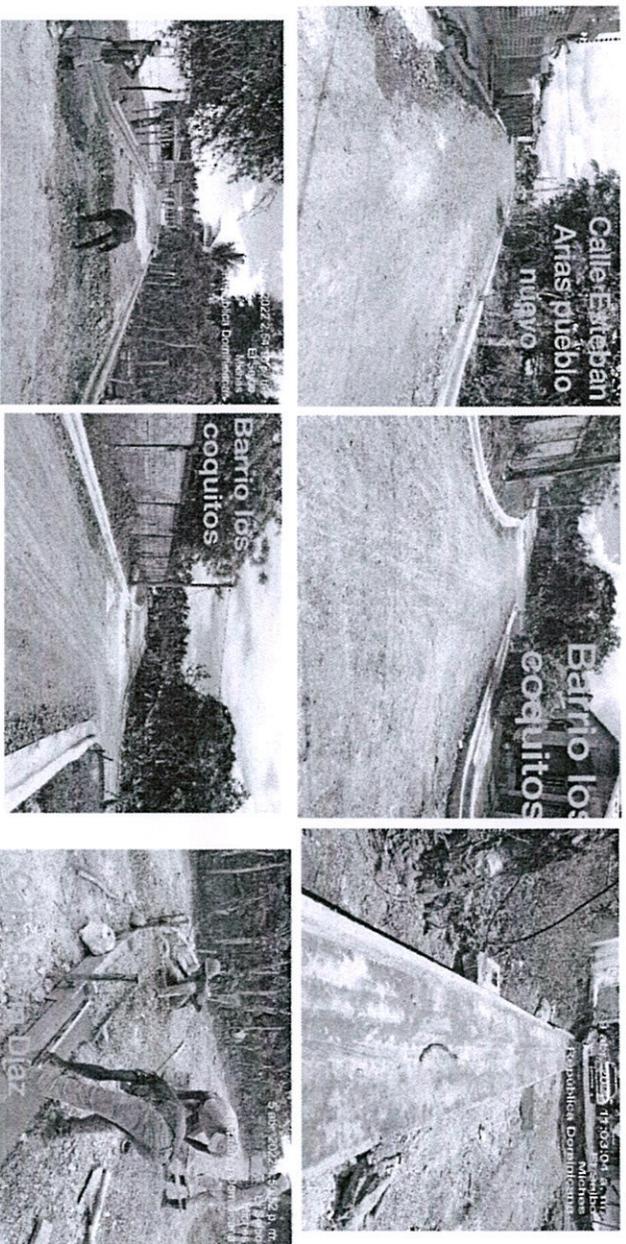



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

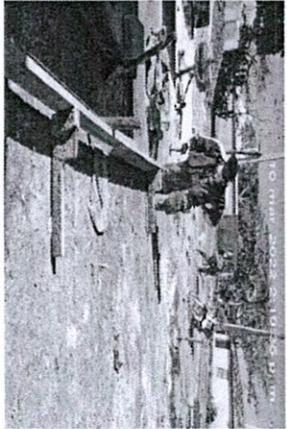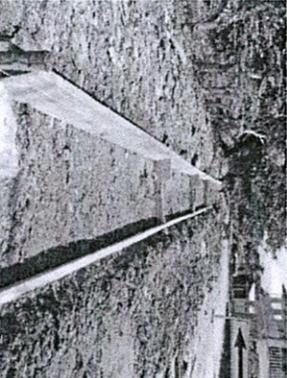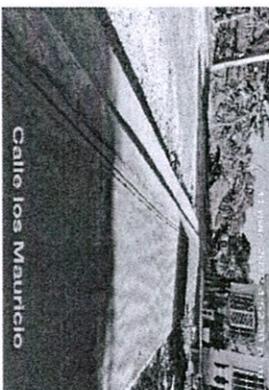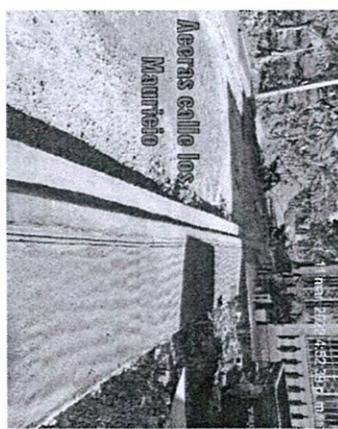

Suministra los datos de este reporte,



ING. EDWARD ACOSTA


Técnico





ING. RICHARD CABRERA

Técnico



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL LA GINA

Carretera Miches- Sabana de la Mar, Km. 9, La Gina, Rep. Dom.

RNC: 4-30-033381-2 Tel. 849-358-8522

ayuntamientomlagina@gmail.com



FECHA 27/06/2022

R. recibido

Sr:

[Firma manuscrita]
27/06/22

Ing. Valentín Santos García
Sub secretario de apoyo Municipal
De obras públicas, planeamiento y
Ordenamiento territorial

Asunto:

Informe de obra construcción de
Aceras y contenes, Distrito Municipal
La Gina

Después de un cordial saludo, remitimos el informe de obras con fondos especiales Liga Municipal Dominicana, con el programa de apoyo a los gobiernos locales.

Modalidad de ejecución de obras: Hemos ejecutado el proyecto de obras por administración directa con la finalidad de construir mas o extender los metros indicados con los fondos asignados, utilizando tres maestros especializados en esta area de la construcción.

Estatus de ejecución de obras: Iniciamos el proceso después de recibir el 50% de los fondos asignados por el motivo de que el 20% no culminaba la primera etapa del levantamiento.

Estatus de los fondos recibidos: Hemos agotado el 50% de los fondos recibidos construyendo mas de lo indicado, viéndonos en la obligación de seguir construyendo contenes, debido a que tenemos vigente un programa de asfaltado en nuestro Distrito Municipal.

Agradeciendo de antemano las buenas acciones de nuestro presidente Luis Abinader y la Liga Municipal Dominicana y fedodim.

Sin otro particular

Muy atentamente

[Firma manuscrita]

Rafael Rodríguez Vásquez

Alcalde Distrital La Gina

