

LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 090101

REGIÓN: CIBAO NORTE

PROVINCIA: ESPAILLAT

MUNICIPIO: MOCA

DISTRITO MUNICIPAL: -


FECHA DE VISITA TÉCNICA: 10 de febrero de 2023

1. Ing. Ana Indhira Ramírez

2. César De Los Santos

TÉCNICOS:

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	Calle antonio guzman fernandez, hasta la calle coordillera Ibra fernandez	1,009.47	1.00	1	611.80	1	1,009.47	611.8
TRAMO B	Entrada de Pipulin				355.75	2		711.5
TRAMO C	detrás de el gordo agua				123.05	2		246.1
TRAMO D	entrada de pempe				91.80	2		183.6
TRAMO E	entrada de marino				51.3	2		102.6
TRAMO F	Entrada de Piragua	40.59	1.00	2			81.18	
TRAMO G	Entrada Ciguito Guausi				280	2		560
TRAMO H	El Cala 2da Entrada				483	1		483
TRAMO I	El Cala 2da Entrada				422.9	1		422.9
TRAMO J	Detrás de la Escuela Juan Crisotomo Estrella	219.00	2.19	1			479.61	
TRAMO K	C/ Jose del Carmen	282.00	1.00	1	75	1	282	75
TRAMO DM	Isla Perdida	370.00	1.00	1			370	
TRAMO DN	Proximo a la Junta Central Electoral	273.00	1.00	1	210	1	273	210
TRAMO DO	Proximo a la Escuela Andre Bello	66.00	1.00	1	15	1	66	15
TRAMO DP	Calle 16 de Agosto Esquina Morillo	162.00	1.00	1	110	1	162	110
TRAMO DQ	Calle Independencia Esquina Doroteo Tapia	148.00	1.00	1	115	1	148	115
TRAMO DR	Moca-La Vega	52.00	1.00	1			52	



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO DS	Calle Jose Maria Michell	31.20	1.00	1	26	1	31.2	26
TRAMO DT	Calle Presidente Vasquez	23.00	1.00	1			23	
TRAMO DU	angel morales	75.00	1.00	1	82	1	75	82
TRAMO DV	Parada de Santo domingo	12.00	1.00	1				12
TRAMO DW	Pte. Vasquez (frente a cora moca)	10.00	1.00	1	10		10	
TRAMO DX	Calle principal (juita)	408.70	1.00	1	900	1	408.7	900
TRAMO DY	Calle primera				78	1		78
TRAMO DZ	Calle segunda				123.9	1		123.9
TRAMO EA	Calle 7				58.3	1		58.3
TRAMO EB	Padre Ibañes	64.00	1.00	1	95.8	2	64	191.6
TRAMO EC	Padre Ibañes	15.80	1.00	1	31.9	1	15.8	31.9
TRAMO ED								
TRAMO EE								
TRAMO EF								
TRAMO EG								
Total							3562.96	5338.20

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 12,907,677.65

Monto desembolsado RD\$ 12,907,677.65 (100%)

Avance de obra 138.74%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 10 de febrero de 2023

PROVINCIA: ESPAILLAT

MUNICIPIO: MOCA

DISTRITO MUNICIPAL: -

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 3,562.96 metros cuadrados de aceras y 5,338.20 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS



1. Esta obra cumple con los parametro recomendados por la LMD.
2. Este levantamiento se realizo en compañía de las autoridades municipales.
3. Estas obras fueronejecutada por contrato.

IMÁGENES






LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

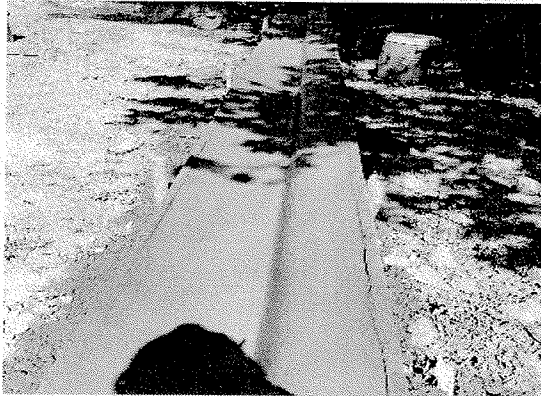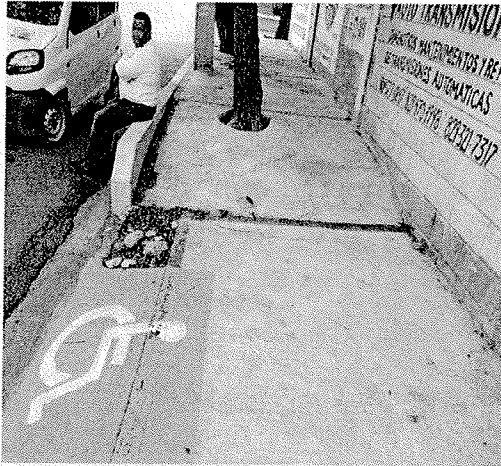

Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ
Técnico


CÉSAR DE LOS SANTOS
Técnico

