

LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CODIGO: 090101

REGIÓN: CIBAO NORTE

PROVINCIA: ESPAILLAT

MUNICIPIO: MOCA

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 23 de agosto de 2022

1. Ing. Ana Indhira Ramírez

TÉCNICOS: 2. César De Los Santos


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE PRINCIPAL (Julia)	408.70	1.00	1	900.00	1	408.7	900
TRAMO B	CALLE PRIMERA				78.00	1		78
TRAMO C	CALLE SEGUNDA				123.90	1		123.9
TRAMO D	CALLE 7				58.3	1		58.3
TRAMO E	PADRE IBANEZ	64.00	1.00	1	95.8	2	64	191.6
TRAMO F	PADRE IBANEZ	15.80	1.00	1	31.9	1	15.8	31.9
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							488.5	1383.7

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 12,907,677.65

Monto desembolsado RD\$ 12,907,677.65 (100%)

Avance de obra 31.79%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORTE

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 23 de agosto de 2022

PROVINCIA: ESPAILLAT

MUNICIPIO: MOCA

DISTRITO MUNICIPAL: -

REPORTE


A la fecha de 23/08/2022 se ha ejecutado 488.50 metros cuadrados de aceras y 1,383.70 metros lineales de contén, lo que corresponde al 31.79% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS


1. Este municipio esta construyendo por contrato.
2. Hasta el momento es lo construido, según informacion suministrada estan a la espera de identificar lo demas sectores y calle. Por tanto solo se hizo el levantamiento de este sector Calac 2.

IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

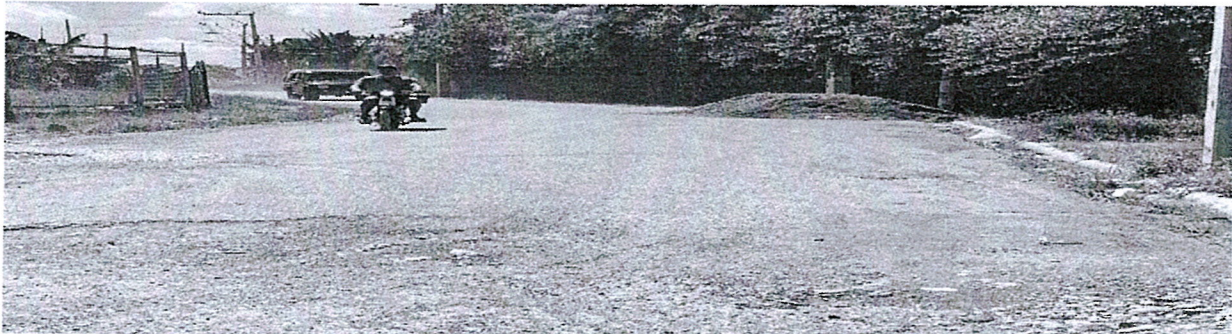

Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ
Técnico


CÉSAR DE LOS SANTOS
Técnico

