

LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 120102
REGIÓN: YUMA
PROVINCIA: LA ROMANA
MUNICIPIO: LA ROMANA
DISTRITO MUNICIPAL: CALETA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 1 de noviembre de 2022
TÉCNICOS: 1. Ing. Richard Cabrera
2. Elizabeth García

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	AVENIDA PRINCIPAL LA CALETA	855.60	1.54	1	855.60	1	1317.624	855.6
TRAMO B	AVENIDA PRINCIPAL LA CALETA	229.60	1.19	1	241.70	1	273.224	241.7
TRAMO C								
TRAMO D								
TRAMO E								
TRAMO F								
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							1590.85	1097.30

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,609,231.51
Monto desembolsado RD\$ 3,609,231.51 (100%)
Avance de obra 130.87%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: YUMA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 1 de noviembre de 2022

PROVINCIA: LA ROMANA

MUNICIPIO: LA ROMANA

DISTRITO MUNICIPAL: CALETA



INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,590.85 metros cuadrados de aceras y 1,097.30 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Este proyecto fue ejecutado por contrata.
2. Se pudo observar una muy buena terminación en acera y contén.

IMÁGENES

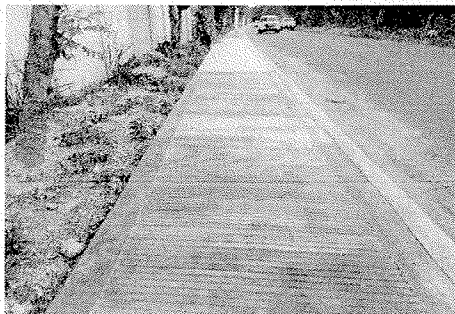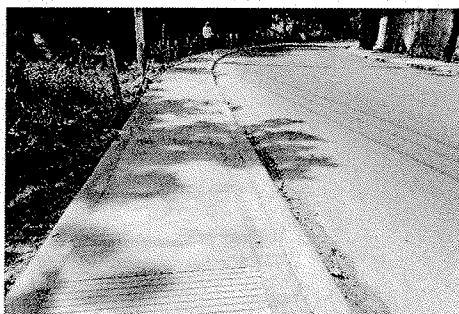



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,

ING. RICHARD CABRERA

Técnico

ELIZABETH GARCÍA

Técnico
