



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 140302

REGIÓN: CIBAO NORDESTE

PROVINCIA: MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

MUNICIPIO: EL FACTOR

DISTRITO MUNICIPAL: EL POZO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 10 de mayo de 2023

1. Ing. Edward Acosta

TÉCNICOS: 2. Elizabeth García


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	BARRIO LAS YAGUAS C/ETRAS DE LA ESCUELA				39.15	2.00		78.30
TRAMO B	C/ PRINCIPAL				134.70	2.00		269.40
TRAMO C	C/1				129.10	2.00		258.20
TRAMO D	C/2				12.60	2.00		25.20
TRAMO E	C/3				327.85	2.00		655.70
TRAMO F	REPARTO C/3				16.05	2.00		32.10
TRAMO G	REPARTOC/3B				28.15	2.00		56.30
TRAMO H	C/4				52.55	2.00		105.10
TRAMO I	REPARTO C/5				245.85	2.00		491.70
TRAMO J								
Total							-	1,972.00

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,765,188.93

Monto desembolsado RD\$ 3,765,188.94 (100%)

Avance de obra 140.28%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORDESTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 10 de mayo de 2023

PROVINCIA: MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

MUNICIPIO: EL FACTOR

DISTRITO MUNICIPAL: EL POZO


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 1,972.00 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS



1. En esta visita se pudo observar que en algunos tramos de contenes fueron destruidos producto de equipos pesados
2. La utilización de los recursos mayormente fueron destinados a la construcción de contenes.

IMÁGENES

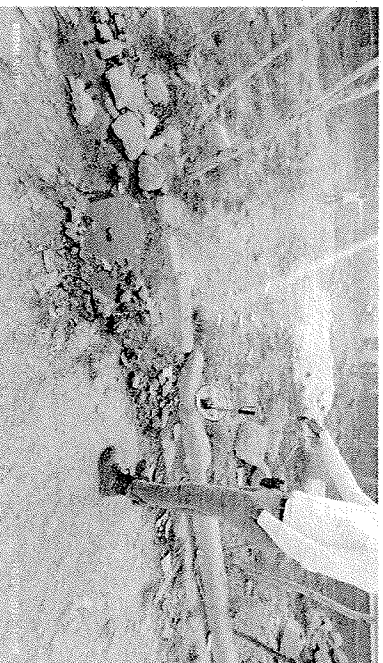



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

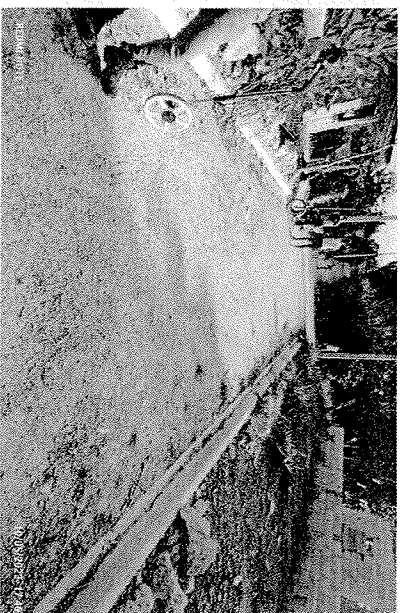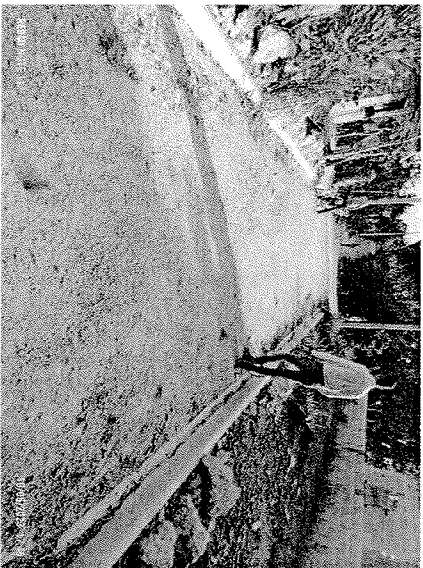

Suministra los datos de este reporte,


ING. EDWARD ACOSTA

Técnico


ELIZABETH GARCÍA

Técnico
