



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

**CODIGO:** 150302

**FECHA DE ÚLTIMA VISITA:** 6 de mayo de 2022

**REGIÓN:** CIBAO NOROESTE

1. Ing. Edward Acosta

**PROVINCIA:** MONTE CRISTI

TÉCNICOS: 2. Ing. Ana Indhira Rámirez

**MUNICIPIO:** GUAYUBÍN

**DISTRITO MUNICIPAL:** VILLA ELISA

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m <sup>2</sup> )	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CARRETERA PRINCIPAL (LATERAL IZQUIERDO)	30.00	1.00	1			30	
TRAMO B	ENTRADA LA REFORMA (LATERAL IZQUIERDO)	31.00	1.00	1			31	
TRAMO C	ENTRADA LA REFORMA (LATERAL IZQUIERDO)	92.30	1.50	1			138.45	
TRAMO D	ENTRADA LA REFORMA (LATERAL IZQUIERDO)	276.40	1.00	1			276.4	
TRAMO E	ENTRADA LA REFORMA (LATERAL IZQUIERDO)				80	1		80
TRAMO F	ENTRADA LA REFORMA (LATERAL DERECHO)	335.98	1.00	1			335.98	
TRAMO G	ENTRADA LA REFORMA (LATERAL DERECHO)	43.00	1.00	1			43	
TRAMO H	AVA IDALLA PEÑA				26.4	1		26.4
TRAMO I	CALLE TRINIDAD ESPEJO	172.00	0.90	2	172	2	309.6	344
TRAMO J	CALLE TRINIDAD ESPEJO	20.70	1.00	1			20.7	
TRAMO K	CALLE TRINIDAD ESPEJO	90.40	1.00	1	90.4	2	90.4	180.8
TRAMO L	CALLE ANTONIO SANCHEZ	63.20	1.00	1	63.2	1	63.2	63.2
TRAMO M	CALLE ANTONIO SANCHEZ	126.50	1.00	2	126.5	2	253	253
TRAMO N	CALLE FREDDY CABA	17.30	1.00	1	17.3	1	17.3	17.3
TRAMO O	CALLE FREDDY CABA	59.50	1.00	2			119	
TRAMO P	CALLE FREDDY CABA	50.10	1.00	2			100.2	
Total							1828.23	964.7

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA



LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —

Monto asignado	RD\$ 3,412,386.78	
Monto desembolsado	RD\$ 1,706,193.39	(50%)
Avance de obra	137.69%	



# LIGA MUNICIPAL —DOMINICANA—



SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANTEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 6 de mayo de 2022

REGIÓN: CIBAO NOROESTE  
PROVINCIA: MONTE CRISTI  
MUNICIPIO: GUAYUBÍN  
DISTRITO MUNICIPAL: VILLA ELISA


## REPORTE

A la fecha de 06/05/2022 se ha ejecutado 1,828.23 metros cuadrados de aceras y 964.70 metros lineales de contén, lo que corresponde al 137.69% del fondo asignado para este territorio.

## NOTAS


1. Este Distrito esta ejecutando dicho programa por contrato, al momento del levantamiento estuvieron presente el contratista y el Director de la Junta Distrital.
2. Esto tienen, corte, remosion de empaliza y relleno suelto compactado con un promedio de espesor de 0.20 m.

## IMÁGENES

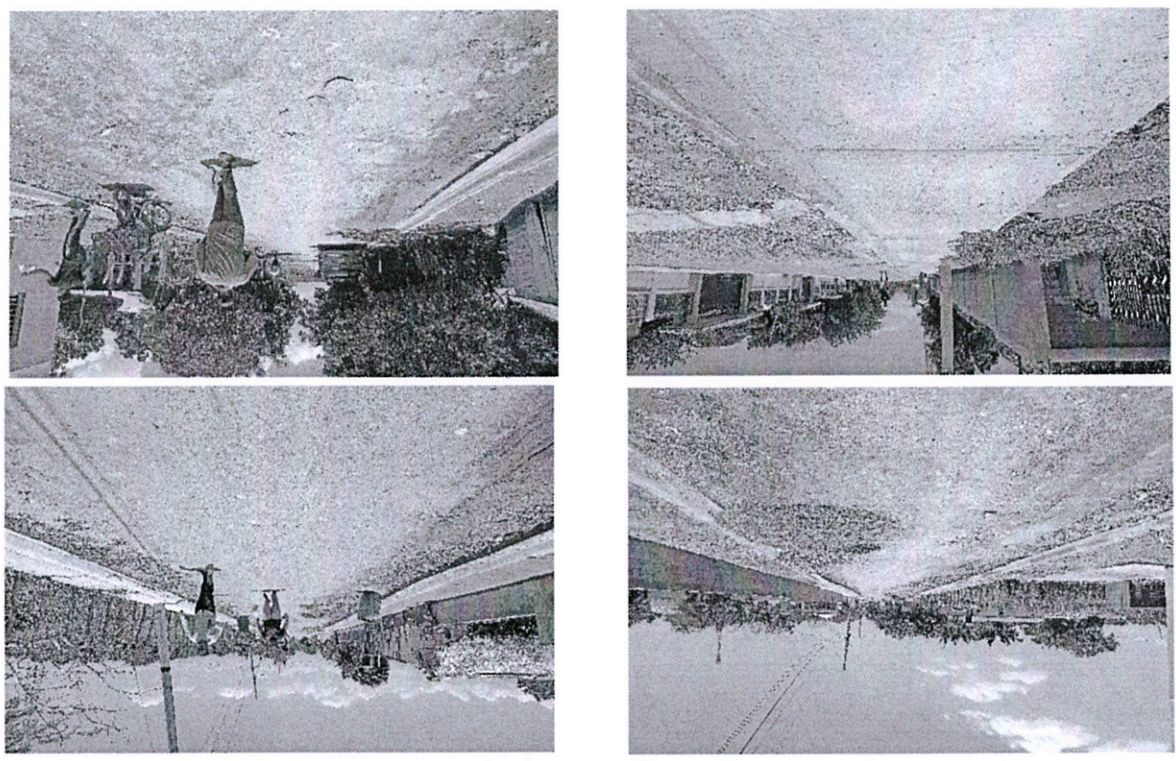

Suministra los datos de este reporte,

LIGA MUNICIPAL  
-DOMINICANA-



ING. EDWARD ACOSTA

Técnico

ING. ANA INDHIRA RAMIREZ

Técnico

