



# LIGA MUNICIPAL -DOMINICANA-

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 130104  
REGIÓN: CIBAO SUR  
PROVINCIA: LA VEGA  
MUNICIPIO: LA VEGA  
DISTRITO MUNICIPAL: TAVERAS


FECHA DE VISITA TÉCNICA: 22 de junio de 2023  
TÉCNICOS: 1. Arq. Keilin Mora  
2. Ing. Richard Cabrera

| TRAMOS  | NOMBRE DE LA CALLE                    | LONGITUD DE ACERAS (m) | ANCHO DE ACERAS (m) | CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS | LONGITUD CONTENES (m) | CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES | TOTAL DE ACERAS (m2) | TOTAL DE CONTENES (m) |
|---------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| TRAMO A | CALLE PRINCIPAL PRESA DE TAVERA       | 627.60                 | 1.02                | 1.00                         | 594.50                | 1.00                           | 640.15               | 594.50                |
| TRAMO B | CALLE PRINCIPAL A LA SALIDA DE TAVERA | 27.50                  | 0.90                | 1.00                         | 228.00                | 2.00                           | 24.75                | 456.00                |
| TRAMO C | CALLE EL LAUREL                       | 53.40                  | 1.04                | 1.00                         | 53.40                 | 1.00                           | 55.54                | 53.40                 |
| TRAMO D | LA LLANADA ABAJO CALLE PRINCIPAL      | 150.00                 | 1.17                | 2.00                         | 150.00                | 2.00                           | 351.00               | 300.00                |
| Total   |                                       |                        |                     |                              |                       |                                | 1,071.44             | 1,403.90              |

## AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,961,166.03  
Monto desembolsado RD\$ 3,961,166.03 (100%)  
Avance de obra 121.45%

# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO SUR  
PROVINCIA: LA VEGA  
MUNICIPIO: LA VEGA  
DISTRITO MUNICIPAL: TAVERAS

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 22 de junio de 2023


## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,071.44 metros cuadrados de aceras y 1,403.90 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.



## NOTAS

1. Estas aceras y contenes fueron hechas con los fondos asignados por el programa de la liga y cumplen con lo recomendado.
2. Se realizó el porcentaje completo dando término al programa.

## IMÁGENES

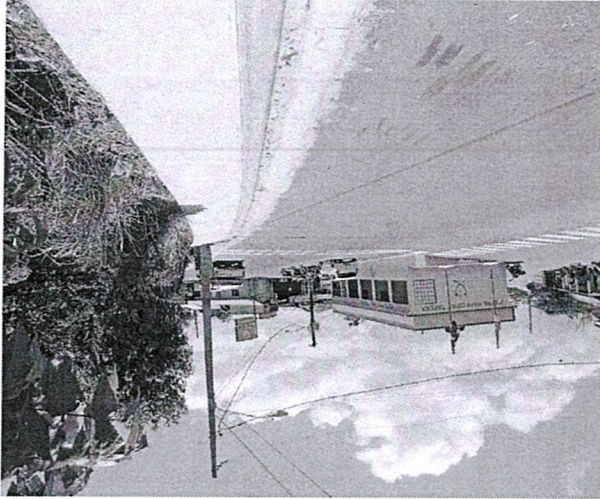

LIGA MUNICIPAL  
—DOMINICANA—

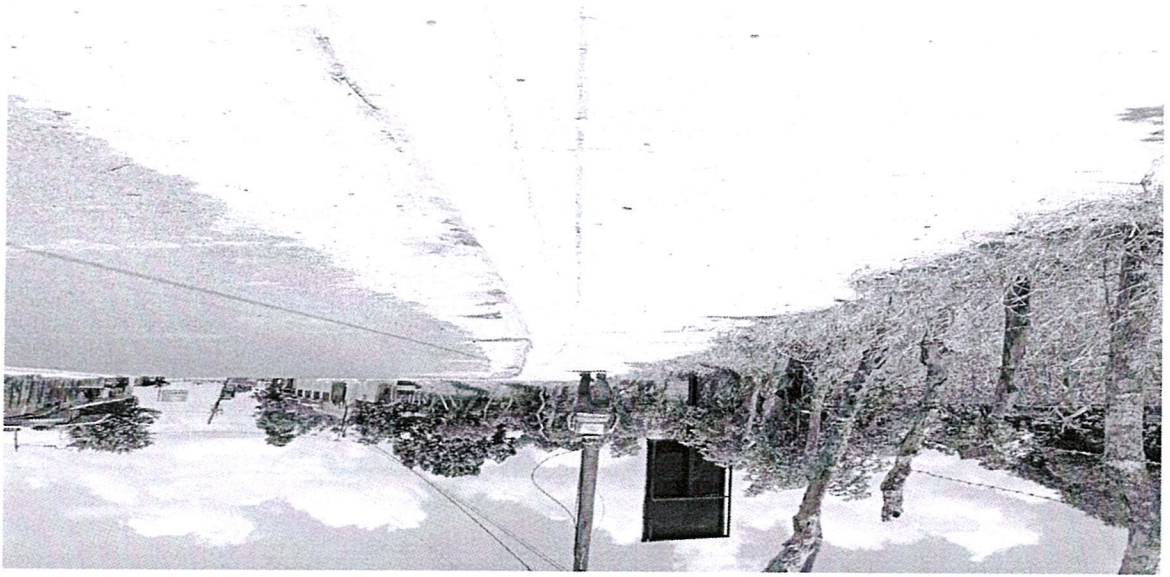

Suministra los datos de este reporte,

Técnico

ARQ. KEILIN MORA

Técnico

ING. RICHARD CABRERA
