



**LIGA MUNICIPAL  
- DOMINICANA -**

**SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

**CODIGO:** 320502

**REGIÓN:** OZAMA

**PROVINCIA:** SANTO DOMINGO

**MUNICIPIO:** SAN ANTONIO DE GUERRA

**DISTRITO MUNICIPAL:** HATO VIEJO

**FECHA DE ÚLTIMA VISITA:** 21 de junio de 2022

1. Ing. Richard Cabrera

2. Elisabeht Aguilera

**TÉCNICOS:**

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	Juan Concepción	32.10	1.00	1	32.10		32.1	
TRAMO B	Juan Concepción	7.40	0.95	1	7.40		7.03	
TRAMO C	Juan Concepción	26.10	1.00	1	26.10		26.1	
TRAMO D	Augusto García				129.7	2		259.4
TRAMO E	Augusto García	2.50	1.10	1			2.75	
TRAMO F	Augusto García	6.50	0.69	1			4.485	
TRAMO G	Augusto García	7.20	0.90	1			6.48	
TRAMO H	Abrahán Castro				169	2		338
TRAMO I	Parque ecológico	61.90	1.00	1	61.9	1	61.9	61.9
TRAMO J	Parque ecológico	3.60	0.45	1	39.7	1	1.62	39.7
TRAMO K	Respaldo principal	30.00	0.90	1	62.9	2	27	125.8
TRAMO L	Respaldo principal	12.40	1.02	1	100.5	2	12.648	201
TRAMO M	Respaldo principal	9.80	1.20	1	44.5	1	11.76	44.5
TRAMO N	Calle central	7.90	1.10	1	7.9	1	8.69	7.9
TRAMO O	Calle central				12.8	1		12.8
TRAMO P	Calle central				144.6	2		289.2
TRAMO Q	Calle central				14.5	1		14.5
TRAMO R	Calle central				41.1	1		41.1
<b>Total</b>							<b>202.56</b>	<b>1435.80</b>


**AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA**

Monto asignado RD\$ 3,229,966.48

Monto desembolsado RD\$ 1,614,983.24 50%

Avance de obra 122.89%





# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: OZAMA

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 21 de junio de 2022

PROVINCIA: SANTO DOMINGO

MUNICIPIO: SAN ANTONIO DE GUERRA

DISTRITO MUNICIPAL: HATO VIEJO

## REPORTE

A la fecha de 21/06/2022 se ha ejecutado 202.56 metros cuadrados de aceras y 1,435.80 metros lineales de contén, lo que corresponde al 122.89% del fondo asignado para este territorio.


## NOTAS

1. En esta visita se pudo observar una buena terminación en contenes y aceras construidas.


## IMÁGENES







# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

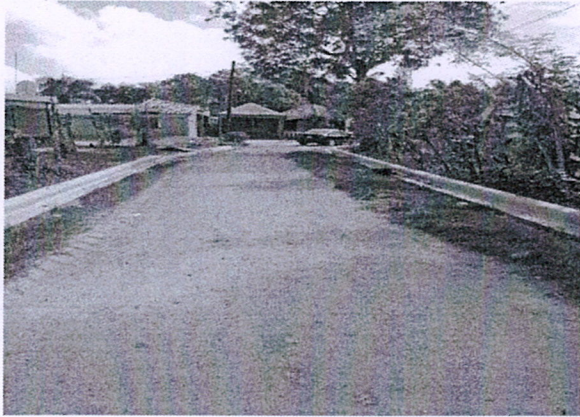

Suministra los datos de este reporte,

ING. RICHARD CABRERA  
Técnico

D/O ELISABETH AGUILERA  
Técnico

