



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


CODIGO: 170301
REGIÓN: VALDESIA
PROVINCIA: PERAVIA
MUNICIPIO: MATANZAS
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 24 de mayo de 2023
TÉCNICOS: 1. Ing. Ana Indhira Ramírez
2. César De Los Santos

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/ PRINCIPAL - LOS TUMBAOS	330.00	1.00	1.00	346.00	1.00	330.00	346.00
TRAMO B	CALLEJON DE MONGUITO SEC. QUIJA QUIETA				105.15	1.00		105.15
TRAMO C	PARTE ARRIBA FRENTE A DOMINGO DIAZ				89.46	1.00		89.46
TRAMO D	SECCION GALEON				359.40	1.00		359.40
TRAMO E	C/ PRINCIPAL	160.00	1.00	2.00	200.00	2.00	320.00	400.00
TRAMO F	LAS TABLAS				296.00	1.00		296.00
TRAMO G	SAN JOSE	118.00	1.00	1.00	118.00	1.00	118.00	118.00
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							768.00	1,714.01

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 4,409,299.59
Monto desembolsado RD\$ 2,204,649.80 (50%)
Avance de obra 122.47%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANTEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIÁ

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 24 de mayo de 2023

PROVINCIA: PERAVÍA

MUNICIPIO: MATANZAS

DISTRITO MUNICIPAL: -


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 768.00 metros cuadrados de aceras y 1,714.01 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS



1. Este ayuntamiento construyó por contrato.
2. las aceras y contenes se observan de buena calidad.
3. Este proyecto cumple con los parámetros recomendados por la LMD.

IMÁGENES

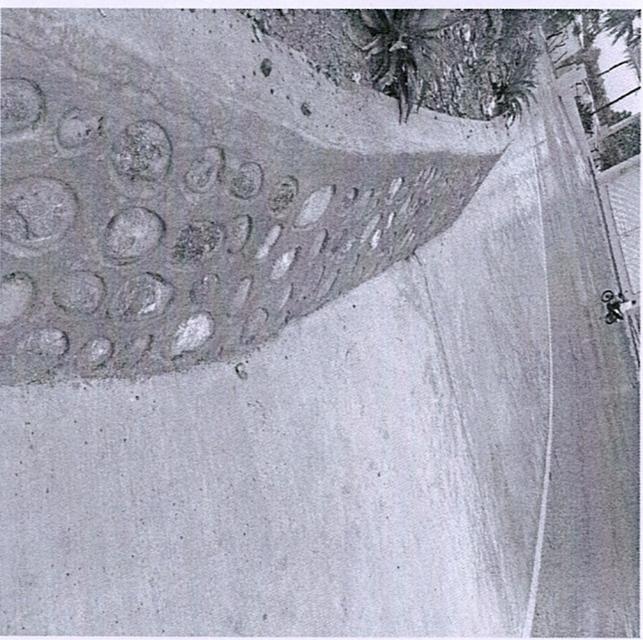



**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —**

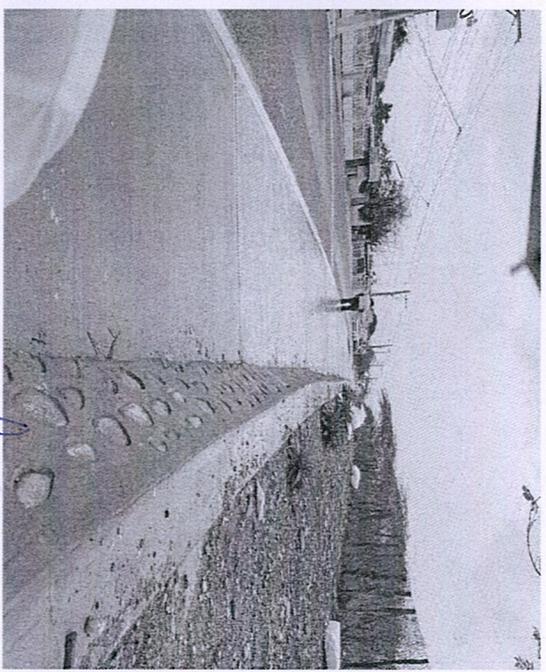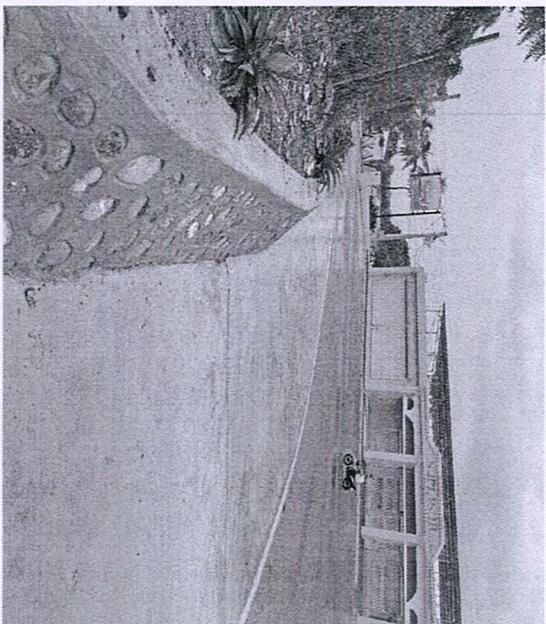

Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA-HIDHIRA RÁMIREZ

Técnico


CÉSAR DE LOS SANTOS

Técnico

