



**LIGA MUNICIPAL
- DOMINICANA -**

Santo Domingo, D.N.
29 de enero de 2025

Al:

Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía:

Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

Asunto:

Remisión de informe de Avance de Los Alcarrizos.

En la visita realizada por el Codia el 22 de julio de 2022 se validó la ejecución de 2,222 metros cuadrados de aceras y 2,592.06 metros lineales de contenes, En una segunda visita realizada el 20 de enero de 2023 por los técnicos de la LMD se validó la ejecución de 6,239.21 metros cuadrados de aceras y 7,011.21 metros lineales de contenes con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.

En una tercera visita técnica realizada el 19 de diciembre de 2024 se ha validado la ejecución de 6,384.41 metros cuadrados de aceras y 6,824.26 metros lineales de contenes, con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 14,845.68 metros cuadrados de aceras y 16,427.23 metros lineales de contenes, lo que corresponde al 73 % de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,


Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil

Dirección Asesoría Construcciones Municipales





PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

INFORMES DE PROYECTOS (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: Santo Domingo

MUNICIPIO: Santo Domingo Oeste

DISTRITO MUNICIPAL: Los Alcarrizos

BARRIO Y/O SECTOR:

Villas Progreso, Los Libertadores
Residencial Los Mercedes y La Esmeralda


2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

a. Gobierno Local ☐

b. Liga Municipal Dominicana ☐

c. Contratista ☒

Nombre ----- RNC-----



1- Villas Progreso Ing: Antonio Hilario RNC: 0010737283

2- Los Libertadores Grupo Sechas RNC: 132-18981-7


3- Residencial Los Mercedes Ing: Wondel Rodriguez RNC: 0011896
- La Esmeralda. Ing: Rudy Mateo RNC: 00110826062

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes: ☐
- b. Incluye demoliciones de tramos: ☐
- c. Incluye badenes: ☐
- d. Otros: _____

4- LOCALIZACION DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps.



TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		ANCHO DE LA CALLE (m)	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m ²)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	C/R San Marcos	18°31'49"N	70°22'29"E	18°31'55"N	70°23'10"E	4.90	79.50M	1.00M	159.00M ²	159.00M
Tramo B	c/ Larimar	18°31'54"N	70°23'10"E	18°31'54"N	70°23'30"E	3.80	0	0	0	200 M
Tramo C	d/ Res. Larimar	18°31'53"N	70°23'20"E	18°31'55"N	70°23'20"E	4.08	0	0	0	100 M
Tramo D	c/ Cornalio	18°31'53"N	70°23'00"E	18°31'52"N	70°23'20"E	3.50	0	0	0	120 M
Tramo E	c/ Onices	18°31'51"N	70°23'00"E	18°31'51"N	70°23'20"E	4.60	70	1.00M	70 M ²	140 M
Tramo F	c/ Rubi	18°31'50"N	70°23'20"E	18°31'53"N	70°23'40"E	6.10	201.53	1.00M	403.06M ²	403.06M
Tramo G	c/ Esmeralda	18°31'53"N	70°22'40"E	18°31'55"N	70°22'50"E	4.90	70.00M	1.00M	140 M ²	0
Tramo H	c/ A	18°31'56"N	70°22'50"E	18°31'55"N	70°22'70"E	5.43	50.00M	1.00M	80M ²	100.00M
Tramo I	c/ AMbar	18°31'56"N	70°22'80"E	18°31'50"N	70°22'60"E	5.60	180 M	1.00M	360M ²	360.00M
Tramo J	c/ Res. Ambar	18°31'51"N	70°22'60"E	18°31'54"N	70°22'40"E	5.30	60.00M	1.00M	120M ²	120 M
Tramo K										
Tramo L										



TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		ANCHO DE LA CALLE (m)	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	c/c	18°31'54"N	70°22'50"	18°31'53"N	70°22'27"	6.38	70 M	1.00 M	140 M ²	140 M
Tramo B	c/B	18°31'54"N	70°22'40"	18°31'55"N	70°22'50"	5.40	70 M	1.00 M	140 M ²	140 M
Tramo C	c/Santiago	18°31'53"N	70°22'27"	18°31'52"N	70°22'00"	4.54	50 M	1.00 M	100 M ²	100 M
Tramo D	c/Topacio	18°31'54"N	70°22'29"	18°31'56"N	70°23'00"	5.30	90 M	1.00 M	180 M ²	180 M
Tramo E	c/Jode	18°31'56"N	70°22'29"	18°31'50"N	70°22'28"	5.40	165	1.00 M	330 M ²	330 M
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										



5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Suministra los datos del Supervisor,

Nombre completo de Ingeniero:

Cedula:

Codia:

Entidad: CODIA ☒


Liga Municipal Dominicana ☐

Fecha de la visita técnica:

Valida y aprueba los datos suministrados,


Jaro Paz Mesa
001-1745702-8
31864

Miércoles 22/07/2022



Firma y Sello

Alcaldía Municipal o Junta Distrital



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 320601

REGIÓN: OZAMA

PROVINCIA: SANTO DOMINGO

MUNICIPIO: LOS ALCARRIZOS


DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 20 de enero de 2023

TÉCNICOS:


1. Ing. Richard Cabrera
2. Ing. Félix Tavárez
3. Arq. Yarissa Pérez
4. Ing. Danilo Mercado

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	BARRIO LA ESMERALDA. C/ ÁMBAR. (3,4)	35.60	1.00	1	56.10	1	35.6	56.1
TRAMO B	BARRIO LA ESMERALDA. C/ ÁMBAR. (5,6)	35.60	0.90	1	36.70	1	32.04	36.7
TRAMO C	BARRIO LA ESMERALDA. C/ ÁMBAR. (7,8)	27.70	0.90	1	27.70	1	24.93	27.7
TRAMO D	BARRIO LA ESMERALDA. C/ ÁMBAR. (9,10)	9.00	0.75	1	18.9	1	6.75	18.9
TRAMO E	BARRIO LA ESMERALDA. C/ ÁMBAR. (11,12)	118.50	0.75	1	145.4	1	88.875	145.4
TRAMO F	BARRIO LA ESMERALDA. C/ ÁMBAR. (13,14)	44.30	0.75	1	44.3	1	33.225	44.3
TRAMO G	BARRIO LA ESMERALDA. C/ ÁMBAR. (16,17)	17.80	1.00	1	17.8	1	17.8	17.8
TRAMO H	CALLE CRISTAL (18,19)	31.50	1.00	1	35	1	31.5	35
TRAMO I	CALLE CRISTAL (20,21)				36.2	1		36.2
TRAMO J	CALLE CRISTAL (22,23)	22.00	0.60	1	22	1	13.2	22
TRAMO K	CALLE CRISTAL (24,25)	34.90	1.00	1	34.9	1	34.9	34.9
TRAMO L	CALLE CRISTAL (26,27)	32.20	0.70	1	32.2	1	22.54	32.2
TRAMO M	CALLE JADE(28,29)	4.40	0.94	1	30.2	2	4.136	60.4
TRAMO N	CALLE JADE(30,31)				18.5	1		18.5
TRAMO O	CALLE JADE(32,33)	11.30	0.88	1			9.944	
TRAMO P	CALLE JADE(34,35)	81.50	0.81	1	82.3	1	66.015	82.3
TRAMO Q	CALLE JADE (36,37)	48.50	0.76	1	55.4	1	36.86	55.4
TRAMO R	CALLE CORDALINA (38,39)	44.80	0.60	1	69.8	2	26.88	139.6
TRAMO S	CALLE RESP. JADE(40,41)			1	2.9	1	0	2.9




LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO T	CALLE GEMA (42,43)	3.70	1.00	1	3.7	1	3.7	3.7
TRAMO U	BARRIO VILLA PROGRESO. CALLE PRINCESA (44,45)	17.00	1.00	1	17	1	17	17
TRAMO V	BARRIO VILLA PROGRESO. CALLE PRINCESA (46,47)	19.70	1.00	1	32.3	1	19.7	32.3
TRAMO W	BARRIO VILLA PROGRESO. CALLE PRINCESA (48,49)	31.12	1.00	1	34.6		31.12	
TRAMO X	BARRIO VILLA PROGRESO. CALLE PRINCESA (50,51)	100.60	1.00	1	100.6	2	100.6	201.2
TRAMO Y1	BARRIO VILLA PROGRESO. CALLE PRINCESA (52,53)	8.40	1.00	1	8.4	1	8.4	8.4
TRAMO Z1	BARRIO VILLA PROGRESO. CALLE PRINCESA (54,55)	28.10	1.00	1	28.1	1	28.1	28.1
TRAMO AA	BARRIO VILLA PROGRESO. CALLE PRINCESA (56,57)	27.80	1.00	1	27.8	1	27.8	27.8
TRAMO AB	BARRIO VILLA PROGRESO. CALLE PRINCESA (58,59)	28.20	1.00	1	28.2	1	28.2	28.2
TRAMO AC	BARRIO VILLA PROGRESO. CALLE PRINCESA (60,61)	18.10	1.00	1	18.11	1	18.1	18.11
TRAMO AD	BARRIO VILLA PROGRESO. CALLE PRINCESA (62,63)	23.40	1.00	1	23.4	1	23.4	23.4
TRAMO AE	CALLE SÁNCHEZ (68,67)	24.20	0.80	2	24.2	2	38.72	48.4
TRAMO AF	CALLE SÁNCHEZ (70,71)	7.30	0.80	1	7.3	1	5.84	7.3
TRAMO AG	CALLE SÁNCHEZ (72,73)	71.20	0.80	2	71.2	2	113.92	142.4
TRAMO AH	CALLE SÁNCHEZ (74,75)	10.10	0.60	1	10.1	1	6.06	10.1
TRAMO AI	CALLE SÁNCHEZ (76,77)	17.30	1.00	1	17.3	1	17.3	17.3
TRAMO AJ	CALLE SÁNCHEZ (78,79)	10.50	0.80	1	13.9	1	8.4	13.9
TRAMO AK	CALLE SÁNCHEZ (80,81)	27.90	1.00	1	27.9	1	27.9	27.9
TRAMO AL	CALLE SÁNCHEZ (82,83)	21.60	0.80	1	21.6	1	17.28	21.6
TRAMO AM	CALLE SÁNCHEZ (84,85)	12.20	0.80	1	12.2	1	9.76	12.2
TRAMO AN	CALLE SÁNCHEZ (86,87)	26.40	0.80	2	26.4	2	42.24	52.8
TRAMO AO	CALLE SÁNCHEZ (88,89)	11.10	0.80	1	11.1	1	8.88	11.1
TRAMO AP	CALLE SÁNCHEZ (90-91)	35.50	0.90	1	32	2	31.95	64
TRAMO AQ	CALLE JUAN PABLO (92,93)	90.90	0.80	1	134.3	2	72.72	268.6
TRAMO AR	CALLE HERMANOS DELINE (96,97)				2.8	2		5.6



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO AS	CALLE BOY SCOUT 3ERA (100,101)				3.6	2		7.2
TRAMO AT	CALLE BOY SCOUT 2DA (104,105)				45.7	2		91.4
TRAMO AU	CALLE BOY SCOUT 1ERA (108,109)	14.10	0.80	2	14.1	2	22.56	28.2
TRAMO AV	CALLE BOY SCOUT 1ERA (110,111)	29.55	0.80	2	29.55	2	47.28	59.1
TRAMO AW	BARRIO JUANA SALTITOPA. CALLEJON EL CANAL	294.60	0.81	1	424.8	1	238.626	424.8
TRAMO AX	BARRIO JUANA SALTITOPA. PROLONGACION 17 (L.I.)	205.90	1.11	1	224.3	1	228.549	224.3
TRAMO AY	BARRIO JUANA SALTITOPA. PROLONGACION 17 (L.D.)	192.60	1.17	1	192.6	1	225.342	192.6
TRAMO AZ	BARRIO JUANA SALTITOPA. RESPALDO 17	105.40	0.76	1	101.9	2	80.104	203.8
TRAMO BA	BARRIO JUANA SALTITOPA. CALLE LA TORRE	606.00	0.96	1	652	1	581.76	652
TRAMO BB	BARRIO JUANA SALTITOPA. CALLE RUDELANIA	8.40	1.06	1	40.2	1	8.904	40.2
TRAMO BC	BARRIO JUANA SALTITOPA. CALLE RESPALDO 6, LOS LIBERTADORES	137.30	0.89	1	137.3	1	122.197	137.3
TRAMO BD	BARRIO JUANA SALTITOPA. CALLE LOS CUERVOS				21.7	1		21.7
TRAMO BE	BARRIO JUANA SALTITOPA. CALLE MARISOL	120.80	0.78	1	140.1	1	94.224	140.1
TRAMO BF	BARRIO LAS MERCEDES. CALLE PRINCIPAL	183.60	1.22	1	183.6	1	223.992	183.6
TRAMO BG	BARRIO LAS MERCEDES. CALLE LOS PROFESORES	321.60	1.03	1	321.6	1	331.248	321.6
TRAMO BH	BARRIO LAS MERCEDES. CALLE LA POLLA	133.50	1.00	2	133.5	2	267	267
TRAMO BI	BARRIO LAS MERCEDES. CALLE LA FAMILIA	434.60	1.11	1	434.6	1	482.406	434.6
TRAMO BJ	BARRIO LAS MERCEDES. CALLE DE LEON	230.60	0.97	1	230.4	1	223.682	230.4



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO BK	BARRIO LAS MERCEDES. CALLE LOS REYES	195.80	1.50	1	195.8	1	293.7	195.8
TRAMO BL	BARRIO LAS MERCEDES. CALLE LAS FLORES	184.20	1.50	1	184.2	1	276.3	184.2
TRAMO BM	BARRIO LAS MERCEDES. CALLE PINEDA	315.60	1.86	1	315.6	1	587.016	315.6
TRAMO BN	BARRIO LAS MERCEDES. CALLE LAS MERCEDES	240.20	1.59	1	240.2	1	381.918	240.2
TRAMO BO	BARRIO LAS MERCEDES. CALLE SOSA	289.20	0.60	1	301.2	1	173.52	301.2
TRAMO BP	BARRIO LAS MERCEDES. CALLE LA YENI	156.60	1.00	1	156.6	1	156.6	156.6
Total							6239.21	7011.21


AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 25,008,585.40

Monto desembolsado RD\$ 25,008,585.41 (100%)

Avance de obra 104.29%





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: OZAMA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 20 de enero de 2023

PROVINCIA: SANTO DOMINGO
MUNICIPIO: LOS ALCARRIZOS

DISTRITO MUNICIPAL: -

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 6,239.21 metros cuadrados de aceras y 7,011.21 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS



1. En la construcción de las aceras y contenes, algunos tramos no lucían tan recientes de haberlos contruidos.
2. Se observó en la visita técnica realizada, que exceden el metraje asignado por la variación de precio unitario estimado por la institución.
3. En la construcción de las aceras y contenes, estos cumplen con las especificaciones que se plantean en programa que lleva la Liga Municipal Dominicana.
4. Se le hizo la observación de que al momento de hacer el vaciado del hormigón deben realizar una limpieza previa del retiro del material orgánico inservible.

IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

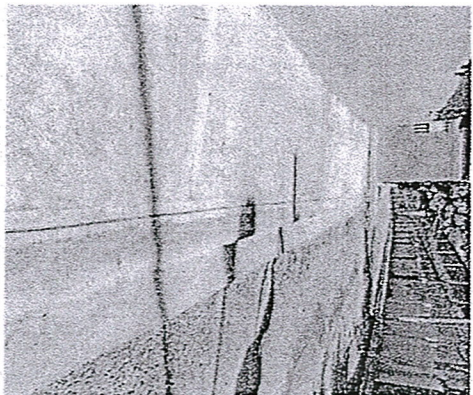


Suministra los datos de este reporte,

ING. RICHARD CABRERA

Técnico

ARO. YARISJA PEREZ

Técnico



ING. EÉHX TAVÁREZ

Técnico

ING. DANILLO MERCADO

Técnico

LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL


INFORME DE AVANCE DE OBRA (3er componente)

CODIGO: 320601
REGIÓN: OZAMA
PROVINCIA: SANTO DOMINGO
MUNICIPIO: LOS ALCARRIZOS
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 19 de diciembre de 2024

TÉCNICOS: 1. Ing. Ana Indhira Rámirez
2. Arq. Zunilda Del Rosario
3. Ing. Staylin Mendoza
4. CÉSAR DE LOS SANTOS
5. Ing. Richard Cabrera

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	SECTOR LA UNION, BARRIO LA FE 1RA							
TRAMO B	CALLE SAGRARIO DIAZ	308.69	1.00	1.00	169.49	2.00	308.69	338.98
TRAMO C	CALLE DIAZ	19.34	1.00	1.00	10.90	2.00	19.34	21.80
TRAMO D	CALLE RESP. DE LOS SANTOS	96.55	1.07	2.00	114.70	2.00	206.91	229.40
TRAMO E	CALLE ALTAGRACIA	228.35	1.07	2.00	277.55	2.00	486.51	555.10
TRAMO F	CALLE MERCEDES	18.60	0.86	2.00	23.65	2.00	31.85	47.30
TRAMO G	CALLE LOS HERMANOS PINZON	72.25	0.78	2.00	90.30	2.00	113.36	180.60
TRAMO H	CALLE DE LOS SANTOS	1,454.37	1.00	1.00	713.35	2.00	1,454.37	1,426.70
TRAMO I	CALLE MANUEL BRITO	43.58	1.00	1.00	58.70	1.00	43.58	58.70
TRAMO J	CALLE RESP. MANUEL BRITO	25.35	1.00	1.00	29.90	1.00	25.35	29.90
TRAMO K	CALLE SAN PEDRO	40.66	1.00	1.00	76.80	1.00	40.66	76.80
TRAMO L	SECTOR LA UNION, BARRIO LA FE 2DA							
TRAMO M	CALLE 1RA	134.60	1.08	2.00	134.60	2.00	289.68	269.20
TRAMO N	CALLE SAN MARCOS LADO IZQUIERDO	37.20	1.20	2.00	37.20	2.00	89.28	74.40
TRAMO O	CALLE HERMANAS MIRABAL	809.29	1.00	1.00	682.18	1.00	809.29	682.18
TRAMO P	CALLE MAURICIO LADO IZQUIERDO	20.00	0.66	1.00	20.00	1.00	13.20	20.00
TRAMO Q	CALLE F LADO IZQUIERDO	75.76	1.00	1.00	64.50	2.00	75.76	129.00
TRAMO R	CALLE MARTIN BAEZ	403.47	1.00	1.00	358.80	1.00	403.47	358.80
TRAMO S	CALLE SAN PEDRO	50.50	0.91	2.00	50.50	2.00	92.38	101.00
TRAMO T	CALLE SAN MARCOS LADO IZQUIERDO	26.80	1.00	1.00	26.80	1.00	26.80	26.80




LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO U	CALLE SANTA LUCIA	250.57	1.00	1.00	155.90	2.00	250.57	311.80
TRAMO V	CALLE SAN LUCAS	125.15	0.78	2.00	125.15	2.00	194.30	250.30
TRAMO W	CALLE LAS MERCEDES	434.16	1.00	1.00	376.20	1.00	434.16	376.20
TRAMO X	SECTOR LOS AMERICANOS, BARRIO SAN MIGUEL							
TRAMO Y1	CALLE 1RA	37.75	0.89	2.00	87.75	2.00	66.95	175.50
TRAMO Z1	CALLE CENTRAL	223.40	1.11	2.00	223.40	2.00	495.67	446.80
TRAMO AA	SECTOR LA PIÑA, BARRIO VILLA MARIA							
TRAMO AB	CALLE JUAN BOSCH	62.05	1.11	2.00	100.10	2.00	138.34	200.20
TRAMO AC	CALLE CAAMAÑO	74.55	0.98	2.00	158.95	2.00	145.94	317.90
TRAMO AD	CALLE JOAQUIN BALAGUER	64.00	1.00	2.00	59.45	2.00	128.00	118.90
Total							6,384.41	6,824.26

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

MONTO ASIGNADO RD\$ 61,354,041.68
 MONTO DESEMBOLSADO RD\$ 30,677,020.84 (50%)
 Avance de obra 42.02%

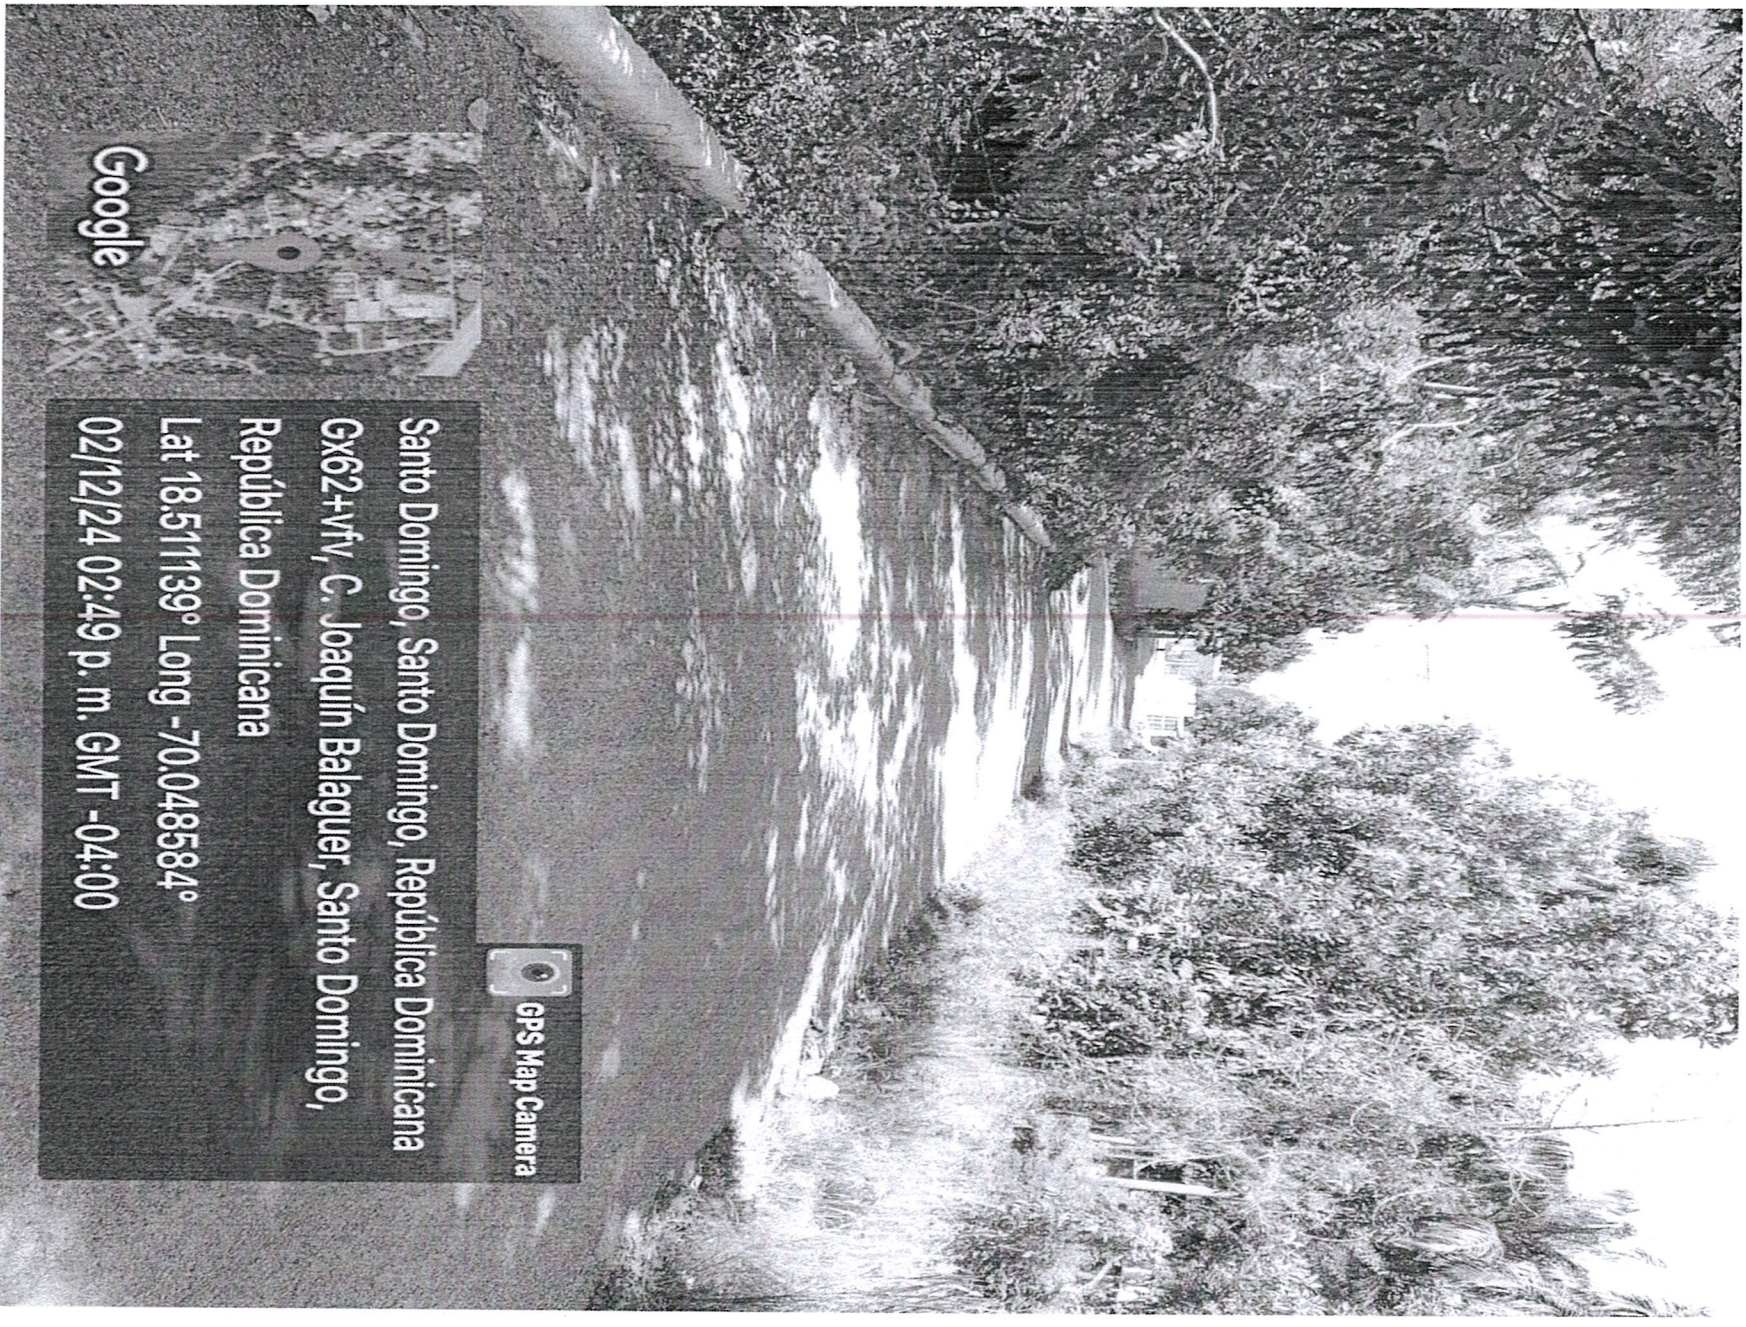


GPS Map Camera

Santo Domingo, Santo Domingo, República Dominicana
Gx62+vtv, C. Joaquín Balaguer, Santo Domingo,
República Dominicana

Lat 18.511139° Long -70.048584°

02/12/24 02:49 p. m. GMT -04:00

Google

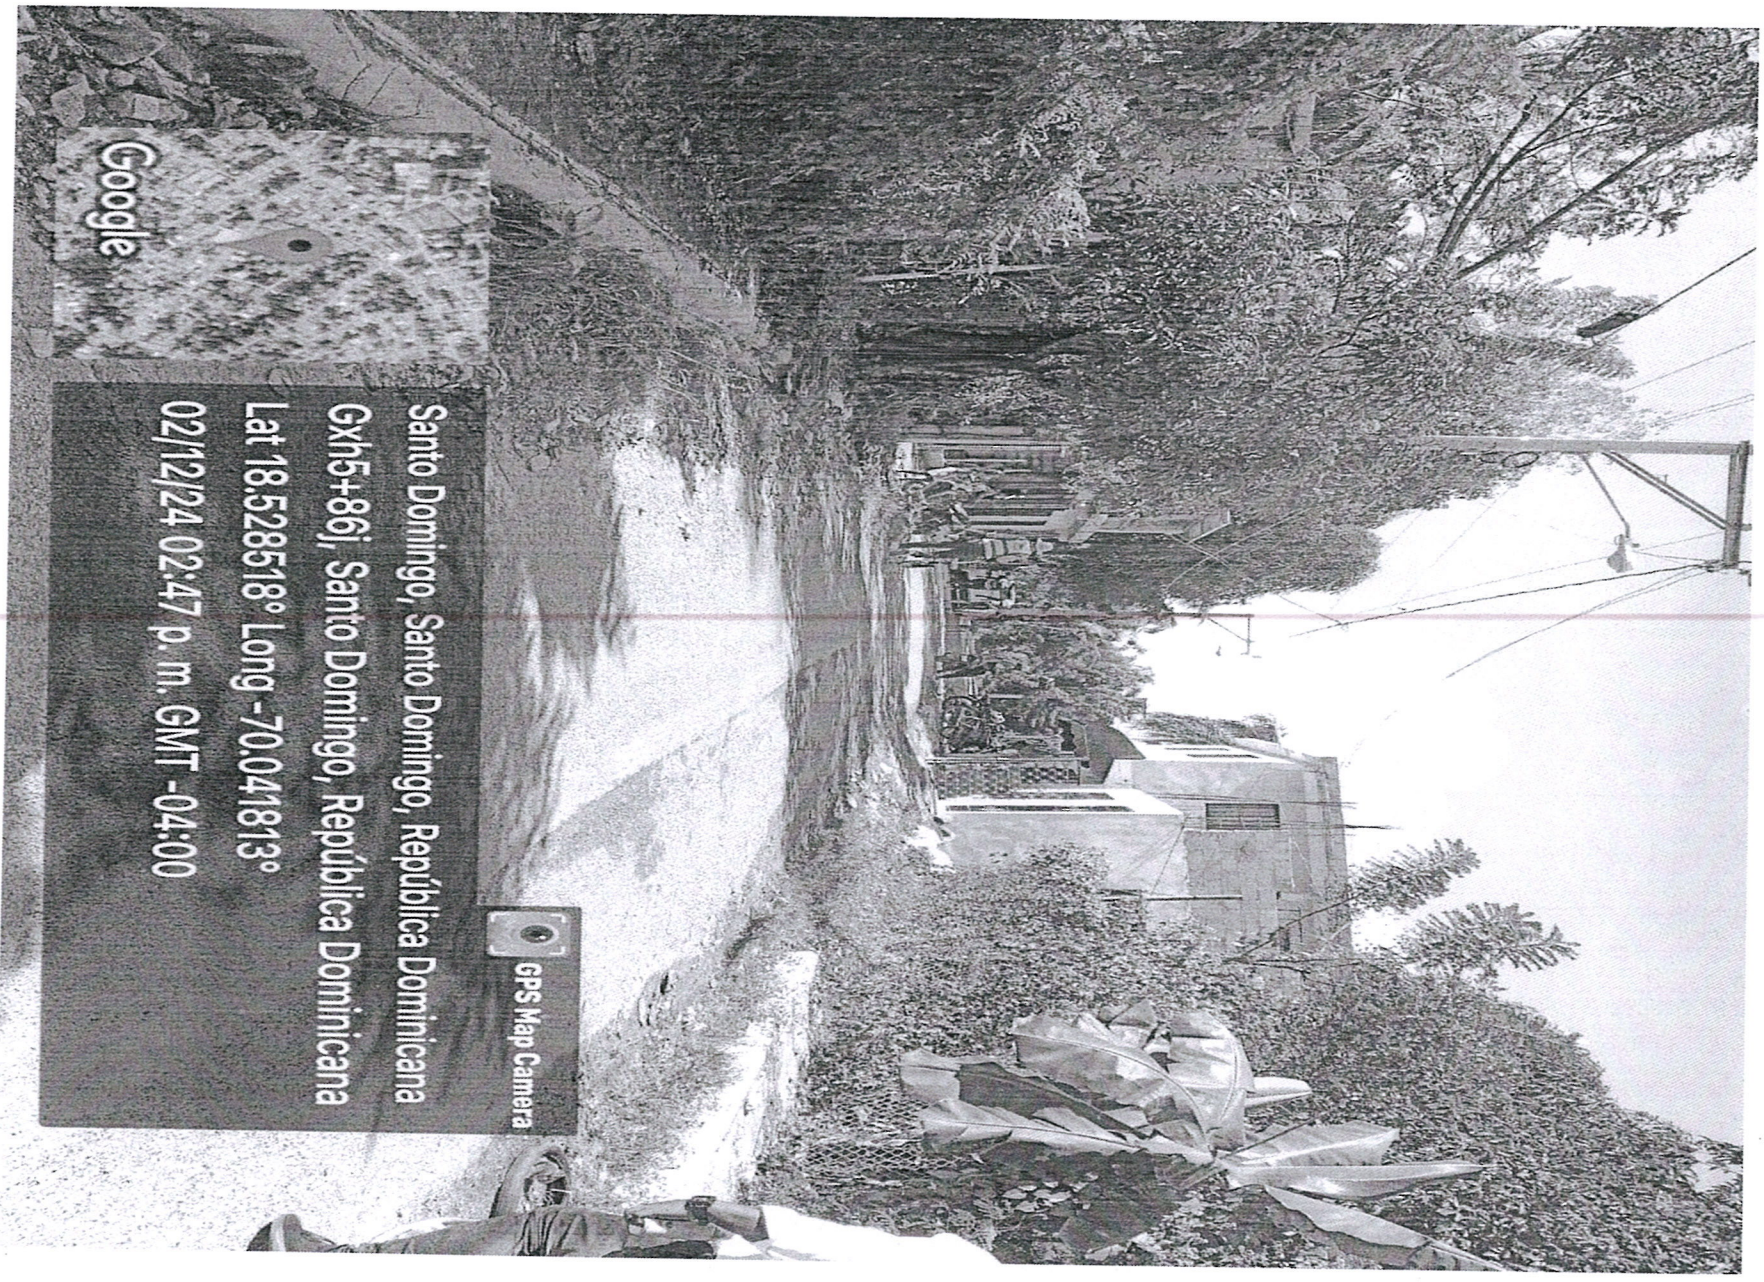

Google

Santo Domingo, Santo Domingo, República Dominicana
Gxh5+86j, Santo Domingo, República Dominicana
Lat 18.528518° Long -70.041813°
02/12/24 02:47 p. m. GMT -04:00




GPS Map Camera



Google

Santo Domingo, Santo Domingo, República Dominicana
Gxn5+86j, Santo Domingo, República Dominicana
Lat 18.528518° Long -70.041813°
02/12/24 02:47 p. m. GMT -04:00

GPS Map Camera

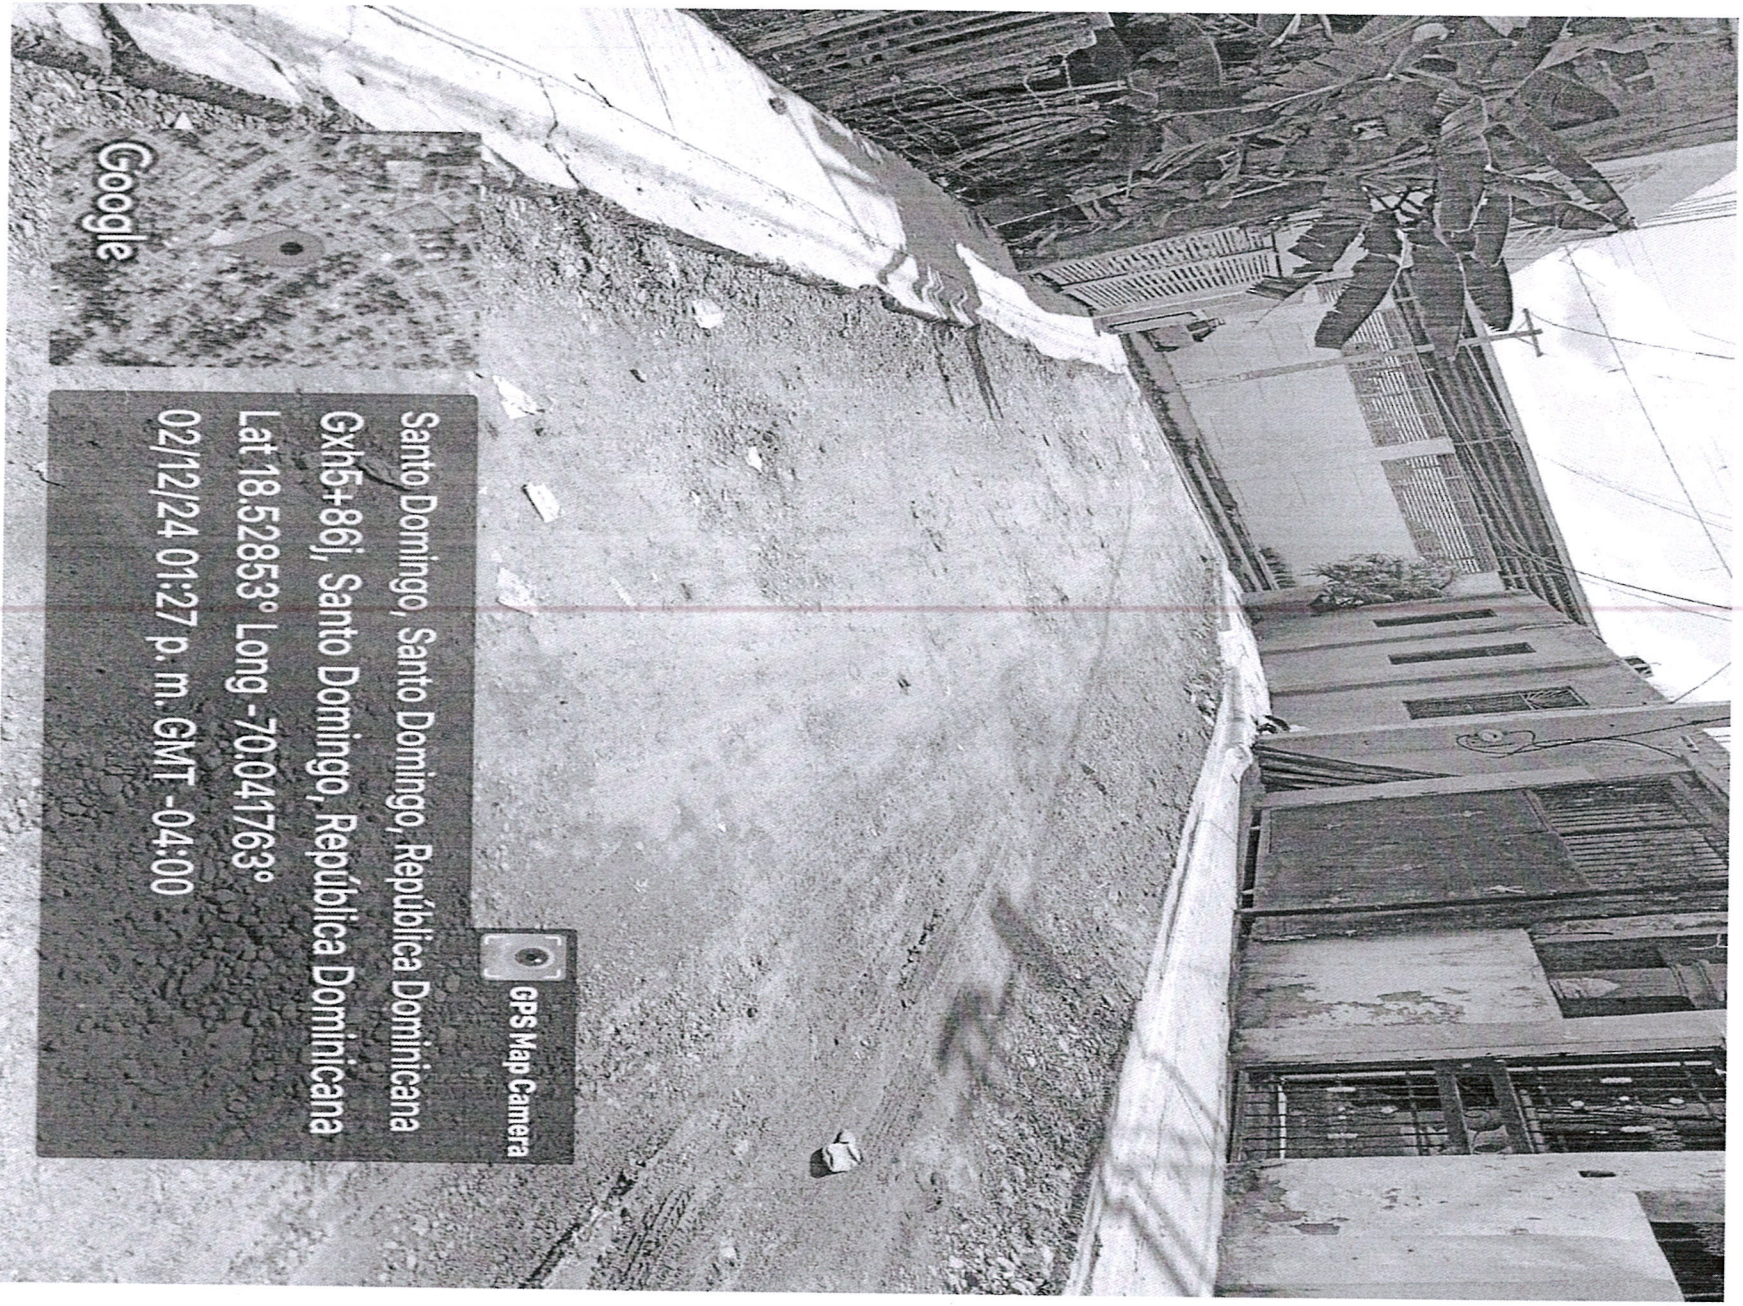

GPS Map Camera

Santo Domingo, Santo Domingo, República Dominicana
Gxh5+86j, Santo Domingo, República Dominicana
Lat 18.52853° Long -70.041763°
02/12/24 01:27 p. m. GMT -04:00

Google



Liga Municipal Dominicana


Sector La Unión Barrio La Fe Los Alcarrí

02.12.2024 13:15

18.52913 -70.04219

GXJ5+J3Q, C. Respaldo San Marcos, Santo Domingo



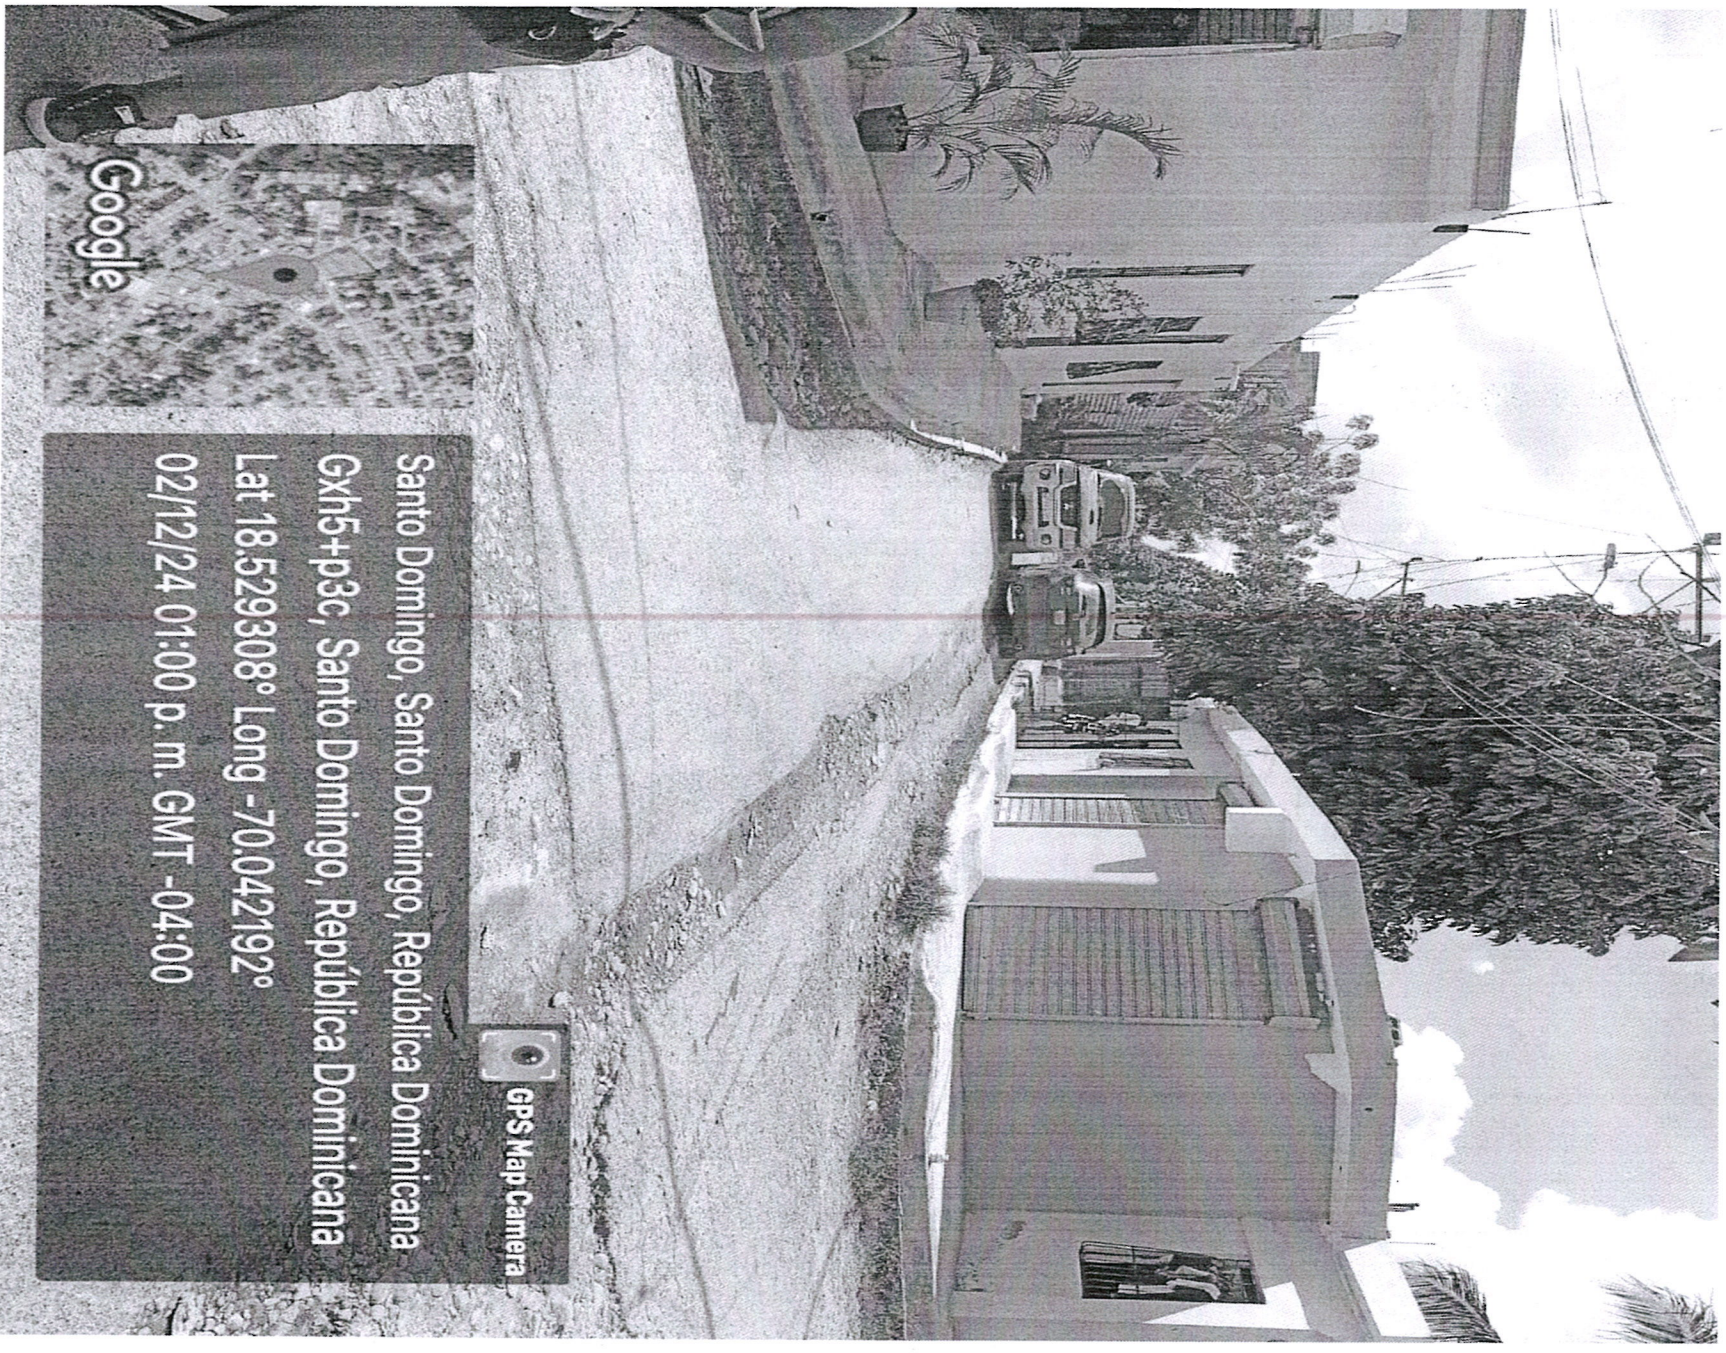


Google



GPS Map Camera

Santo Domingo, Santo Domingo, República Dominicana
Gxh5+p3c, Santo Domingo, República Dominicana
Lat 18.529308° Long -70.042192°
02/12/24 01:00 p. m. GMT -04:00



LIGA MUNICIPAL -DOMINICANA-

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: OZAMA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 19 de diciembre de 2024


PROVINCIA: SANTO DOMINGO

MUNICIPIO: LOS ALCARRIZOS

DISTRITO MUNICIPAL: -


INFORME DE AVANCE DE OBRA

A la fecha de 19/12/2024 se ha ejecutado 6,384.41 metros cuadrados de aceras y 6,824.26 metros lineales de contén, lo que corresponde al 42.02% del fondo asignado para este territorio.

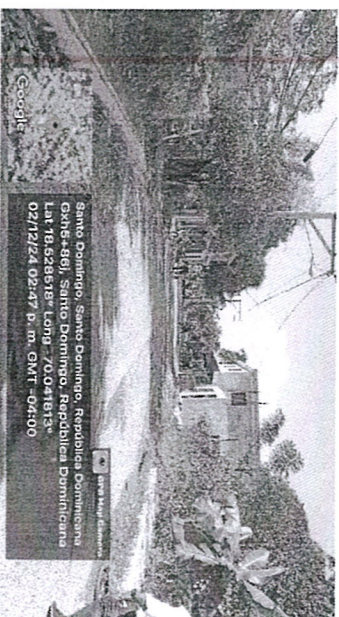


Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RAMÍREZ
Técnico


ARQ. ZUNILDA DEL ROSARIO
Técnico


ING. RICHARD CABRERA
Ingeniero


ING. STAYLIN MENDOZA
Ingeniero


CESAR ARIEL DE LOS SANTOS
Técnico

