

## -DOMINICANA-

# SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CODIGO: 220203

REGIÓN: EL VALLE

PROVINCIA: SAN JUAN MUNICIPIO: BOHECHÍO DISTRITO MUNICIPAL: YAQUE

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 4 de mayo de 2022

1. lng. Ana Indhira Rámirez

TÉCNICOS: 2. Elizabeth García

TRAMOS NO		TRAMIO A CALLE PRI	TRAMO B CALLE PRINCIPAL	TRAMO C CALLE PRINCIPAL	TRAMO D CALLE PRINCIPAL	TRAMO E CALLE PRINCIPAL	TRAMO F CALLE PRINCIPAL	TRAMO G CALLE PRINCIPAL	TRAMO H CALLE PRINCIPAL	TRAMO I CALLE PRINCIPAL	TRAMO J CALLE PRINCIPAL	TRAMO K CALLE PRINCIPAL	TRAMO L CALLE PRINCIPAL			
NOMBRE DE LA CALLE		CALLE PRINCIPAL (LATERAL DERECHO)	NCIPAL	NCIPAL	NCIPAL											
LONGITUD DE ACERAS	(m)															
ANCHO DE ACERAS	(m)															
CANTIDAD DE LADOS CON	ACERAS															
LONGITUD	(m)	141.60	167.90	10.90	234.5	121.1	29.5	11.7	37	87.2	20	102.65	35.3	153,4	, 72.5	
CANTIDAD DE LADOS CON	CONTENES	نسا	ы	دسز	jana).	js	₽	₽	J>	<u>~</u>	1	ь	[mà	L	₩	And the second name of the secon
TOTAL DE ACERAS	(m2)															0
TOTAL DE CONTENES	(m)	141.6	167.9	10.9	234.5	121.1	29.5	11.7	37	87.2	20	102.65	35.3	153.4	72.5	1225.25

2	
0	
20	
Ü	
Ė	
2	
$\geq$	
4	
B	
≦	
S	
Ξ	
ITO DE	
B	
=	
S	
PE	
CCION	
$\stackrel{\frown}{=}$	
9	
-	
¥	
2	
5	
-05-	
5-22	
10	

Monto asignado RD\$ 3,060,126.90 Monto desembolsado RD\$ 1,530,063.46 (50%)

Avance de obra 100.40%

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA



## SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: EL VALLE

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 4 de mayo de 2022

PROVINCIA: SAN JUAN MUNICIPIO: BOHECHÍO

**DISTRITO MUNICIPAL: YAQUE** 


## REPORTE

A la fecha de 04/05/2022 se ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 1,225.25 metros lineales de contén, lo que corresponde al 100.4% del fondo asignado para este territorio.

## **NOTAS**

- 1. Este distrito esta ejecutando por administración.
- 2. Se puede apreciar los contenes con su pendiente correcta y altura adecuada con respeto al nivel de la calle.
- 3. Tienen ejecutado un solo sector y tienen estimado intervenir dos sectores mas que son Guayuyal y

## **IMÁGENES**

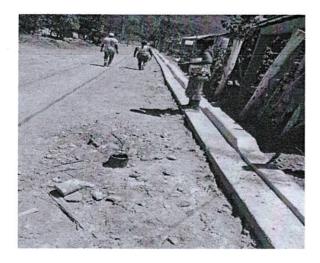





## LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA-









Suministra los datos de este reporte,

ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ

Técnico

ELIZABETH GARCÍA
Técnico

LIGA MUNICIPAL -DOMINICANA-

Santo Domin's
