



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


CODIGO: 230202
REGIÓN: HIGUAMO
PROVINCIA: SAN PEDRO DE MACORÍS
MUNICIPIO: LOS LLANOS
DISTRITO MUNICIPAL: EL PUERTO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 26 de mayo de 2023
TÉCNICOS: 1. Ing. Staylin Mendoza
2. Felipe Reyes

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CARRETERA EL PUERTO LOS LLANOS (CALLE DUARTE)				816.55	2.00		1.633.10
TRAMO DL	CALLE DUARTE				423.85	2.00		847.70
Total							-	2,480.80

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,058,500.08
Monto desembolsado RD\$ 1,529,250.05 (50%)
Avance de obra 205.37%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: HIGUAMO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 26 de mayo de 2023

PROVINCIA: SAN PEDRO DE MACORÍS

MUNICIPIO: LOS LLANOS

DISTRITO MUNICIPAL: EL PUERTO


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 2,480.80 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Esta Distrito esta construyendo por contrato.
2. Solo fuerón construido contenes , por tal cual fuerón ejecutado en la carretera principal.
3. Sobre la calidad y terminación de los mismo, se nota buena estética en la terminación de los mismo.

IMÁGENES

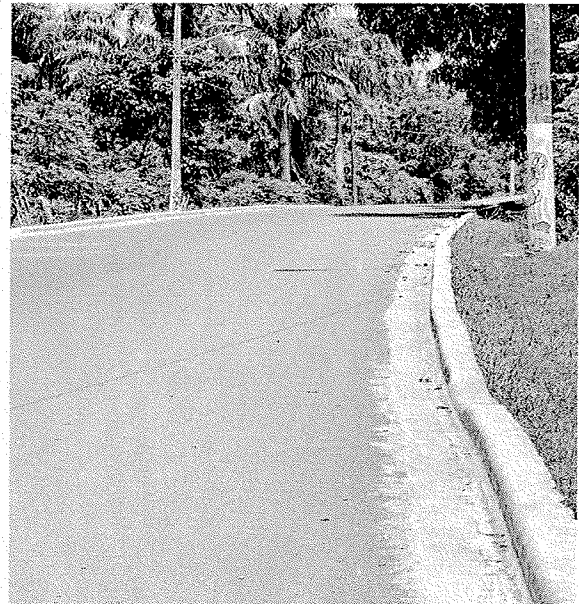




LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,


ING. STAYLIN MENDOZA
Técnico


FELIPE REYES
Técnico

