

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARIA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 260201

REGIÓN: CIBAO NOROESTE

PROVINCIA: SANTIAGO RODRÍGUEZ

MUNICIPIO: VILLA LOS ALMACÍGOS

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 27/9/22

1. Ing. Richard Cabrera

TÉCNICOS: 2. Ing. Asaín Ferreras

| TRAMOS | NOMBRE DE LA CALLE | LONGITUD DE ACERAS (m) | ANCHO DE ACERAS (m) | CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS | LONGITUD CONTENES (m) | CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES | TOTAL DE ACERAS (m ²) | TOTAL DE CONTENES (m) |
|---------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| TRAMO A | CALLE DUARTE | 198.50 | 0.95 | 2 | 198.50 | 2 | 377.15 | 397 |
| TRAMO B | | 143.75 | 1.00 | 2 | 143.75 | 2 | 287.5 | 287.5 |
| TRAMO C | | 70.00 | 1.00 | 2 | 70.00 | 2 | 140 | 140 |
| TRAMO D | | 4.00 | 1.00 | 2 | 4.00 | 2 | 8 | 8 |
| TRAMO E | | 195.10 | 1.00 | 2 | 195.1 | 2 | 390.2 | 390.2 |
| TRAMO F | | 131.00 | 1.00 | 2 | 131 | 2 | 262 | 262 |
| TRAMO G | | | | | | | | |
| TRAMO H | | | | | | | | |
| TRAMO I | | | | | | | | |
| TRAMO J | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | 1454.85 | 1484.70 |

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,819,416.13

Monto desembolsado RD\$ 3,819,416.13 (100%)

Avance de obra 145.57%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NOROESTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 27/9/22

PROVINCIA: SANTIAGO RODRÍGUEZ

MUNICIPIO: VILLA LOS ALMÁCIGOS

DISTRITO MUNICIPAL: -


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se certifica que el Gobierno Local ha ejecutado 1,464.85 metros cuadrados de aceras y 1,484.70 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Las aceras y contenes ejecutadas cumplen con los requerimientos técnicos sugeridos.

IMÁGENES

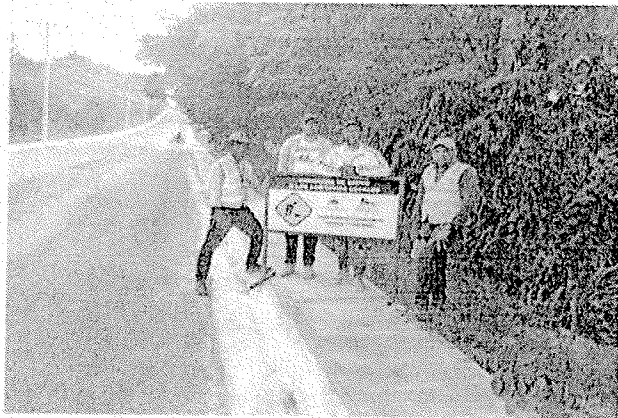



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,

ING. RICHARD CABRERA

Técnico

ING. ASAMÍN FERRERAS

Técnico

