



SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


CODIGO: 270204
REGIÓN: CIBAO NOROESTE
PROVINCIA: VALVERDE
MUNICIPIO: ESPERANZA
DISTRITO MUNICIPAL: BOCA DE MAO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 7 de febrero de 2023
TÉCNICOS: 1. Arq. Keilin Mora
 2. Ing. Danilo Mercado

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	BARRIO CENTRAL 10 DE SEPTIEMBRE CARRETERA MAO							
TRAMO B	CALLE PRINCIPAL CARRETERA MAO	279.60	2.45	1			685.02	
TRAMO C	SETOR EL PUENTE SAN RAFAEL BARRIO LAS FLORES							
TRAMO D	CALLE LAS FLORES				39.20	1		39.2
TRAMO E	CALLE A				50.4	2		100.8
TRAMO F	CALLE B				40.4	2		80.8
TRAMO G	CALLE C	26.70	0.95	1	42.6	1	25.365	42.6
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J	CALLE 10 DE SEPTIEMBRE				279.6	1		279.6
TRAMO K	CALLE 26 DE JULIO FRENTE AL COLMADO VARGAS	48.30	1.45	1			70.035	
TRAMO L	CALLE 27 DE FEBRERO				70.8	1		70.8
TRAMO M	CALLE 26 DE JULIO	78.90	1.30	1	77.9	1	102.57	77.9
TRAMO N	CALLE 26 DE JULIO				22.4	1		22.4
TRAMO O	CALLE 26 DE JULIO				15.01	1		15.01
TRAMO P	CALLE TOMAS MARTINEZ				65.6	1		65.6
Total							882.99	794.71

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,093,856.22
 Monto desembolsado RD\$ 3,093,856.22 (100%)
 Avance de obra 100.15%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NOROESTE
PROVINCIA: VALVERDE
MUNICIPIO: ESPERANZA
DISTRITO MUNICIPAL: BOCA DE MAO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 7 de febrero de 2023

INFORME DE AVANCE DE OBRA


A la fecha de 07/02/2023 se ha ejecutado 616.76 metros cuadrados de aceras y 263.40 metros lineales de contén, lo que corresponde al 46.18% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS



1. La obra se está ejecutando vía administración.
2. El proyecto cumple con los estándares de calidad recomendados por el programa.
3. La construcción de las aceras que se ejecutaron en la avenida de principal tienen un ancho superior a un(1) metro.

IMÁGENES






LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

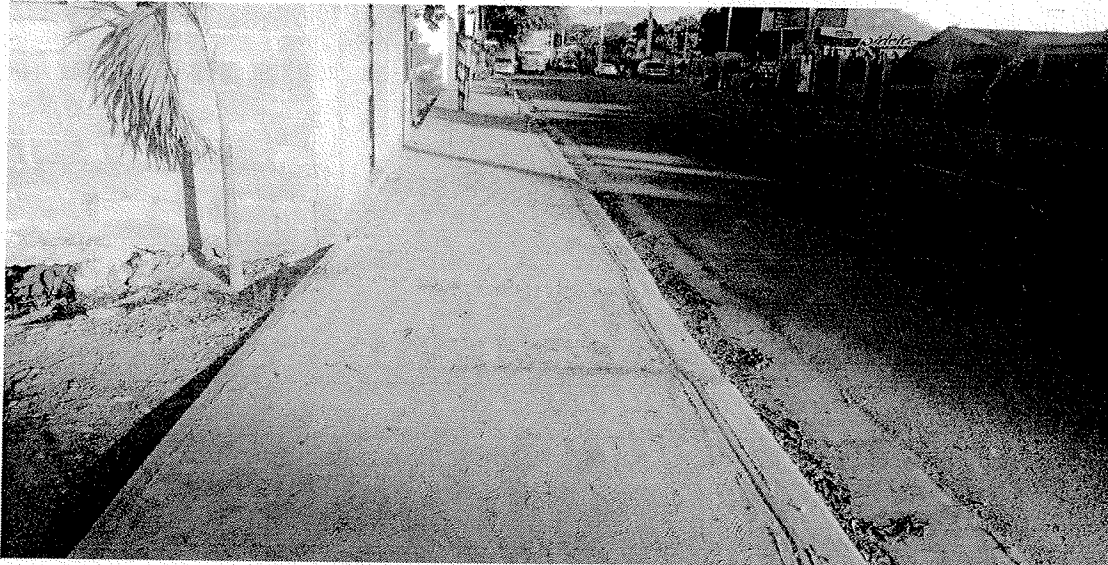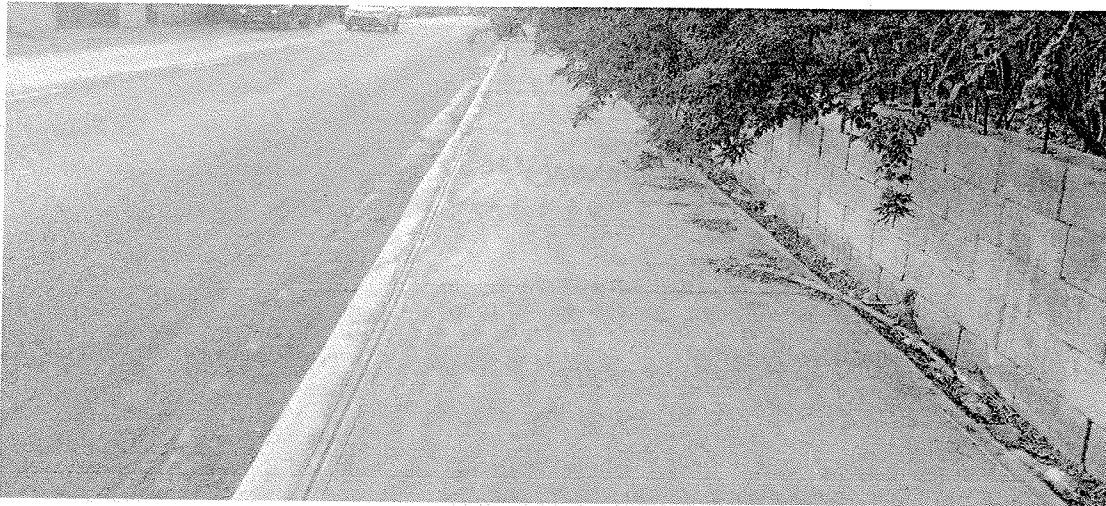

Suministra los datos de este reporte,


ARQ. KEILIN MORA
Técnico

