



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CODIGO: 270303

REGIÓN: CIBAO NOROESTE

PROVINCIA: VALVERDE

MUNICIPIO: LAGUNA SALADA

DISTRITO MUNICIPAL: LA CAYA

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 17/08/2022

1. Ing. Danilo Mercado

TÉCNICOS: 2. Ing. Asamín Ferreras


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C.YANETT				218.00	2		436
TRAMO B	C.DIONICIO ALMANZAR(Lateral Izq.)	93.30	1.80	1	174.10	1	167.94	174.1
TRAMO C	C.DIONICIO ALMANZAR(Lateral Der.)	95.70	2.00	1	147.40	1	191.4	147.4
TRAMO D								
Total							359.34	757.5

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,764,697.12

Monto desembolsado RD\$ 1,382,348.57 (50%)

Avance de obra 85.21%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NOROESTE

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 17/08/2022

PROVINCIA: VALVERDE

MUNICIPIO: LAGUNA SALADA

DISTRITO MUNICIPAL: LA CAYA


REPORTE

A la fecha de 17/08/2022 se ha ejecutado 359.34 metros cuadrados de aceras y 757.50 metros lineales de contén, lo que corresponde al 85.21% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS


1. La obra la estan ejecutando por contrato.
2. Lo realizado hasta la fecha se ha ejecutado con el 50% entregado por la Institución.

IMÁGENES

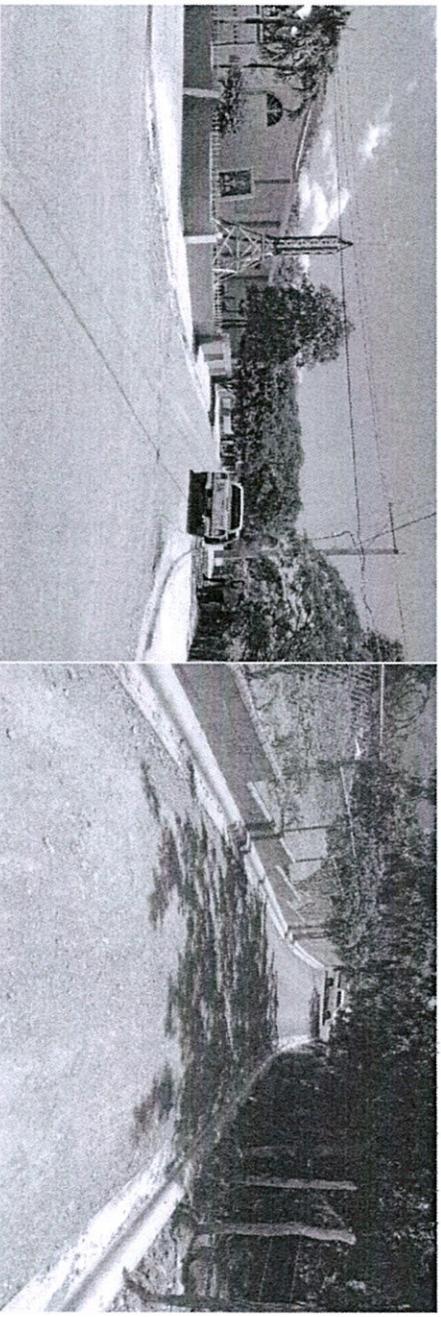



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

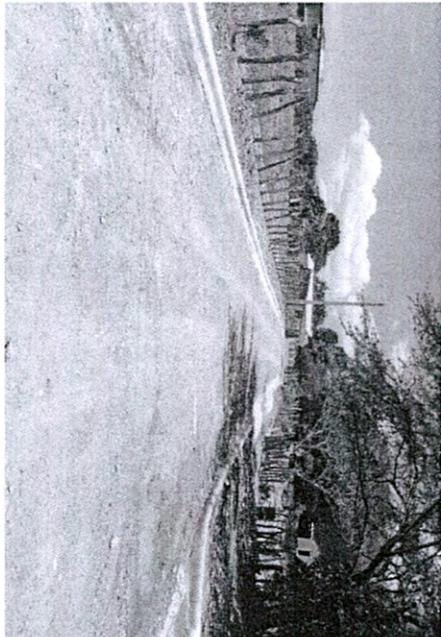

Suministra los datos de este reporte,


ING. DANILLO MERCADO
Técnico


ING. ASAMIN FERRERAS
Técnico

