



SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


CODIGO: 280105
REGIÓN: CIBAO SUR
PROVINCIA: MONSEÑOR NOUEL
MUNICIPIO: BONAÓ
DISTRITO MUNICIPAL: JAYACO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 7 de julio de 2022
1. Ing. Staylin Mendoza
TÉCNICOS: 2. Arq. Keilin Mora

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	Puerto rico				23.70	1.00		23.70
TRAMO B	Puerto rico				34.90	1.00		34.90
TRAMO C	Puerto rico				14.00	1.00		14.00
TRAMO D	Puerto rico				53.40	2.00		106.80
TRAMO E	Puerto rico				12.70	1.00		12.70
TRAMO F	Puerto rico				212.50	2.00		425.00
TRAMO G	Puerto rico				9.70	2.00		19.40
TRAMO H	Puerto rico				11.00	1.00		11.00
TRAMO I	Puerto rico				285.40	2.00		570.80
TRAMO J	Puerto rico				17.70	1.00		17.70
TRAMO K	Puerto rico				208.90	2.00		417.80
Total							-	1,653.80

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,479,736.96
Monto desembolsado RD\$ 3,479,736.97 (100%)
Avance de obra 118.97%





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO SUR
PROVINCIA: MONSEÑOR NOUEL
MUNICIPIO: BONAÓ
DISTRITO MUNICIPAL: JAYACO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 7 de julio de 2022


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 1,653.80 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.


NOTAS

1. Esta alcaldía solo ejecuto contenes para el aprovechamiento del programa de asfalto que se realizara en esa localidad
2. Estos contenes fueron ejecutado bajo los parametros establecidos con relacion a la terminacion y los niveles correspondientes.

IMÁGENES

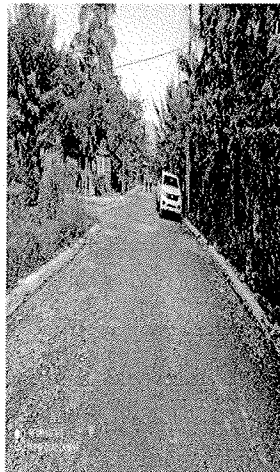

Suministra los datos de este reporte,


ING. STAYLIN MENDOZA
Técnico


ARQ. KEILYN MORA
Técnico
