

# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

**CODIGO:** 280302  
**REGIÓN:** CIBAO SUR  
**PROVINCIA:** MONSEÑOR NOUEL  
**MUNICIPIO:** PIEDRA BLANCA  
**DISTRITO MUNICIPAL:** VILLA DE SONADOR

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 7 de febrero de 2023  
**TÉCNICOS:**  
 1. Ing. Edward Acosta  
 2. Ing. Staylin Mendoza

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m <sup>2</sup> )	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CARRETERA VIEJA, LA COLONIA A	260.60	1.13	1	236.30	1	295.549	236.3
TRAMO B	CARRETERA RICON-YUBOA, LA COLONIA B	269.60	1.01	1	298.00	1	273.38	298
TRAMO C	CALLE PASCUDA HERNANDEZ, SONADOR A				79.10	2		158.2
TRAMO D	CALLE MIGUEL FLORES				72.85	2		145.7
TRAMO E	CALLE DOÑA PORFIRIA DE PEREZ				148.75	2		297.5
TRAMO F	CALLE ANTONIO SUSANA				94.5	2		189
TRAMO G	SONADOR B, CALLE JUAN BOSCH				65.44	2		130.88
TRAMO H	CALLE 22 DE ABRIL				64.7	2		129.4
TRAMO I								
TRAMO J								
<b>Total</b>							<b>568.93</b>	<b>1584.98</b>

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,368,788.11  
 Monto desembolsado RD\$ 1,684,394.06 (50%)  
 Avance de obra 138.21%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

**SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

**REGIÓN:** CIBAO SUR

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 7 de febrero de 2023

**PROVINCIA:** MONSEÑOR NOUEL

**MUNICIPIO:** PIEDRA BLANCA

**DISTRITO MUNICIPAL:** VILLA DE SONADOR

## **INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN**

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 568.93 metros cuadrados de aceras y 1,584.98 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

### **NOTAS**


1. Esta obra fue ejecutada por contrato
2. Tanto las aceras como los contenes presentan buenas terminacion visual
3. Se construyeron en diferentes sectores de los cuales en el sector de Sonador A Y B se ejecuto solo contenes por el poco espacio encontrado.

### **IMÁGENES**





# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

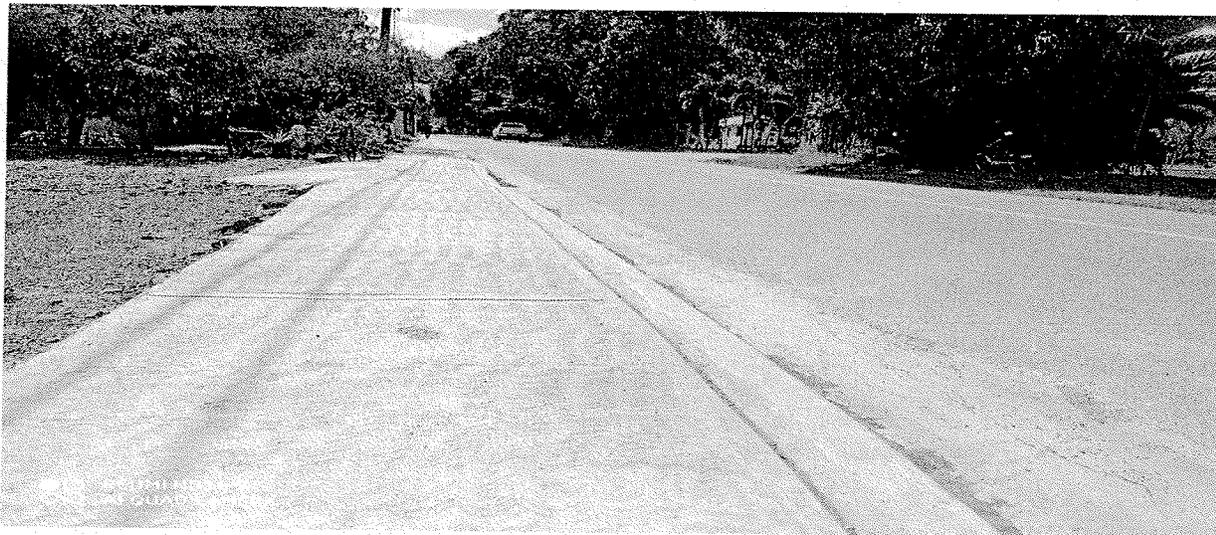

*Suministra los datos de este reporte,*

*Edward A.*

ING. EDWARD ACOSTA

Técnico

*Staylin Mendoza*

ING. STAYLIN MENDOZA

Técnico

