

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 290303
REGIÓN: HIGUAMO
PROVINCIA: MONTE PLATA
MUNICIPIO: SABANA GRANDE DE BOYÁ
DISTRITO MUNICIPAL: MAJAGUAL

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 24 de febrero de 2023
1. Ing. Richard Cabrera

TÉCNICOS:

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	DUARTE	230.20	1.02	1	51.83	1	234.15	51.83
TRAMO B	LA EZEQUIELA	259.49	1.08	1			279.08	
TRAMO C	DUARTE	324.15	1.02	1	15.90	1	331.15	15.9
TRAMO D	PRINCIPAL	310.30	1.06	1	91.23	1	329.44	91.23
TRAMO E	DEL PARQUE	262.80	1.31	1	35.50	1	344.27	35.5
TRAMO F	JOSE VERA	97.50	0.98	1			95.55	
TRAMO G	PROYECTO 1	673.60	1.15	1	82.90	1	774.64	82.9
TRAMO H	BOHECHIO							
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							2338.27	277.36

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,849,942.28
Monto desembolsado RD\$ 1,424,971.14 (50%)
Avance de obra 136.76%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: HIGUAMO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 24 de febrero de 2023

PROVINCIA: MONTE PLATA

MUNICIPIO: SABANA GRANDE DE BOYÁ

DISTRITO MUNICIPAL: MAJAGUAL


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 2,388.27 metros cuadrados de aceras y 277.36 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. Esta obra fue ejecutada por administración.
2. Se pudo observar durante la visita una buena terminación en las aceras y contenes ejecutados.

IMÁGENES

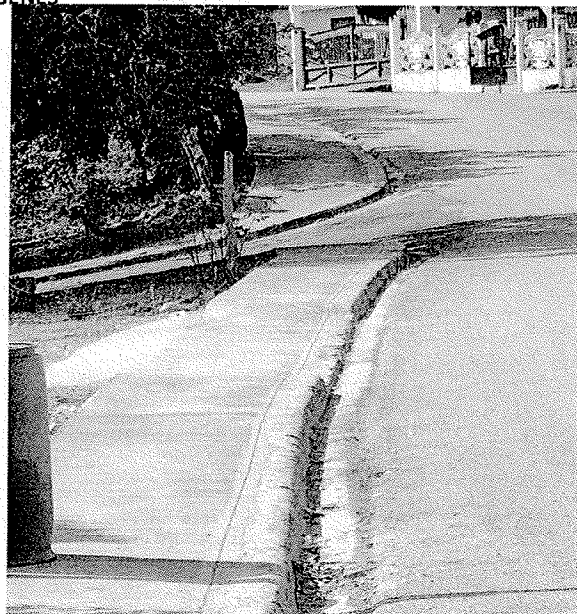



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

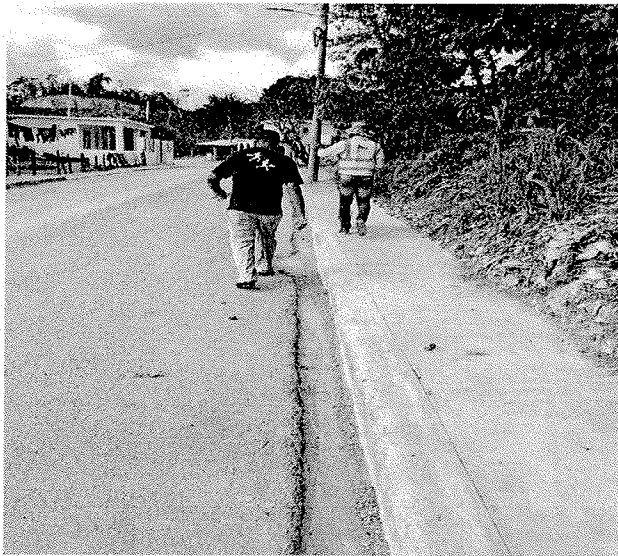

Suministra los datos de este reporte,

ING. RICHARD CABRERA
Técnico

Técnico
