

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 300301
REGIÓN: HIGUAMO
PROVINCIA: HATO MAYOR
MUNICIPIO: EL VALLE
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 8 de febrero de 2023
TÉCNICOS: 1. Ing. Richard Cabrera
 2. Felipe Reyes

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CLETO CORNIELLE	14.30	1.00	1	14.30	1	14.3	14.3
TRAMO B	ROBERT KENNEDY	231.30	1.00	2	231.30	2	462.6	462.6
TRAMO C	ROBERT KENNEDY	63.00	1.00	2	63.00	2	126	126
TRAMO D	PROVENIR	126.30	1.00	2	126.30	2	252.6	252.6
TRAMO E	SAN ANTONIO	98.80	1.00	2	98.8	2	197.6	197.6
TRAMO F	SAN ANTONIO	126.40	1.00	2	126.4	2	252.8	252.8
TRAMO G	ROBERT KENNEDY	119.00	1.00	2	119	2	238	238
TRAMO H	ROBERT KENNEDY				121.5	2		243
TRAMO I	JUAN JOSE MATOS				77	2		154
TRAMO J								
Total							1543.90	1940.90

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,390,478.99
 Monto desembolsado RD\$ 3,390,478.99 (100%)
 Avance de obra 205.87%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: HIGUAMO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 8 de febrero de 2023

PROVINCIA: HATO MAYOR

MUNICIPIO: EL VALLE

DISTRITO MUNICIPAL: -

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,543.90 metros cuadrados de aceras y 1,940.90 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. Cumplen con el metraje.
2. No han podido avanzar mas por las lluvias.
3. Cumplen con los parametros de construcción.

IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

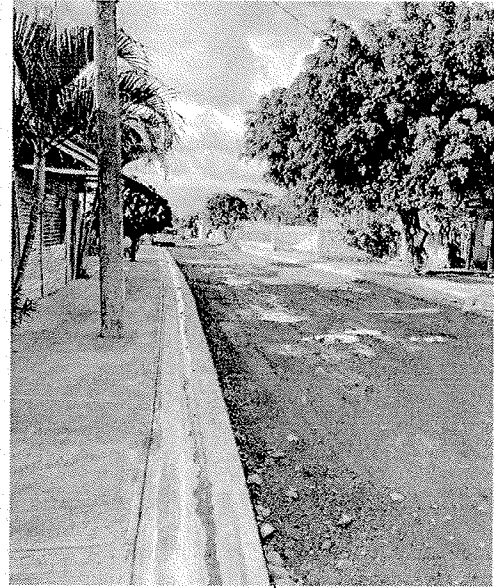

Suministra los datos de este reporte,

ING. RICHARD CABRERA

Técnico

FELIPE REYES

Técnico

