



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE AVANCE DE OBRA

CODIGO: 320101
REGIÓN: OZAMA
PROVINCIA: SANTO DOMINGO
MUNICIPIO: SANTO DOMINGO ESTE
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 22 de noviembre de 2022

TÉCNICOS:
 1. Ing. Edward Acosta
 2. Arq. Keilin Mora
 3. Ing. Staylin Mendoza
 4. Ing. Richard Cabrera

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	YOLANDA GUZMAN LOTE: 7	115.50	0.97	1	115.50	1	112.035	115.5
TRAMO B	YOLANDA GUZMAN LOTE: 7	118.70	1.10	1	118.70	1	130.57	118.7
TRAMO C	CALLE MELLA LOTE: 2	325.10	0.40	1	325.10	1	130.04	325.1
TRAMO D	DON TINO	6.00	0.90	1	6.00	1	5.4	6
TRAMO E	DON TINO	46.10	0.90	1	46,1	1	41.49	
TRAMO F	DON TINO	83.00	1.00	1	83	1	83	83
TRAMO G	DON TINO	28.70	1.00	1	28,7	1	28.7	28.7
TRAMO H	DON TINO	31.60	0.90	1	31,6	1	28.44	
TRAMO I	DON TINO	85.30	1.00	1	85,3	1	85.3	85.3
TRAMO J	DON TINO				5,6	1		5,6
TRAMO K	VIRGILIO PERDOMO LOTE: 9	51.90	0.85	1	51,9	1	44.115	51,9
TRAMO L	VIRGILIO PERDOMO LOTE: 9	6.00	0.90	1	6	1	5.4	6
TRAMO M	VIRGILIO PERDOMO LOTE: 9	114.00	0.90	1	114	1	102.6	114
TRAMO N	JASMIN LOTE: 1	162.20	0.60	1	162,2	1	97.32	162,2
TRAMO O	JASMIN LOTE: 1	23.00	0.45	1	23	1	10.35	23
TRAMO P	JASMIN LOTE: 1	45.20	1.00	1	45,2	1	45.2	45.2
TRAMO Q	JASMIN LOTE: 1	51.10	1.00	1	51,1	1	51.1	51.1
TRAMO R	JASMIN LOTE: 1				17,4	1		17,4
TRAMO S	JASMIN LOTE: 1	34.10	1.00	1	34,1	1	34.1	34.1
TRAMO T	JASMIN LOTE: 1	46.10	1.10	1	46,1	1	50.71	46.1
TRAMO U	JASMIN LOTE: 1				8,1	1		8,1
TRAMO V	CALLE 4 DE AGOSTO	148.70	1.00	1	148,7	1	148.7	148.7
TRAMO W	CALLE 4 DE AGOSTO	140.90	1.00	1	140,9	1	140.9	140.9




**LIGA MUNICIPAL
- DOMINICANA -**

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO X	SECTOR LA UREÑA DIA TERCERA	368.30	0.90	1	368.3	1	331.47	368.3
TRAMO Y1	SECTOR LA UREÑA DIA TERCERA	348.90	0.98	1	348.9	1	341.922	348.9
TRAMO Z1	RESPALDO 4 DE AGOSTO	131.40	1.00	1	131.4	1	131.4	131.4
TRAMO AA	RESPALDO 4 DE AGOSTO	65.00	1.00	1	65	1	65	65
TRAMO AB	RESPALDO 4 DE AGOSTO	54.20	1.00	1	70,5	1	54.2	
TRAMO AC	30 DE MAYO	153.60		1			0	
TRAMO AD	31 DE MAYO	140.40	0.90	1	140.4	1	126.36	140.4
TRAMO AE	CALLE CHECO	127.70		1	127.7	1	0	127.7
TRAMO AF	CALLE CHECO	100.00		1	100	1	0	100
TRAMO AG	CALLE DOÑA NENA	29.80	1.10	1	72,2	1	32.78	
TRAMO AH	CALLE CHECO	89.50	1.42	1	134.9	1	127.09	134.9
TRAMO AI	ANTONIO ENCARNACION	259.20	1.00	1	259.2	1	259.2	259.2
TRAMO AJ	RESPALDO ANTONIO ENCARNACION	29.00	1.00	1	29	1	29	29
TRAMO AK	CALLE/C	296.00	1.98	1	296	1	586.08	296
TRAMO AL	CALLE JASMIN	178.40	1.00	1	178.4	1	178.4	178.4
TRAMO AM	CALLE JASMIN	274.00	1.00	1	274	1	274	274
TRAMO AN	CALLE JASMIN	131.60	1.00	1	131.6	1	131.6	131.6
TRAMO AO	CALLE GARDENIA	60.00	0.90	1	98.4	1	54	98.4
Total							4097.97	4299.80

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 99,342,686.53
Monto desembolsado RD\$ 99,342,686.53 (100%)
Avance de obra 16.45%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: OZAMA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 22 de noviembre de 2022

PROVINCIA: SANTO DOMINGO

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO ESTE

DISTRITO MUNICIPAL: -


INFORME DE AVANCE DE OBRA


A la fecha de 22/11/2022 se ha ejecutado 4,097.97 metros cuadrados de aceras y 4,299.80 metros lineales de contén, lo que corresponde al 16.45% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS

1. Estas obras tienen muy buena terminación.
2. Estas obras son ejecutadas por contrato.

IMÁGENES

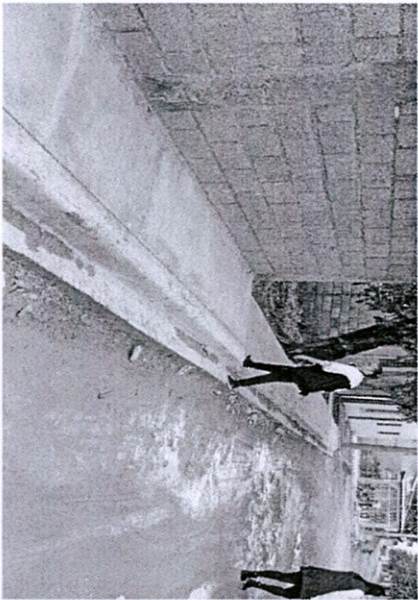



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —




Suministra los datos de este reporte,


ING. EDWARD ACOSTA

Técnico


ARQ. KEILIN MORA

Técnico


ING. STÁVILIN MENDOZA

Técnico


ING. RICHARD CABRERA

Técnico

