



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


CODIGO: 320402
REGIÓN: OZAMA
PROVINCIA: SANTO DOMINGO
MUNICIPIO: BOCA CHICA
DISTRITO MUNICIPAL: LA CALETA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 16 de enero de 2023
TÉCNICOS: 1. Ing. Staylin Mendoza
2. Felipe Reyes

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE LAS FLOREZ				651.10	2		1302.2
TRAMO B	CALLE LAS FLOREZ				698.90	2		1397.8
TRAMO C	CALLE E				259.80	2		519.6
TRAMO D	CALLE F				260.40	2		520.8
TRAMO E	CALLE RESP. F				23.8	2		47.6
TRAMO F	CALLE G				490.75	2		981.5
TRAMO G	CALLE RESP. DUARTE				76	1		76
TRAMO H	CALLE RESP. DUARTE				118.6	2		237.2
TRAMO I	CALLE RESP. DUARTE				576.75	2		1153.5
TRAMO J	CALLE JUAN PABLO PINA				186.5	2		373
TRAMO K	CALLE RESP. JUAN PABLO PINA				61.5	2		123
TRAMO L	CALLE BENITO MONCION				182.4	2		364.8
TRAMO M	CALLE SANTIAGO				101.45	2		202.9
TRAMO N	CALLE RESP. MARIA TRINIDAD SANCHEZ				107.3	2		214.6
TRAMO O	CALLE RESP. BENITO MONCION				59.4	2		118.8
Total							0.00	7633.30

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 9,454,055.85
Monto desembolsado RD\$ 4,727,027.93 (50%)
Avance de obra 208.68%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: OZAMA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 16 de enero de 2023

PROVINCIA: SANTO DOMINGO

MUNICIPIO: BOCA CHICA

DISTRITO MUNICIPAL: LA CALETA


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 7,633.30 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. Esta obra se ejecuta por contrato.
2. Los contenidos ejecutados visualmente tiene buena calidad y terminación.
3. Solo se ejecutaron contenes con el fin de tener una mayor longitud para la preparación de calles.

IMÁGENES

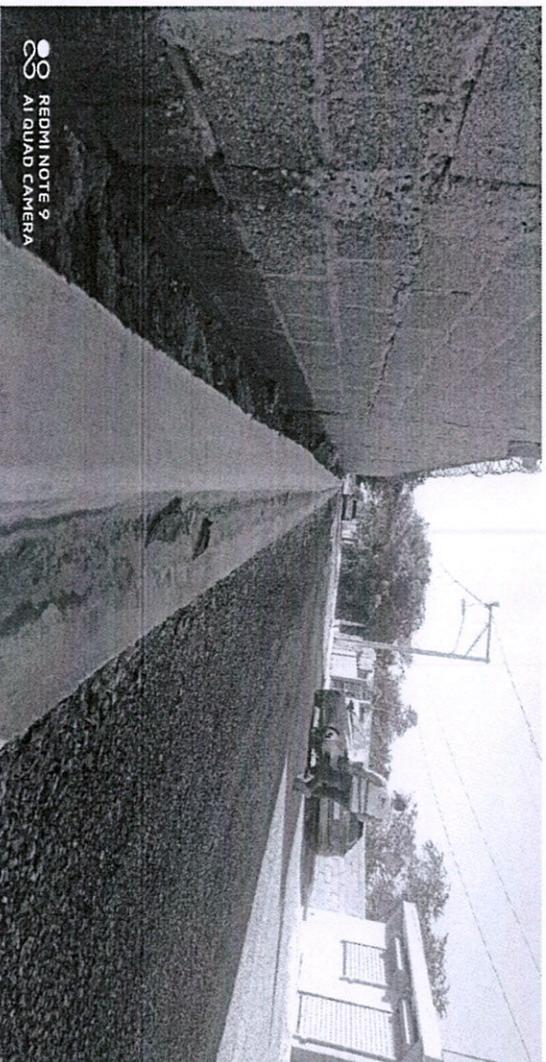



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

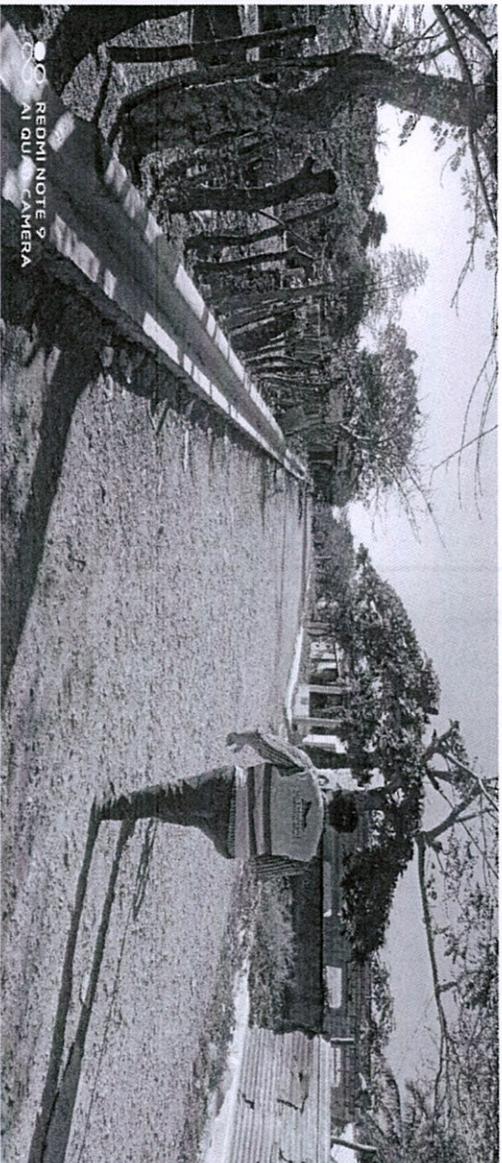

Suministra los datos de este reporte,



ING. STAYLIN MENDOZA
Técnico



FELIPE REYES
Técnico

