



**LIGA MUNICIPAL  
- DOMINICANA -**

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

**INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN**

**CODIGO:** 320602

**REGIÓN:** OZAMA

**PROVINCIA:** SANTO DOMINGO

**MUNICIPIO:** LOS ALCARRIZOS

**DISTRITO MUNICIPAL:** PALMAREJO - VILLA LINDA

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 16 de enero de 2023

1. Ing. Ana Indhira Ramírez

2. Arq. Keilin Mora


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	SANTA ROSA (FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ)	177.65	1.00	2	177.65	2	355.3	355.3
TRAMO B	CALLE A				141.60	2	283.2	283.2
TRAMO C	CALLE B				62.55	2	125.1	125.1
TRAMO D	CALLE C				84.70	2	169.4	169.4
TRAMO E	CALLE D				220.3	2	440.6	440.6
TRAMO F	CALLE E	59.40	1.00	2	83.25	2	118.8	166.5
TRAMO G	CALLE F	117.00	1.00	2	117	2	234	234
TRAMO H	CALLE G	40.70	1.00	2	40.7	2	81.4	81.4
TRAMO I								
TRAMO J								
<b>Total</b>							<b>789.50</b>	<b>1855.50</b>

**AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA**

Monto asignado RD\$ 4,352,577.94

Monto desembolsado RD\$ 4,352,577.95 (100%)

Avance de obra 133.32%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

**SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

**REGIÓN: OZAMA**

**FECHA DE VISITA TÉCNICA: 16 de enero de 2023**

**PROVINCIA: SANTO DOMINGO**

**MUNICIPIO: LOS ALCARRIZOS**

**DISTRITO MUNICIPAL: PALMAREJO - VILLA LINDA**


## **INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN**


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 789.50 metros cuadrados de aceras y 1,855.50 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

## **NOTAS**

1. Este distrito municipal construyo por contrato
2. Este cumple con las normas establecida por la LMD.
3. Al momento de hacer este levantamiento estuvieron presente las autoridades del ayuntamiento y el ing. Contratista.
4. Los municipes estan mas que complacido con esta iniciativa y estan impactando mas de 1,000 familias.

## **IMÁGENES**

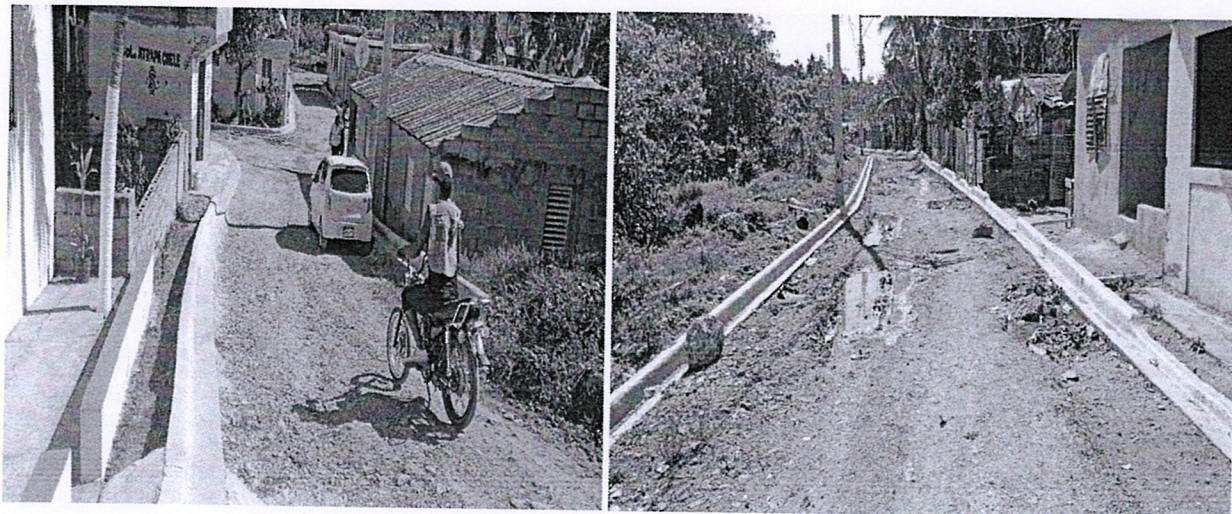





# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,

  
ING. ANA INDHIRA RAMÍREZ  
Técnico

  
ARQ. KEILIN MORA  
Técnico

