



JUNTA MUNICIPAL LA CUABA
Distrito Municipal La Caba
Gestión 2020-2024
RNC: 430044751

Distrito Municipal la Caba
24 de mayo 2022

Al: Ing. Valentín Santos García
Subsecretario de la Subsecretaría de apoyo municipal de Obra Publicas
Planeamiento Territorial.
Su Despacho

Asunto: Informe estado del programa de construcción de aceras y contenes.

Luego de un cordial saludo, la misma es informar sobre la ejecución del programa de construcción de aceras y contenes de nuestra demarcación territorial.

Primeramente, fue por comparación de precio, al no tener el portal transaccional, aunque fue solicitado y estamos en el proceso, toda la ejecución desde su inicio, e imagen de la construcción fue publicada en las diferentes redes de la institución como también en el portal web <http://distritomunicipallacuaba.gob.do>.

Desde la Liga Municipal vineros hacer el levantamiento, el ingeniero Pedro Reyes quien está a cargo de la obra, hizo la cubicación, todos esos detalles tanto del ingenio como también ya lo mencionado del proceso de la ejecución fue enviado al correo de la Liga.

Para concluir y como es de su conocimiento que la junta municipal de la cuaba recibió el 50% para la construcción de aceras y contenes, ya está ejecutado más del 60%, lo cual estamos en la espera de que la Liga Municipal Dominicana deposite el 50% restante para dar seguimiento y terminación de la construcción.


Esperando que la información solicitada, sea satisfactoria del referido programa.

Si otro particular por el momento le saluda,

Sr. Carlos J. Montaña Ureña
Director Municipal



C/primera No.22, segundo nivel, la cuaba.
Provincia Santo Domingo
juntamunicipallacuaba@gmail.com
tel. 849-270-6028/829-640-4707



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CODIGO: 320703

REGIÓN: OZAMA

PROVINCIA: SANTO DOMINGO

MUNICIPIO: PEDRO BRAND

DISTRITO MUNICIPAL: LA CUABA

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 25 de abril de 2022

1. Ing. Ana Indhira Rámirez

TÉCNICOS: 2. Ing. Asamín Ferreras


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO C	Carretera principal el aguacate - La Cuaba	221.00	1.00	2	221.00	2	442	442
Total							442	442

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,672,026.61

Monto desembolsado RD\$ 1,836,013.31 (50%)

Avance de obra 46.47%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: OZAMA

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 25 de abril de 2022

PROVINCIA: SANTO DOMINGO

MUNICIPIO: PEDRO BRAND

DISTRITO MUNICIPAL: LA CUABA


REPORTE


A la fecha de 25/04/2022 se ha ejecutado 442.00 metros cuadrados de aceras y 442.00 metros lineales de contén, lo que corresponde al 46.47% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS

1. Al momento de la visita, solo les faltaba un barrio por ejecutar.
2. En algunos tramo tienen demolición, retiro de empaliza y corte de capa vegetal para poder obtener el nivel correcto para poder ejecutar las aceras.
3. Tanto las aceras como los contenes no están lineales, esto por existir comercios que ya tenían sus aceras, rampas y demás construidas.

IMÁGENES

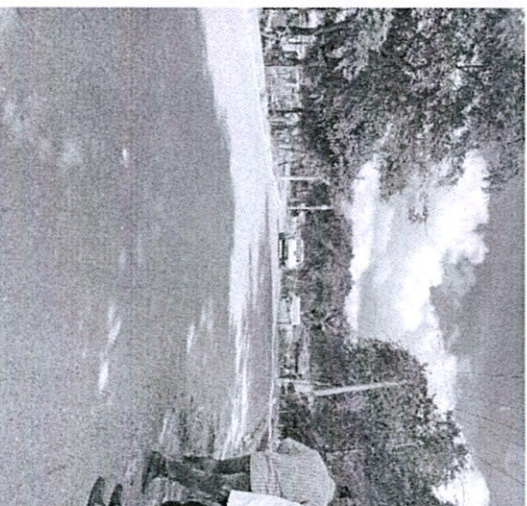




LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RAMÍREZ
Técnico


ING. ASAMIN FERRERAS
Técnico

