

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 050202
REGIÓN: CIBAO NOROESTE
PROVINCIA: DALABÓN
MUNICIPIO: LOMA DE CABRERA
DISTRITO MUNICIPAL: CAPOTILLO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 4 de mayo de 2023

TÉCNICOS: 1. Ing. Ana Indhira Rámirez
2. Arq. Kellin Mora

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	ENTRADA AL DISTRITO MUNICIPAL				55.90	1		55.9
TRAMO B	ENTRADA AL DISTRITO MUNICIPAL				43.30	1		43.3
TRAMO C	ENTRADA AL DISTRITO MUNICIPAL				23.50	1		23.5
TRAMO D	ENTRADA AL DISTRITO MUNICIPAL				75.10	1		75.1
TRAMO E	ENTRADA AL DISTRITO MUNICIPAL				33.5	1		33.5
TRAMO F	ENTRADA AL DISTRITO MUNICIPAL				134.8	1		134.8
TRAMO G	ENTRADA AL DISTRITO MUNICIPAL	631.66	1.00	2	444.2	2	1263.32	888.4
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							1263.32	1254.50

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,335,626.30
Monto desembolsado RD\$ 2,335,626.30 (100%)
Avance de obra 166.79%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NOROESTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 4 de mayo de 2023

PROVINCIA: DAJABÓN

MUNICIPIO: LOMA DE CABRERA

DISTRITO MUNICIPAL: CAPOTILLO

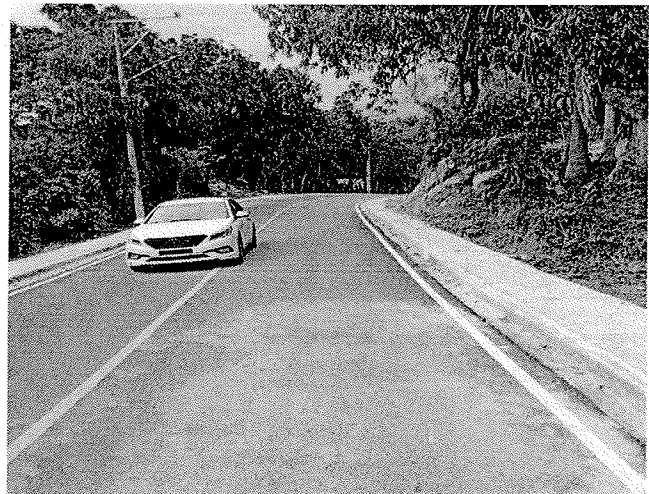
INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,263.32 metros cuadrados de aceras y 1,254.50 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Este distrito esta construyendo por contrato.
2. Ellos cuentan con la misma cantidad de contenes y aceras.
3. Los contenes y aceras construídos hasta la fecha cumplen con los criterios constructivos según las nor

IMÁGENES







LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ
Técnico


ARQ. KEILIN MORA
Técnico

