



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 290101

REGIÓN: HIGUAMO

PROVINCIA: MONTE PLATA

MUNICIPIO: MONTE PLATA


DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 4 de octubre de 2022

1. Ing. Asamín Ferreras

TÉCNICOS: 2. Ing. Félix Tavárez

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE 1				187	2		374
TRAMO B	CONT. CALLE 1				59.7	2		119.4
TRAMO C	CALLE 2				42.4	2		84.8
TRAMO D	CONT. CALLE 2				40	2		80
TRAMO E	CALLE 3				150.1	2		300.2
TRAMO F	CONT. CALLE 3				150.1	2		300.2
TRAMO G	CALLE 4				189.5	2		379
TRAMO H	CONT. CALLE 4				122	2		244
TRAMO I	CALLE 5				69.5	2		139
TRAMO J	CALLE PRINCIPAL				72	2		144
Total							0.00	2164.60




AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 5,447,208.17

Monto desembolsado RD\$ 2,723,604.09 (50%)

Avance de obra 100.61%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: HIGUAMO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 4 de octubre de 2022

PROVINCIA: MONTE PLATA

MUNICIPIO: MONTE PLATA

DISTRITO MUNICIPAL: -

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 2,164.60 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS







1. Solo se construyeron contenes, con el fin de aprovechar el programa de asfaltado.
2. La modalidad de ejecución es vía gobierno local.

IMÁGENES






LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

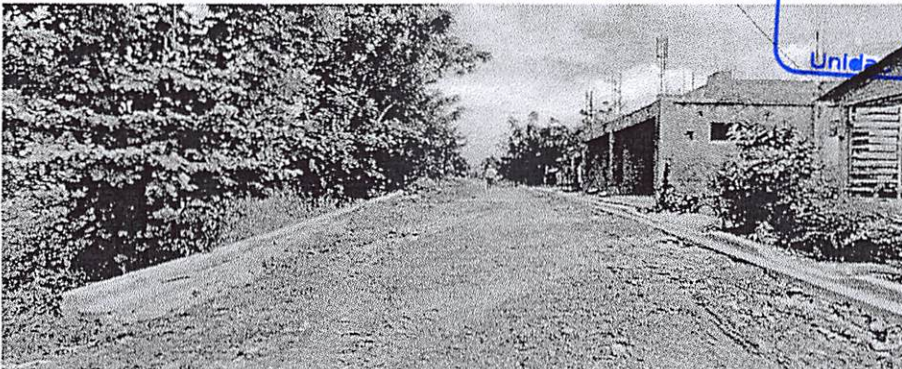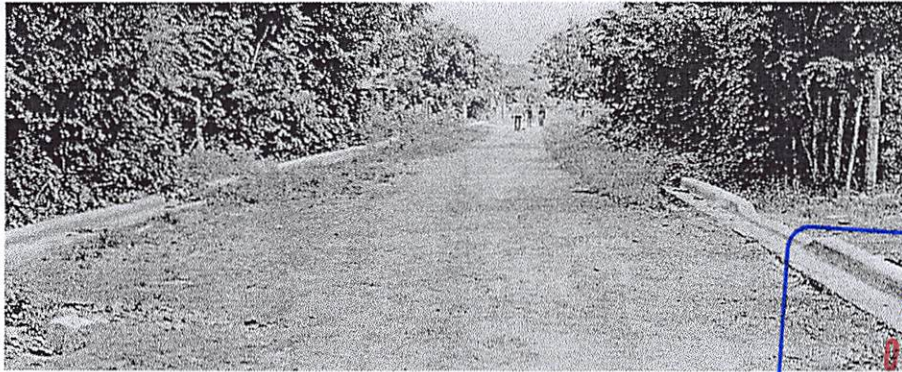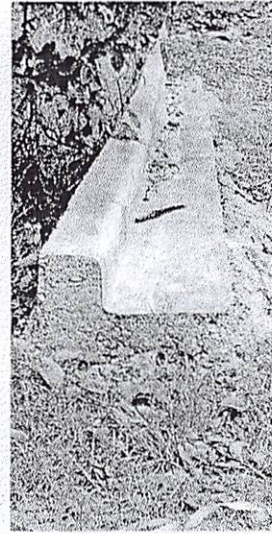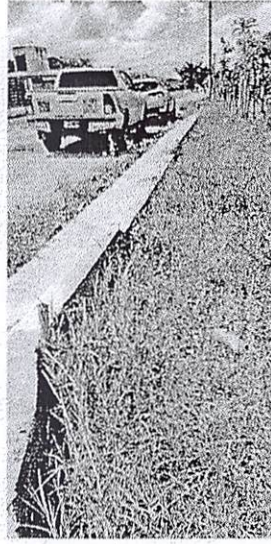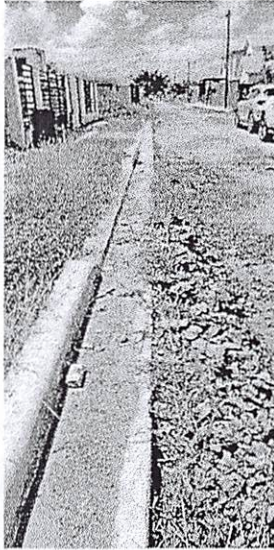




LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

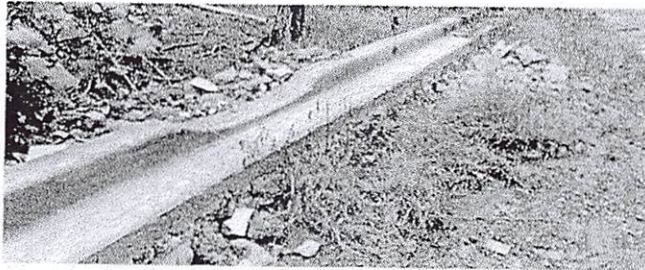

Suministra los datos de este reporte,


ING. ASAMÍN FERRERAS

Técnico


ING. FÉLIX TAVÁREZ

Técnico

