

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CODIGO: 020201

REGIÓN: VALDESIA

PROVINCIA: AZUA

MUNICIPIO: LAS CHARCAS

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 6 de septiembre de 2022


1. Ing. Ana Indhira Rámirez

TÉCNICOS: 2. Ing. Asamín Ferreras

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/ Antonio Duverge	50.15	1.00	2	135.90	2	100.3	271.8
TRAMO B	C/ Antonio Duverge				118.25	2		236.5
TRAMO C								
TRAMO D								
TRAMO E								
TRAMO F								
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							100.3	508.3

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado	RD\$ 3,494,920.58	
Monto desembolsado	RD\$ 727,836.76	(21%)
Avance de obra	41.12%	



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIÁ

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 6 de septiembre de 2022

PROVINCIA: AZUA

MUNICIPIO: LAS CHARCAS

DISTRITO MUNICIPAL: -

REPORTE


A la fecha de 06/09/2022 se ha ejecutado 100.30 metros cuadrados de aceras y 508.30 metros lineales de contén, lo que corresponde al 41.12% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS


1. Este municipio esta construyendo por contrato.
2. Lo reportado aquí es lo construido hasta el momento.
3. Estan siendo ejecutado con hormigon industrial.
4. Dicha ejecucion cumplen con los parametros recomendados por el programa.

IMÁGENES






LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

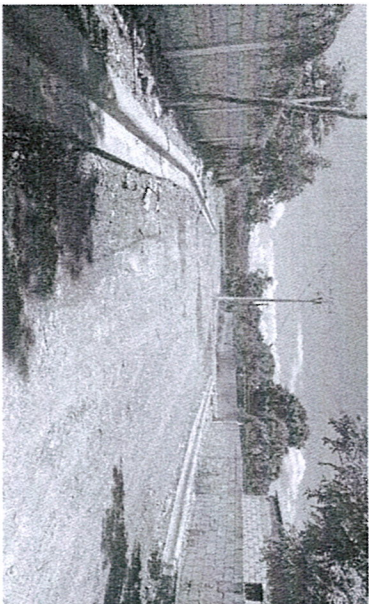

Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RAMIREZ

Técnico


ING. ASAMIN FERRERAS

Técnico

