

# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 020201

REGIÓN: VALDESIA

PROVINCIA: AZUA

MUNICIPIO: LAS CHARCAS

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 27/3/2023

1. Ing. Richard Cabrera

TÉCNICOS: 2. Arq. Kellin Mora

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m <sup>2</sup> )	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	SECTOR LAS FLORES CALLE SANCHEZ	18.20	0.56	1	20.30	1	10.192	20.3
TRAMO B	SECTOR LAS FLORES CALLE SANCHEZ	38.50	0.61	1	39.40	1	23.485	39.4
TRAMO C	CALLE PROYECTO 1	106.80	1.22	2	116.80	2	260.592	233.6
TRAMO D	CALLE PERPENDICULAR A LA PROYECTO 1	26.50	0.80	2	28.50	2	42.4	57
TRAMO E	CALLE DUVERGE A	36.40	1.00	2	38.7	2	72.8	77.4
TRAMO F	CALLE DUVERGE B	260.00	1.12	1	265.8	1	291.2	265.8
TRAMO G	CALLE DUVERGE C	40.20	1.08	1	56.3	1	43.416	56.3
TRAMO H	CALLE DUVERGE D	150.20	1.08	1	154.9	1	162.216	154.9
TRAMO I								
TRAMO J								
<b>Total</b>							<b>906.30</b>	<b>904.70</b>


### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,494,920.58

Monto desembolsado RD\$ 1,747,460.29 (50%)

Avance de obra 100.03%

# LIGA MUNICIPAL —DOMINICANA—



SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANTEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 27/3/2023

REGIÓN: VALDESIA

PROVINCIA: AZUA

MUNICIPIO: LAS CHARCAS

DISTRITO MUNICIPAL: -


## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 906.30 metros cuadrados de aceras y 904.70 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

## NOTAS


1. Esta ejecución cumple con las especificaciones sugeridas del programa de aceras y contenes.
2. Fue realizada por administración.

## IMÁGENES

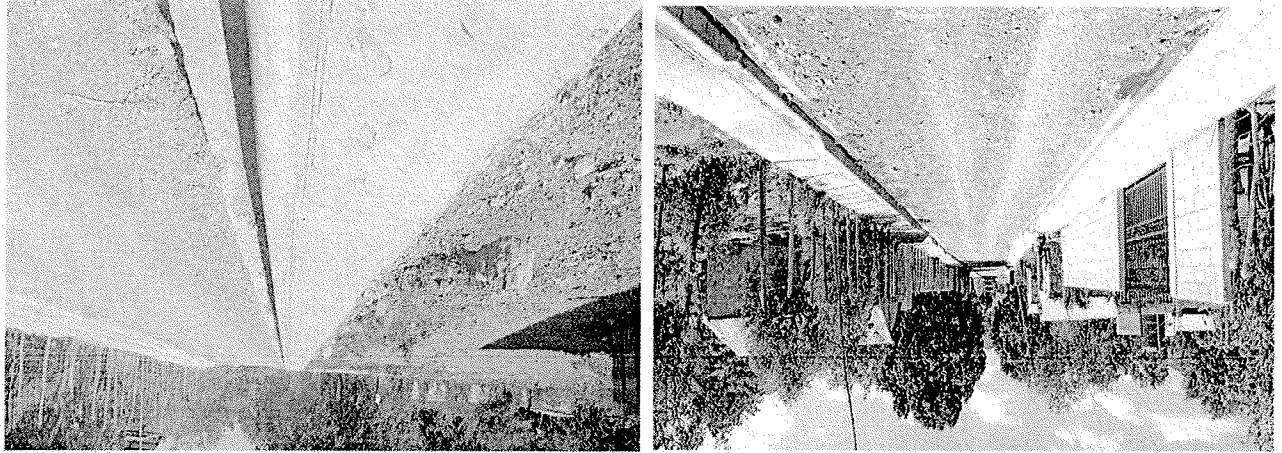



*Suministra los datos de este reporte,*

Técnico  
ING. RICHARD CABRERA



Técnico

ARQ. KEILIN MORA

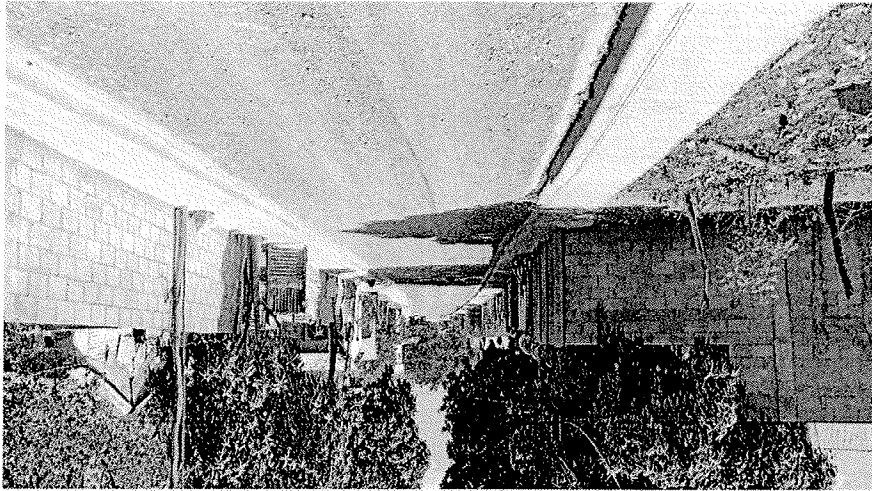

LIGA MUNICIPAL  
—DOMINICANA—

