



LIGA MUNICIPAL  
—DOMINICANA—

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 6 de septiembre de 2022

1. Ing. Staylin Mendoza

TÉCNICOS: 2. Arq. Keilin Mora

CODIGO: 020301  
 REGIÓN: VALDESIA  
 PROVINCIA: AZUA  
 MUNICIPIO: LAS YAYAS DE VIAJAMA  
 DISTRITO MUNICIPAL: -

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	VIETNAM FRANCO. CAAMAÑO				55.30	2		110.6
TRAMO B	VIETNAM FRANCO. CAAMAÑO				41.55	2		83.1
TRAMO C	VIETNAM FRANCO. CAAMAÑO				33.60	2		67.2
TRAMO D								
TRAMO E								
TRAMO F								
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total								260.9

<b>AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA</b>	
Monto asignado RD\$	3,296,123.67
Monto desembolsado RD\$	1,648,061.84 (50%)
Avance de obra 20.37%	



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIA

PROVINCIA: AZUA

MUNICIPIO: LAS YAYAS DE VIAJAN

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 6 de septiembre de 2022



## REPORTE

A la fecha de 06/09/2022 se ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 260.90 metros lineales de contén, lo que corresponde al 20.37% del fondo asignado para este territorio.

## NOTAS

1. Estos contenes estan hechos con buena terminacion.
2. No estan ejecutados a su totalidad, pero estan siendo realizados con buena calidad.

## IMÁGENES

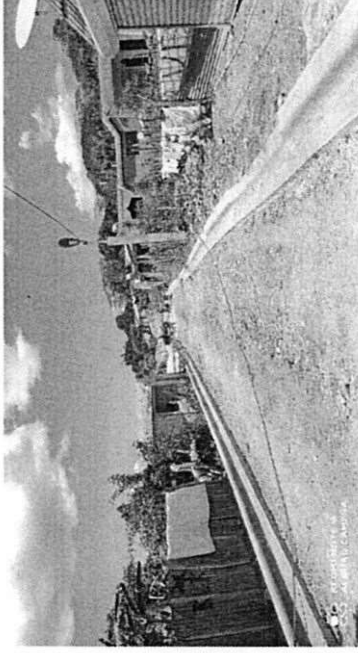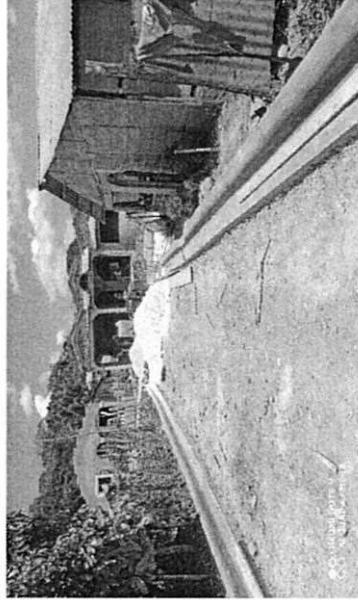



LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte.

  
ING. STAYLIN MENDOZA

Técnico

  
ARC. KELVIN MORA

Técnico

