



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

**CODIGO:** 020303

**REGIÓN:** VALDESIA

**PROVINCIA:** AZUA

**MUNICIPIO:** LAS YAYAS DE VIAJAMA

**DISTRITO MUNICIPAL:** HATO NUEVO CORTÉS

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 7 de julio de 2022

1. Ing. Camila Moya

**TÉCNICOS:** 2. César De Los Santos

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CERRO DEL CRUCE	450.95	1.05	2	450.95	2	946.995	901.9
TRAMO B	CALLE JUAN MARTES							
TRAMO C	INTERSECCIÓN SANCHEZ							
TRAMO D	JOSE ELFILA	311.70	1.00	2	311.70	2	623.4	623.4
TRAMO E	OLVIS REYES							
TRAMO F								
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							1570.40	1525.30

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,051,450.55  
Monto desembolsado RD\$ 3,051,450.55 (100%)  
Avance de obra 194.94%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

**SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

**REGIÓN:** VALDESIÁ

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 7 de Julio de 2022

**PROVINCIA:** AZUA

**MUNICIPIO:** LAS YAYAS DE VIAJAMA

**DISTRITO MUNICIPAL:** HATO NUEVO CORTÉS


## **INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN**

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,570.40 metros cuadrados de aceras y 1,525.30 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

### **NOTAS**



1. En el tramo A se intervinieron 157.3 metros lineales de un solo lado de la calle, y 372.30 metro lineales de ambos lados de la calle.
2. En el tramo D intervinieron 161.80 metros lineales de un solo lado de la calle, y 230.80 metro lineales de ambos lados de la calle.
3. La calidad de la construcción cumple con las normas sugeridas para esos fines.

### **IMÁGENES**

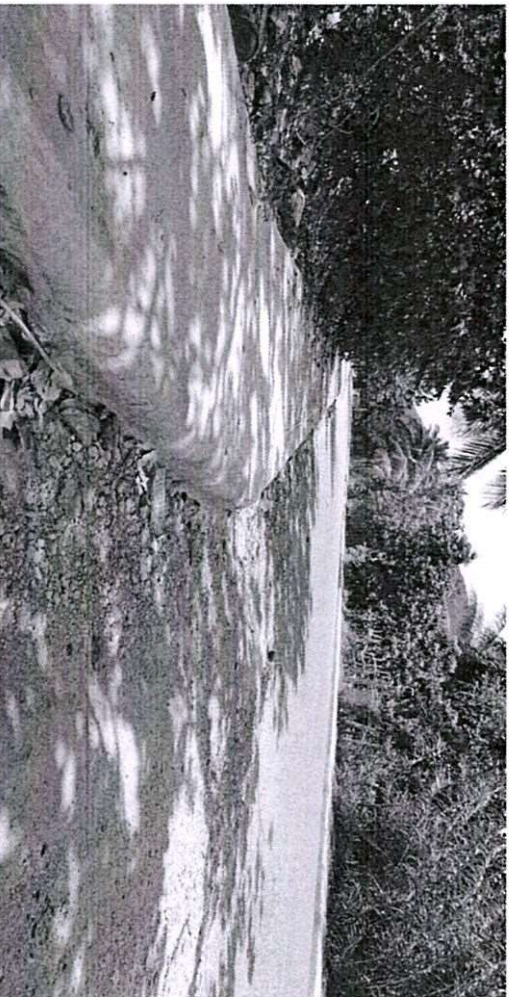



**LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —**

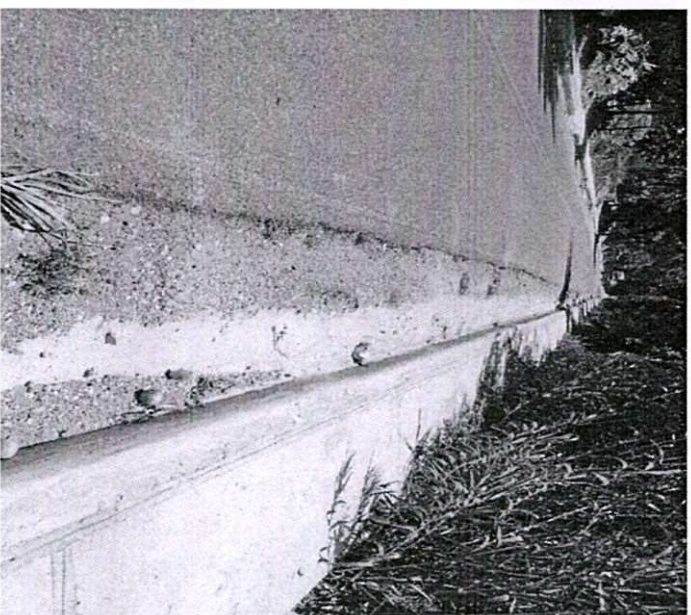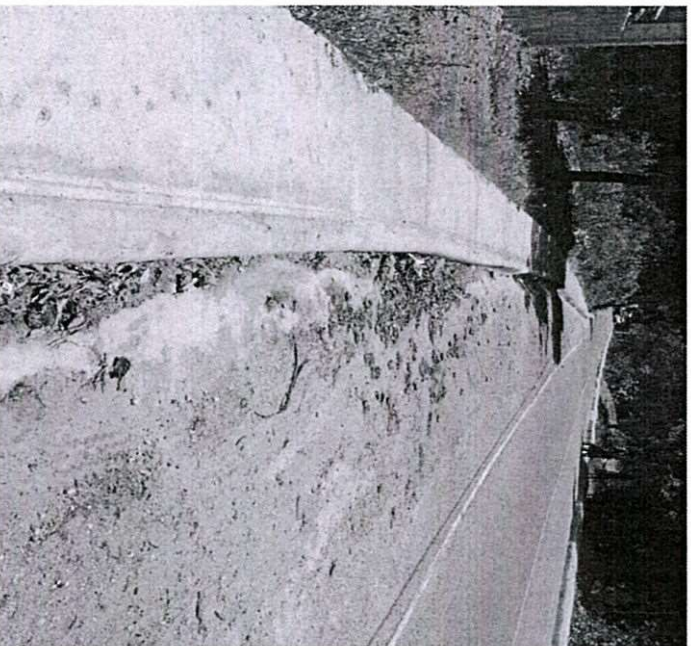

*Suministra los datos de este reporte,*

  
ING. CAMILLA MOYA

Técnico

  
CÉSAR DE LOS SANTOS

Técnico

