

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 020801
REGIÓN: VALDESIA
PROVINCIA: AZUA
MUNICIPIO: TÁBARA ARRIBA
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 14 de julio de 2023

TÉCNICOS: 1. Ing. Richard Cabrera
 2. Felipe Reyes

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE A	75,8	1,03	1.00	75,80	1.00	78,07	75,80
TRAMO B	CALLE B	51,1	0,6	1.00	76,3	1.00	30,66	76,30
TRAMO C	CALLE C				20,30	1.00		20,30
TRAMO D	CALLE D				24,10	1.00		24,10
TRAMO E	CALLE E	45,5	1,00	2.00	45,5	1.00	91,00	45,50
TRAMO F	CALLE F	100,7	1,00	2.00	100,5	1.00	201,40	100,50
TRAMO G	CALLE PRIMERA	56,40	1,00	1.00	56,4	1.00	56,40	56,40
TRAMO H	CALLE PRIMERA	41,20	1,00	1.00	41,2	1.00	41,20	41,20
TRAMO I	C/SAN VICENTE DE PAUL	185,5	1,00	1.00	195,5	1.00	185,50	195,50
TRAMO J	C/LA PALMITA	201,4	1,00	1.00	201,4	1.00	201,40	201,40
Total							885,63	837,00

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,939,091.79
 Monto desembolsado RD\$ 2,939,091.80 (100%)
 Avance de obra 112.11%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 14 de julio de 2023

PROVINCIA: AZUA

MUNICIPIO: TÁBARA ARRIBA

DISTRITO MUNICIPAL: -



INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 885,63400 metros cuadrados de aceras y 837,00 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. Se observó buena terminación en contenes y aceras.
2. Cumplen con las especificaciones técnicas del programa.

IMÁGENES

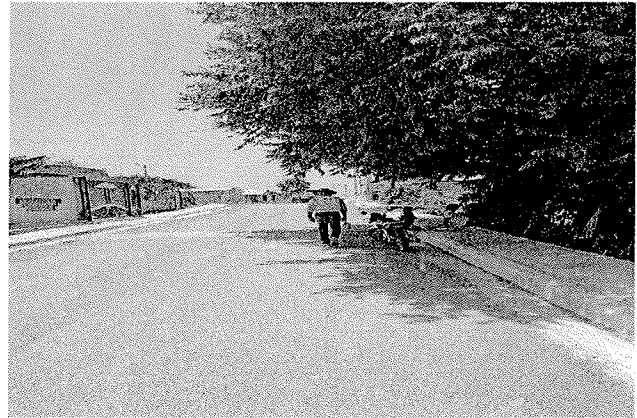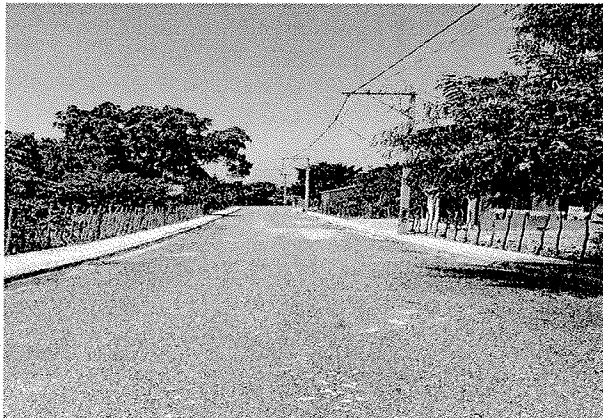



**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —**

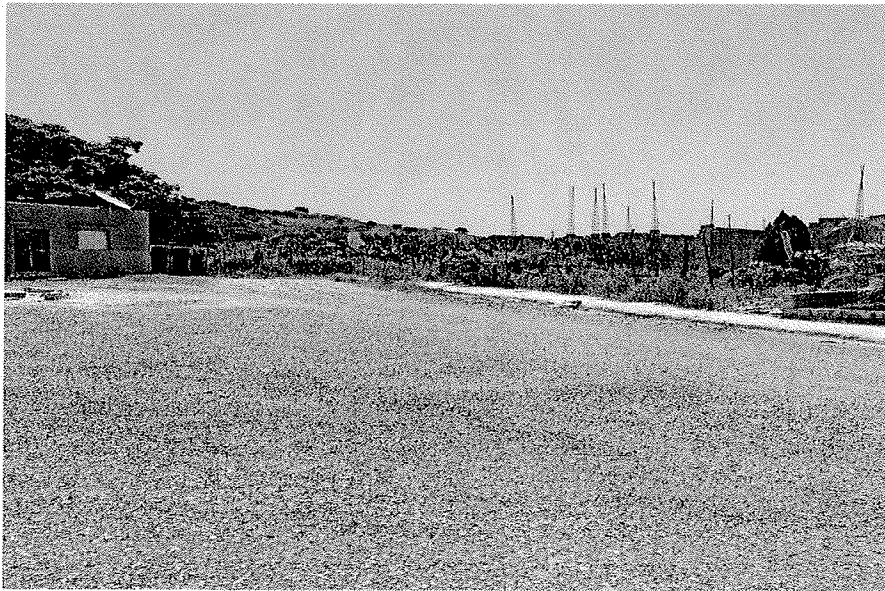

Suministra los datos de este reporte,

ING. RICHARD CABRERA

Técnico

FELIPE REYES

Técnico
