



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 020803

REGIÓN: VALDESIA

PROVINCIA: AZUA

MUNICIPIO: TÁBARA ARRIBA

DISTRITO MUNICIPAL: AMIAMA GÓMEZ

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 8 de mayo de 2023

1. Ing. Ana Indhira Rámirez

TÉCNICOS: 2. Felipe Reyes


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	SECTOR JOSE CAMINERO PROLONGACION ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ	193.35	1.00	2.00	193.35	2.00	386.70	386.70
TRAMO B	CALLE DUARTE	119.15	1.00	2.00	119.15	2.00	238.30	238.30
TRAMO C	CALLE SANCHEZ	95.30	1.00	1.00	95.30	1.00	95.30	95.30
TRAMO D	SECTOR EL CHAVON ENTRANDO POR DONDE BOBOLA	158.10	0.90	1.00	158.10	1.00	142.29	158.10
TRAMO E	SECTOR EL CHAVON ENTRANDO POR DONDE BOBOLA	158.80	1.00	1.00	150.80	1.00	158.80	150.80
Total							1,021.39	1,029.20

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,906,447.02

Monto desembolsado RD\$ 2,906,447.02 (100%)

Avance de obra 136.41%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIÁ

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 8 de mayo de 2023

PROVINCIA: AZUA

MUNICIPIO: TÁBARA ARRIBA

DISTRITO MUNICIPAL: AMIAMÁ GÓMEZ



INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,021.39 metros cuadrados de aceras y 1,029.20 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS



1. Esta junta municipal construyó por contrato.
2. Según lo observado cumple con los parámetros exigido.
3. Este ayuntamiento construyó aceras y contenes.

IMÁGENES

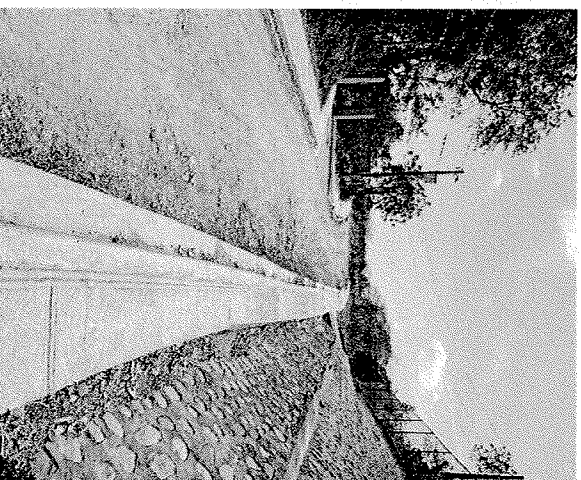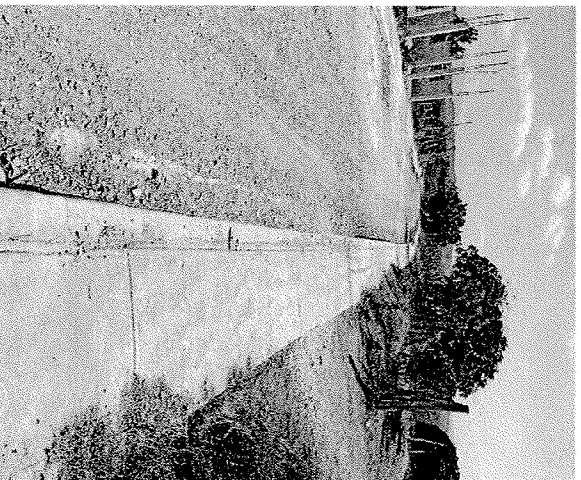




LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

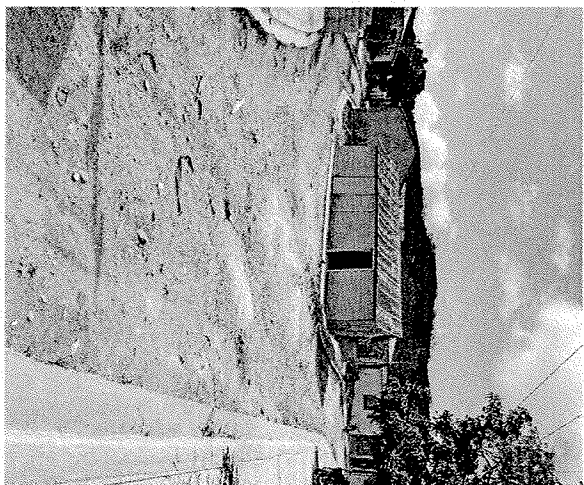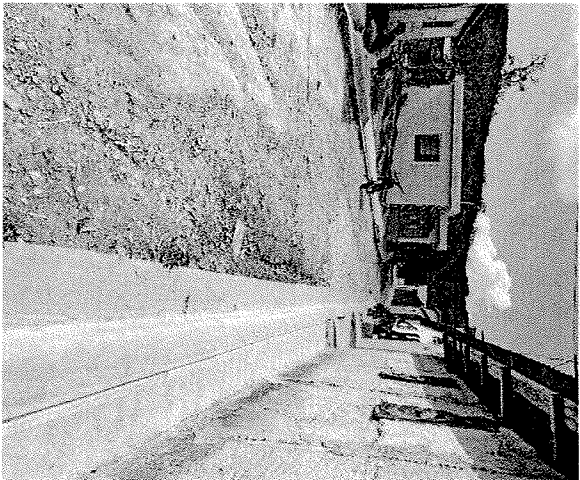

Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDIRA RÁMIREZ
Técnico


FELIPE REYES
Técnico
