



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCION

CODIGO: 021001

REGIÓN: VALDESIA

PROVINCIA: AZUA

MUNICIPIO: ESTEBANÍA

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 21 de junio de 2022

1. Ing. Ana Indhira Rámirez

TÉCNICOS: 2. Ing. Staylin Mendoza


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO B	Barrio Olga Peguero (calle 1ra)	20.00	1.00	1	761.40	1	20	761.4
TRAMO AG	HECTOR J DIAZ	236.80	1.00	1.00	236.80	1.00	236.8	236.8
TRAMO AH	N/A	43.40	1.00	1.00	43.40	1.00	43.4	43.4
TRAMO AI	N/A	62.20	1.00	1.00	62.20	1.00	62.2	62.2
TRAMO AJ	N/A	20.20	1.00	1.00	20.20	1.00	20.2	20.2
TRAMO AK	N/A	287.00	1.00	1.00	287.00	1.00	287	287
TRAMO AL	N/A	32.10	1.00	1.00	32.10	1.00	32.1	32.1
TRAMO AM	TRAMO CIRCULAR	456.70	1.00	1.00	456.70	1.00	456.7	456.7
<b>Total</b>							<b>1158.4</b>	<b>1899.8</b>

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,218,253.41

Monto desembolsado RD\$ 670,219.27 21%

Avance de obra 198.29%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
REGIÓN: VALDESIJA  
PROVINCIA: AZUA  
MUNICIPIO: ESTEBANÍA  
DISTRITO MUNICIPAL: -  
FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 21 de junio de 2022


## REPORTE

A la fecha de 21/06/2022 se ha ejecutado 1,158.40 metros cuadrados de aceras y 1,899.80 metros lineales de contén, lo que corresponde al 198.29% del fondo asignado para este territorio.

## NOTAS

1. Este municipio esta construyendo por Contrato.
2. Hasta ahora se han ejecutado los contenes en un 100% y el relleno compactado de las aceras.
3. Los contenes cumplen con las recomendaciones realizadas por parte de la LMD.
4. En este municipio se van ejecutar aceras y contenes.

## IMÁGENES

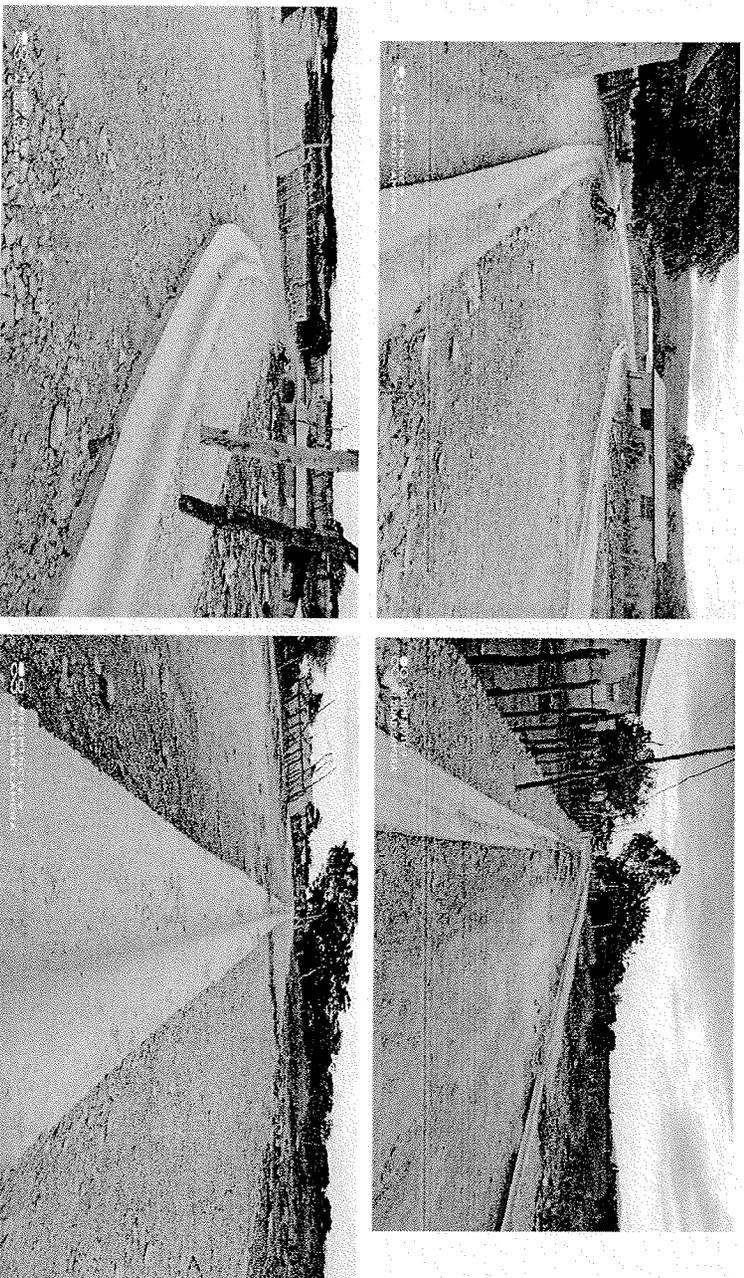

Suministra los datos de este reporte,

  
ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ  
Técnico

  
ING. STÁYLIN MENDOZA  
Técnico
