

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 030301
REGIÓN: ENRIQUILLO
PROVINCIA: BAHORUCO
MUNICIPIO: TAMAYO
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 13 de septiembre de 2022

SUPERVISOR: VICKY LEMOS GARCIA
CODIA: 42707

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (M)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CACIQUE DETRÁS DE LA JUNTA CALLE 1				75.40	1		75.4
TRAMO B	CACIQUE SIN SEMILLA				51.70	1		51.7
TRAMO C					350.10	1		350.1
TRAMO D					409.70	1		409.7
TRAMO E	RINCON DE AJI				253.8	1		253.8
TRAMO F	HATO NUEVO				116.7	1		116.7
TRAMO G	LA CUABA				242.5	1		242.5
TRAMO H	LA SOMBRA				616.8	1		616.8
TRAMO I	LOS GUABA				228.2	1		228.2
TRAMO J	JUAN BOSH				404.8	1		404.8
Total							0.00	2749.70

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,443,621.65
Monto desembolsado RD\$ 3,443,621.65 (100%)
Avance de obra 206.85%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: ENRIQUILLO
PROVINCIA: BAHORUCO
MUNICIPIO: TAMAYO
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 13 de septiembre de 2022


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 2,749.70 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. Este informe de cierre de ejecución se realiza a partir del reporte suministrado por el Ingeniero Supervisor del gobierno local designado por el CODIA, en cumplimiento de convenio CODIA-LMD.
De acuerdo a las observaciones expresadas en el reporte del CODIA antes mencionado; el supervisor
2. designado constató que los contenes cumplen con las especificaciones técnicas, y la calidad adecuada en los materiales.

IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

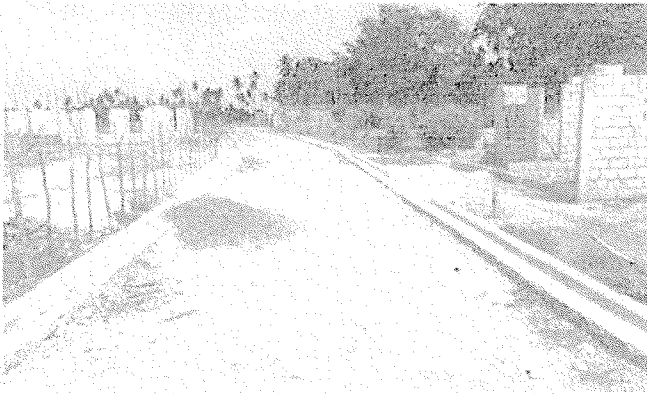

Suministra los datos de este reporte,

Arq. Yarissa Pérez
Técnico

