

LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CODIGO: 030306
REGIÓN: ENRIQUILLO
PROVINCIA: BAHORUCO
MUNICIPIO: TAMAYO
DISTRITO MUNICIPAL: MENA


FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 19 de agosto de 2022

TÉCNICOS: 1. Ing. Ana Indhira Ramírez
 2. Ing. Asamín Ferreras

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE 17 DE JULIO	83.50	1.00	2	83.50	2	167	167
TRAMO B	CALLE ANGEL RAMIREZ	114.20	1.00	2	114.20	2	228.4	228.4
TRAMO C	CALLE CARMEN DE LA CRUZ	26.35	1.00	2			52.7	
TRAMO D	CALLE CARMEN DE LA CRUZ	13.50	1.00	1			13.5	
TRAMO E	CALLE PRIMERA	71.80	1.00	2			143.6	
TRAMO F	CALLE MARGARITA FERANCO	93.95	1.00	2			187.9	
TRAMO G	CALLE MARGARITA FERANCO	24.30	1.00	2	49.8	1	48.6	49.8
TRAMO H	CALLE MARGARITA FERANCO	21.90	1.00	1	21.9	1	21.9	21.9
TRAMO I	CALLE MARGARITA FERANCO	32.90	1.00	2	30.2	2	65.8	60.4
TRAMO J	CALLE MARGARITA FERANCO	30.35	1.00	2			60.7	
Total							990.1	527.5

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,866,318.89
 Monto desembolsado RD\$ 1,433,159.45 (50%)
 Avance de obra 91.39%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: ENRIQUILLO

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 19 de agosto de 2022

PROVINCIA: BAHORUCO

MUNICIPIO: TAMAYO

DISTRITO MUNICIPAL: MENA

REPORTE


A la fecha de 19/08/2022 se ha ejecutado 990.10 metros cuadrados de aceras y 527.50 metros lineales de contén, lo que corresponde al 91.39% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS


1. En nuestra visita a este Distrito, observamos que las aceras y los contenes estan bien construidos y con buena terminación.
2. Los puntos de las coordenadas fueron tomada con el GPS del celular.

IMÁGENES






LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

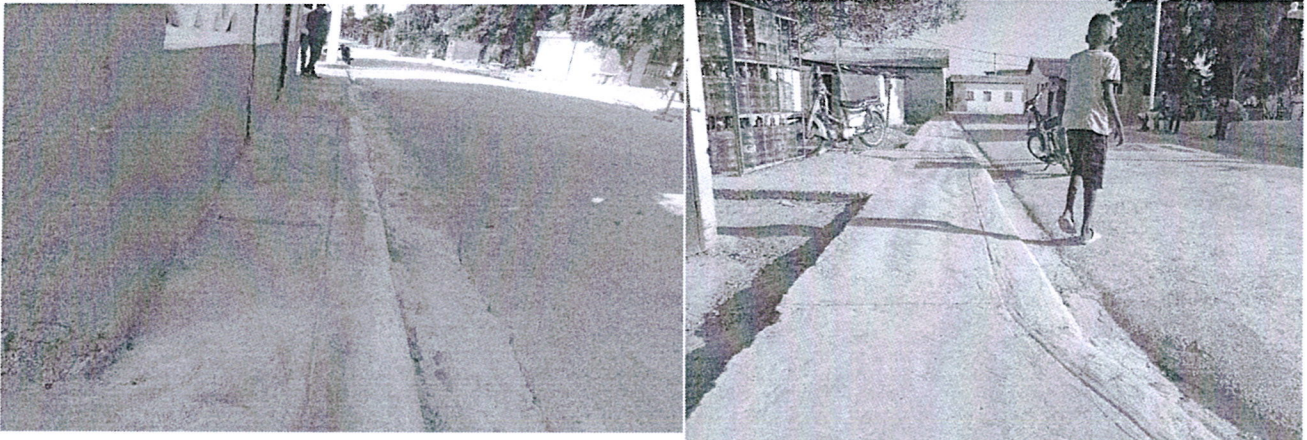


Suministra los datos de este reporte,



ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ

Técnico



ING. ASAMÍN FERRERAS

Técnico

