



**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —**

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 030307
REGION: ENRIQUILLO
PROVINCIA: BAHORUCO
MUNICIPIO: TAMAYO
DISTRITO MUNICIPAL: SANTA BARBARA EL 6

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 17 de mayo de 2023
TÉCNICOS: 1. Ing. Ana Indhira Ramírez
2. César De Los Santos

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	LOS ROBLES	57.80	1.00	2.00	92.25	2.00	115.60	184.50
TRAMO B	LOS ROBLES	51.45	1.00	2.00	51.45	2.00	102.90	102.90
TRAMO C	LOS ROBLES	218.90	1.15	1.00			251.74	
TRAMO D	LOS ROBLES	144.10	1.17	1.00			168.60	
TRAMO E	CONCHO PRIMA				62.00	2.00		124.00
TRAMO F	C/ DUARTE	58.40	1.53	1.00			89.35	
TRAMO G	C/ DUARTE	64.40	1.40	1.00			90.16	
TRAMO H	LOS BLOCK (CERCANO A LA ESCUELA)	37.70	1.00	2.00	37.80	2.00	75.40	75.60
TRAMO I	C/ MARCELINO POLINE	40.23	1.00	2.00	40.23	2.00	80.46	80.46
TRAMO J	JOSE NICOLAS	31.00	1.00	2.00	31.00	2.00	62.00	62.00
Total							1,036.20	629.46

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,908,073.84
Monto desembolsado RD\$ 2,908,073.84 (100%)
Avance de obra 101.17%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: ENRIQUILLO

PROVINCIA: BAHORUCO

MUNICIPIO: TAMAYO

DISTRITO MUNICIPAL: SANTA BÁRBARA EL 6

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 17 de mayo de 2023

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,036.20 metros cuadrados de aceras y 629.46 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. LAS ACERAS Y CONTENES EJECUTADAS POR ESTE GOB. LOCAL PRESENTAN BUENA TERMINACION.
2. ESTE GOB. LOCAL ESTA EJECUTANDO POR CONTRATO.

IMÁGENES






LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

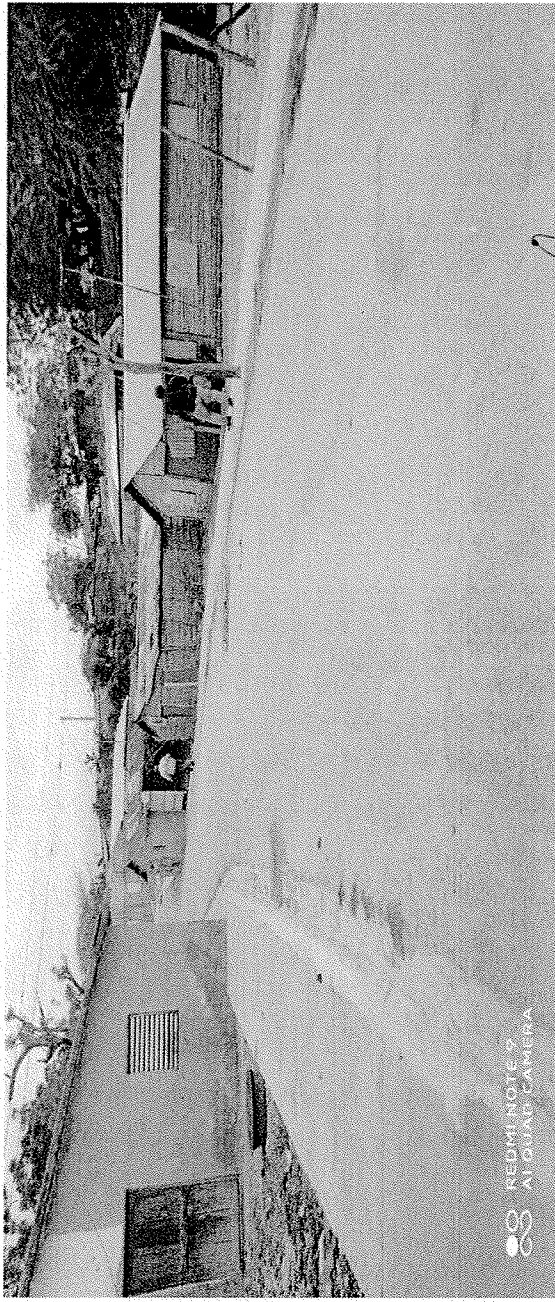

Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ
Técnico


CÉSAR DE LOS SANTOS
Técnico
