



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE AVANCE DE OBRA

**CODIGO:** 030307  
**REGIÓN:** ENRIQUILLO  
**PROVINCIA:** BAHORUCO  
**MUNICIPIO:** TAMAYO  
**DISTRITO MUNICIPAL:** SANTA BÁRBARA EL 6


**FECHA DE VISTA TÉCNICA:** 16 de marzo de 2023  
**TÉCNICOS:** 1. Ing. Staylin Mendoza  
 2. César De Los Santos

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m <sup>2</sup> )	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	LOD ROBLES	57.80	1.00	2	92.25	2	115.6	184.5
TRAMO B	LOD ROBLES	51.45	1.00	2	51.45	2	102.9	102.9
TRAMO C	LOD ROBLES	218.90	1.15	1			251.735	
TRAMO D	LOD ROBLES	144.10	1.17	1			168.597	
TRAMO E	CONCHO PRIMA				62	2		124
TRAMO F	CALLE DUARTE	58.40	1.53	1			89.54666667	
TRAMO G	CALLE DUARTE	64.40	1.40	1			90.16	
TRAMO H	LOS BLOCC SERCANO A LA ESCUELA	37.70	1.00	2	37.8	2	75.4	75.6
TRAMO I								
TRAMO J								
<b>Total</b>							<b>893.94</b>	<b>487.00</b>

**AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA**

Monto asignado RD\$ 2,908,073.84  
 Monto desembolsado RD\$ 2,908,073.84 (100%)  
 Avance de obra 82.29%

# LIGA MUNICIPAL DOMINICANA



SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANTEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: ENRIQUILLO

PROVINCIA: BAHORUOCO

MUNICIPIO: TAMAYO

DISTRITO MUNICIPAL: SANTA BARBARA EL 6


## INFORME DE AVANCE DE OBRA

A la fecha de 16/03/2023 se ha ejecutado 893.94 metros cuadrados de aceras y 487.00 metros lineales de contén, lo que corresponde al 82.29% del fondo asignado para este territorio.

## NOTAS

1. Al momento de la visita se ha ejecutado tantos las aceras como los contenes en tres sectores diferentes.
2. En la localidad de los Robles las aceras en la mayor parte de los tramos no presentan el violín que divide entre las aceras y el contén.

## IMÁGENES

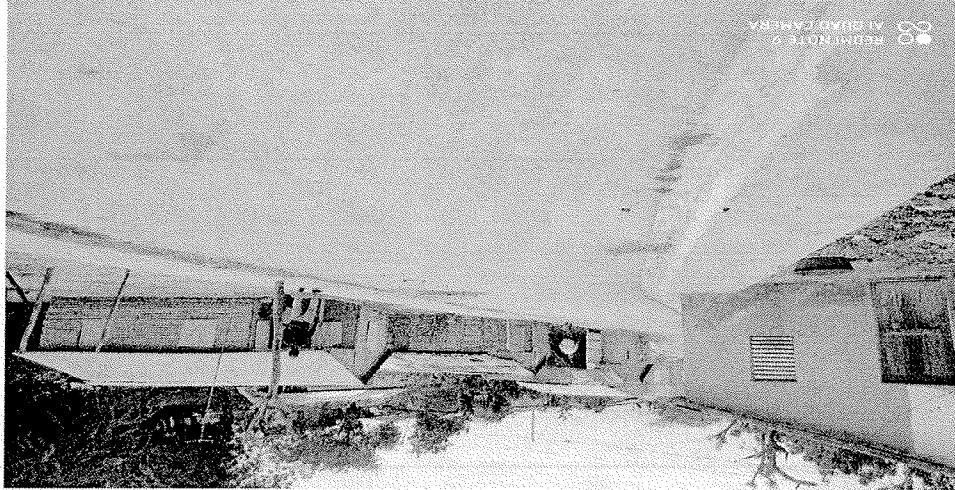


Suministra los datos de este reporte,

ING. STAYLIN MENDOZA

Técnico

CÉSAR DE LOS SANTOS

Técnico

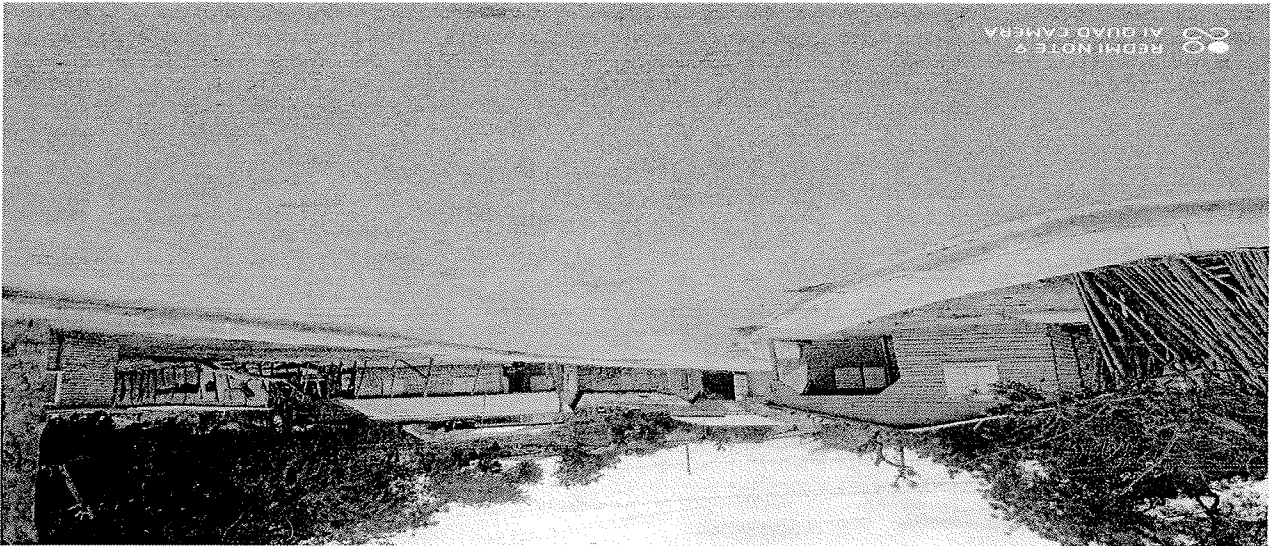

LIGA MUNICIPAL  
—DOMINICANA—

