



LIGA MUNICIPAL
—DOMINICANA—

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE AVANCE DE OBRA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 19 de octubre de 2022
 TÉCNICOS: 1. Arq. Zunilda Del Rosario
 2. Arq. Keilin Mora

CODIGO: 040103
 REGIÓN: ENRIQUILLO
 PROVINCIA: BARAHONA
 MUNICIPIO: BARAHONA
 DISTRITO MUNICIPAL: LA GUÁZARA

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE HERMANOS PUELO	51.61	1.05	1			54.1905	
TRAMO B	CALLE HERMANOS PUELO	16.30	1.05	2			34.23	
TRAMO C	CALLE JON N 1				71.20	2		142.4
TRAMO D	CALLE HERMANOS PUELO	195.00	1.03	1	69.70	2	200.85	139.4
TRAMO E	CALLE HERMANOS PUELO	5.20	0.94	1		1	4.888	0
TRAMO F	CALLE HERMANOS PUELO	17.10	0.90	2		1	30.78	0
TRAMO G	CALLE HERMANOS PUELO	7.00	1.27	2		1	17.78	0
TRAMO H	CALLE HERMANOS PUELO	27.45	1.14	2		1	62.586	0
TRAMO I	CALLE HERMANOS PUELO	47.70	1.05	2		1	100.17	0
TRAMO J	CALLE HERMANOS PUELO	54.50	1.04	1		1	56.68	0
TRAMO K	CALLE DUARTE	132.00	1.13	2		1	298.32	0
TRAMO L	CALLE RAMONA FELIZ				141	1		141
TRAMO M	CALLE EUGENIA GARO				92.8	2		185.6
TRAMO N	CALLE EUGENIA GARO				34.25	2		68.5
Total							860.47	676.90

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,811,766.33
 Monto desembolsado RD\$ 2,811,766.34 (100%)
 Avance de obra 101.10%



**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —**

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: ENRIQUILLO
PROVINCIA: BARAHONA
MUNICIPIO: BARAHONA
DISTRITO MUNICIPAL: LA GUÁZARA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 19 de octubre de 2022

INFORME DE AVANCE DE OBRA

A la fecha de 19/10/2022 se ha ejecutado 860.47 metros cuadrados de aceras y 676.90 metros lineales de contén, lo que corresponde al 101.1% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS


1. La ejecución de la obra esta bien realizada, aunque hay tramos rotos debido a vehículos pesados, hicimos conocimiento de eso al alcalde competente.

IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

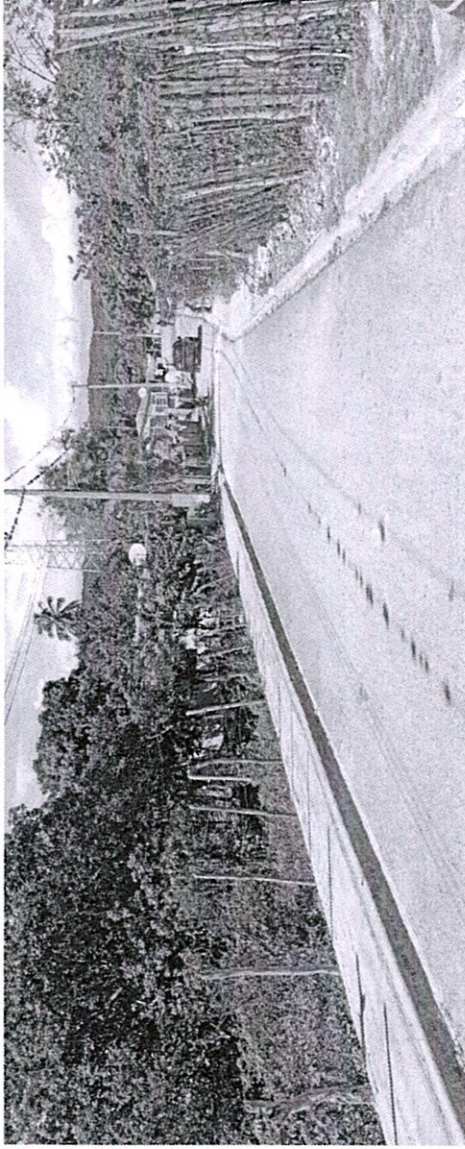

Suministra los datos de este reporte,


ARQ. ZUNILDA DEL ROSARIO

Técnico


ARQ. KEILIN MORA

Técnico

