



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE AVANCE DE OBRA

CODIGO: 040402
REGIÓN: ENRIQUILLO
PROVINCIA: BARAHONA
MUNICIPIO: PARAÍSO
DISTRITO MUNICIPAL: LOS PATOS


FECHA DE VISITA TÉCNICA: 2 de agosto de 2023

TÉCNICOS: 1. Ing. Staylin Mendoza
 2. César De Los Santos

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	OJEDA VIEJO				100.20	2.00		200.40
TRAMO B	CALLE DR. FRANCISCO PEÑA GOMEZ	70.00	1.00	1.00			70.00	
TRAMO C	MIRADOR LOS ENAMORADOS				89.30	2.00		178.60
TRAMO D	CALLE JOSE CARRASCO	36.90	1.00	1.00			36.90	
TRAMO E	CALLE JOSE FRANCISCO ESQ. JOSE CARRASCO	21.50	1.00	1.00	4.90	1.00	21.50	4.90
TRAMO F	CALLE JOSE FRANCISCO ESQ. JOSE CARRASCO	148.90	1.00	1.00			148.90	
TRAMO G	LA IGLESIA				103.90	2.00		207.80
TRAMO H	LIBRADO SAMBOI (DESTACAMENTO)				132.90	2.00		265.80
TRAMO I	CALLE MELLA (ARRIBA)				55.80	1.00		55.80
TRAMO J	OJEDA VIEJO	57.00	1.49	1.00			84.93	
TRAMO DL	OJEDA VIEJO	53.00	1.20	1.00			63.60	
TRAMO DM								
Total							425.83	913.30

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,057,198.63
 Monto desembolsado RD\$ 3,057,198.64 (100%)
 Avance de obra 95.02%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: ENRIQUILLO
PROVINCIA: BARAHONA
MUNICIPIO: PARÁISO
DISTRITO MUNICIPAL: LOS PATOS

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 2 de agosto de 2023


INFORME DE AVANCE DE OBRA


A la fecha de 02/08/2023 se ha ejecutado 425.83 metros cuadrados de aceras y 913.30 metros lineales de contén, lo que corresponde al 95.02% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS


1. Este proyecto fueron ejecutado por contrato.
2. Las aceras y contenes presentan una buena terminación.
3. Las aceras y contenes fueron ejecutadas en diferentes sectores.

IMÁGENES

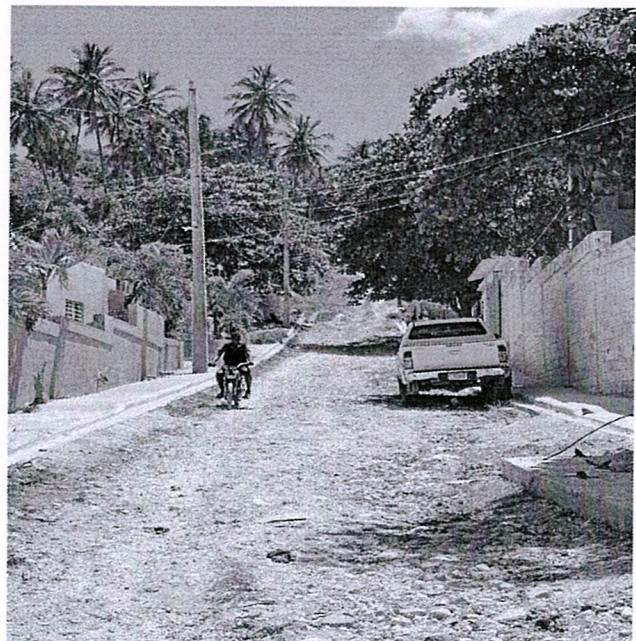




LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

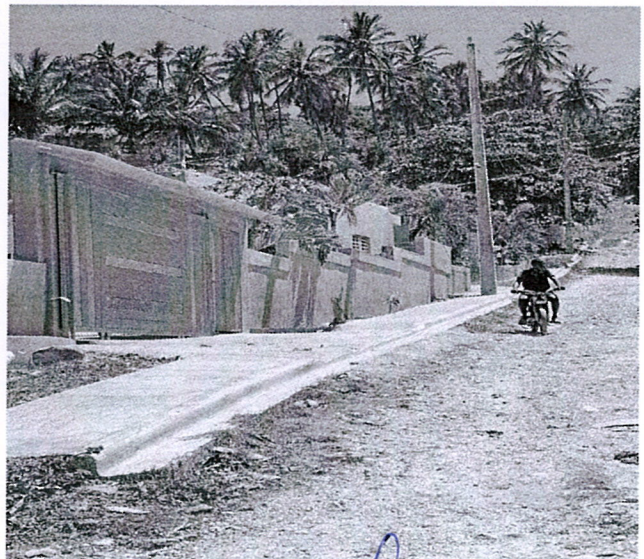

Suministra los datos de este reporte,


ING. STAYLIN MENDOZA
Técnico


CÉSAR DE LOS SANTOS
Técnico
