

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 040701

REGIÓN: ENRIQUILLO

PROVINCIA: BARAHONA

MUNICIPIO: LA CIÉNAGA

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 6 de febrero de 2023

1. Ing. Ana Indhira Rámirez

TÉCNICOS: 2. César De Los Santos

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	Sector calle C/ Abel Felix	108.30	1.00	2	127.55	2	216.6	255.1
TRAMO B	Entrando por el bar de Oniel				116.35	2		232.7
TRAMO C	Sector Fundaneca				151.40	2		302.8
TRAMO D	Sector Fundaneca				68.60	2		137.2
TRAMO E	Sector Fundaneca				75.15	2		150.3
TRAMO F	Sector Fundaneca				30.5	2		61
TRAMO G					123.2	2		246.4
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							216.60	1385.50


AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,081,167.05

Monto desembolsado RD\$ 1,540,583.53 (50%)

Avance de obra 125%

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 6 de febrero de 2023

REGIÓN: ENRIQUILLO
PROVINCIA: BARAHONA
MUNICIPIO: LA CIÉNAGA
DISTRITO MUNICIPAL: -


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 216,60 metros cuadrados de aceras y 1,385,50 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Este ayuntamiento construyó por contrato.
2. Este cumple con los parámetros recomendados.
3. En este levantamiento estuvo con nosotros el Ing. Joan Moreta (por orden del alcalde).

IMÁGENES

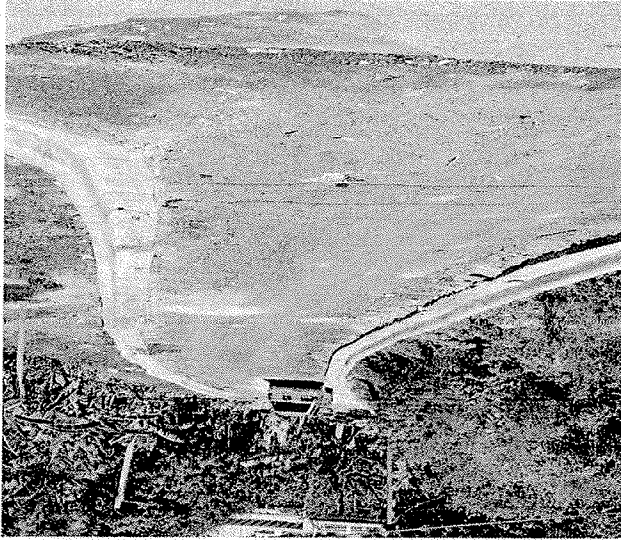



Suministra los datos de este reporte,

Ing. Ana Ramirez
ING. ANA INDIRA RAMIREZ

Técnico

César de los Santos
CÉSAR DE LOS SANTOS

Técnico

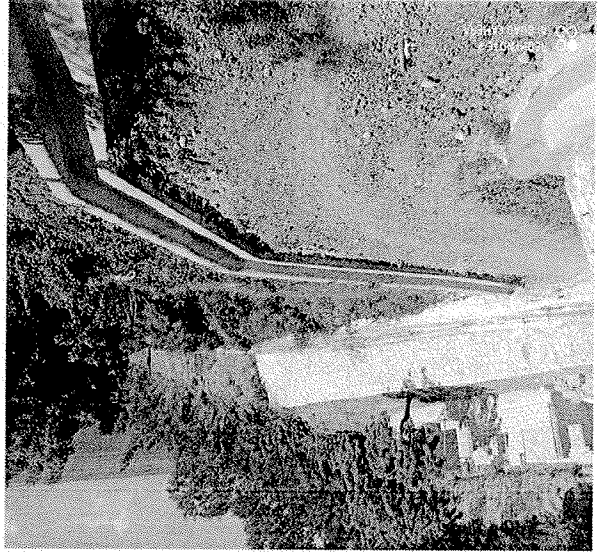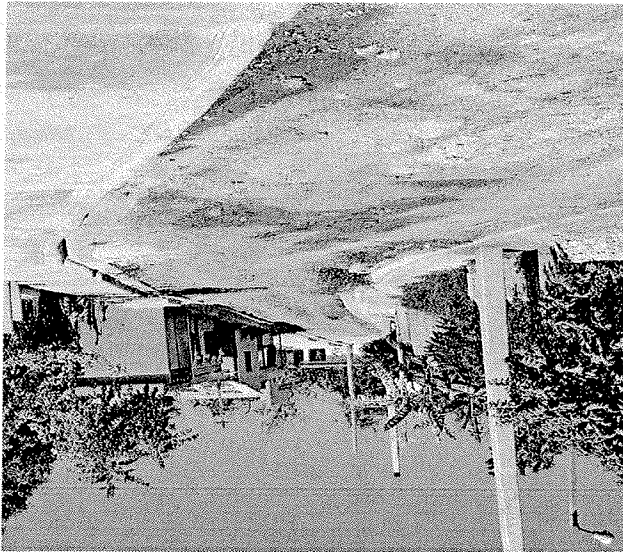

— DOMINICANA —
LIGA MUNICIPAL

