



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 28 de septiembre de 2022

1. Ing. Richard Cabrera

TÉCNICOS: 2. Ing. Asamín Ferreras

CODIGO: 050301

REGIÓN: CIBAO NOROESTE

PROVINCIA: DAJABÓN

MUNICIPIO: PARTIDO

DISTRITO MUNICIPAL: -

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,360,437.12

Monto desembolsado RD\$ 3,360,437.13 (100%)

Avance de obra 153.43%

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	PROYECTO 1				28.80	1		28.8
TRAMO B	PROYECTO 2				29.40	1		29.4
TRAMO C	PROYECTO 3				83.20	2		166.4
TRAMO D	PROYECTO 4				117.70	2		235.4
TRAMO E	TONGO CANDELA				42.3	2		84.6
TRAMO F	PROYECTO 1				35.5	2		71
TRAMO G	PROYECTO 2				58.25	2		116.5
TRAMO H	LA PRINCIPAL	154.40	1.00	2	154.4	2	308.8	308.8
TRAMO I	LA PRINCIPAL	64.75	1.00	2	136.35	2	129.5	272.7
TRAMO J	EL CERRO Y EL COJO				122.4	2		244.8
TRAMO K	EL CERRO Y EL COJO				20.9	2		41.8
TRAMO L	PAO				84.5	2		169
TRAMO M	PAO				29.8	2		59.6
TRAMO N								
Total							438.30	1828.80



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NOROESTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 28 de septiembre de 2022

PROVINCIA: DAJABÓN

MUNICIPIO: PARTIDO

DISTRITO MUNICIPAL: -



INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 438.30 metros cuadrados de aceras y 1,828.80 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. Se observó una buena terminación en los contenes y aceras.
2. En este municipio decidieron por hacer más contén, que aceras.

IMÁGE VES

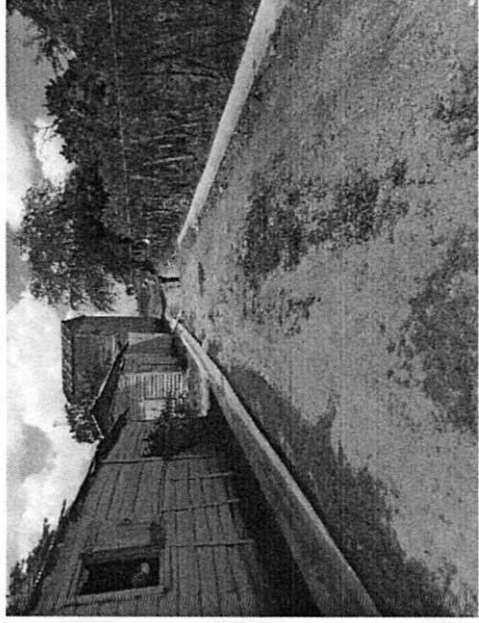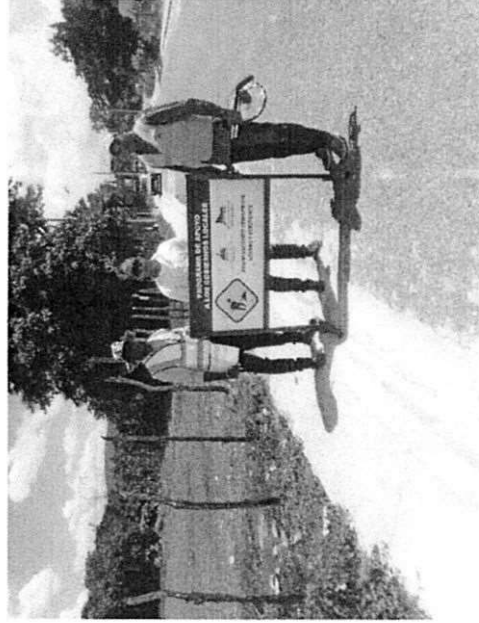



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

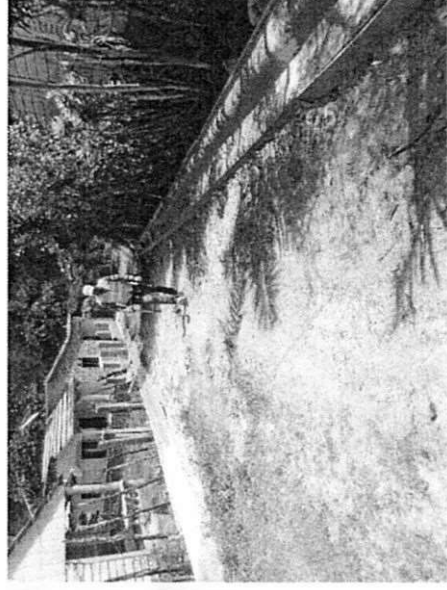

Suministra los datos de este reporte,

ING. RICHARD CABRERA

Técnico

ING. ASAMÍN FERRERAS

Técnico

