



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

**CODIGO:** 050401

**REGIÓN:** CIBAO NOROESTE

**PROVINCIA:** DAJABÓN

**MUNICIPIO:** RESTAURACIÓN

**DISTRITO MUNICIPAL:** -

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 11 de mayo de 2023

1. Ing. Ana Indhira Ramírez

**TÉCNICOS:** 2. César De Los Santos


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	Urb. Los Pinos C/ 1era				212.20	1.00		212.20
TRAMO B	Urb. Los Pinos C/ 2da				116.80	1.00		116.80
TRAMO C	Urb. Los Pinos C/ central				382.00	1.00		382.00
TRAMO D	Urb. Los Pinos C/ 3era				449.50	1.00		449.50
TRAMO E	Urb. Los Pinos C/ 4ta				84.40	2.00		168.80
TRAMO F								
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
<b>Total</b>							-	<b>1,329.30</b>

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,395,467.89

Monto desembolsado RD\$ 3,395,467.90 (100%)

Avance de obra 98.74%



# LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NOROESTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 11 de mayo de 2023

PROVINCIA: DAJABÓN

MUNICIPIO: RESTAURACIÓN

DISTRITO MUNICIPAL: -



## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado: .00 metros cuadrados de aceras y 1,329.30 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

### NOTAS



1. Los contenes ejecutados por el Ayto. cumplen con los parametros recomendados por la LMD.
2. Este ayuntamiento municipal construyó por contrato.
3. Solamente ejecutaron contenes, para aprovechar el asfaltado solicitado.

### IMÁGENES

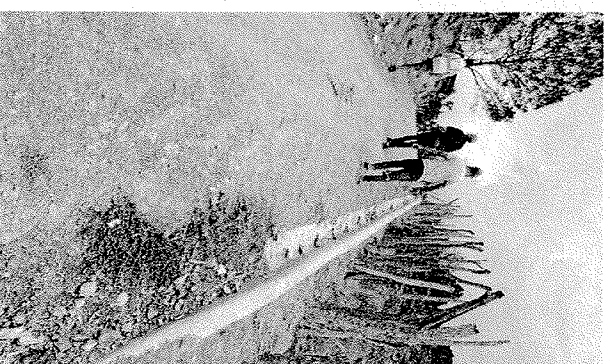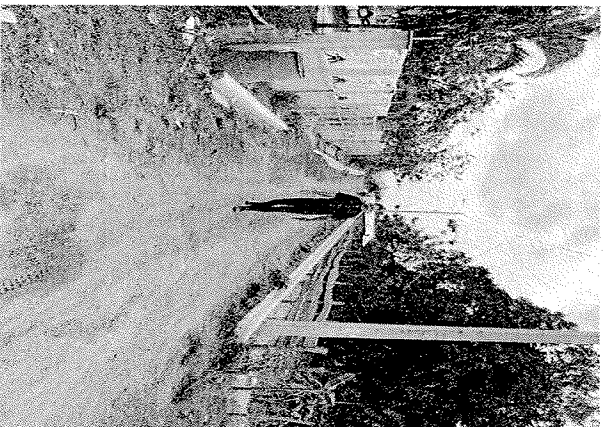





LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —

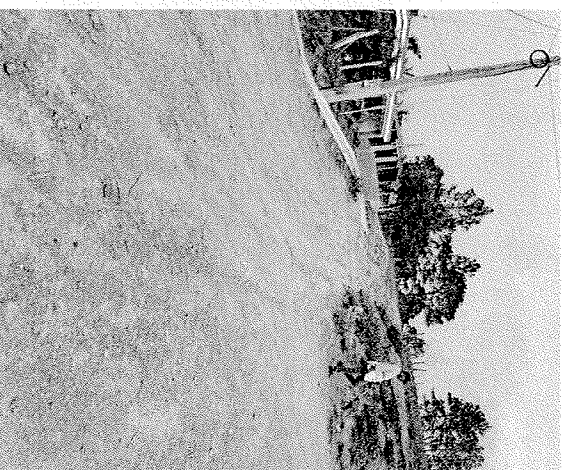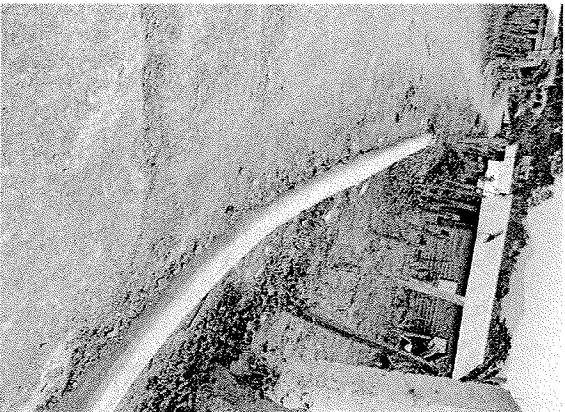

Suministra los datos de este reporte,

  
ING. ANA INDIRA RAMIREZ  
Técnico

  
CESAR DE LOS SANTOS  
Técnico
