



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 060105

REGIÓN: CIBAO NORDESTE

PROVINCIA: DUARTE

MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE MACORÍS

DISTRITO MUNICIPAL: PRESIDENTE DON ANTONIO GUZMÁN FERNÁNDEZ

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 9 de mayo de 2023


1. Ing. Danilo Mercado

TÉCNICOS: 2. César De Los Santos

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	Calle R	165.80	0.62	2.00	195.75	2.00	205.59	391.50
TRAMO B	C.Principal, Sector La Guama	250.00	1.00	1.00	250.00	1.00	250.00	250.00
TRAMO C	Entrada La Sabaneta	241.41	0.70	2.00			337.97	
TRAMO D	Casco Urbano(Alcaldía)	150.00	1.00	1.00	150.00	1.00	150.00	150.00
Total							943.57	791.50

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,365,534.48
Monto desembolsado RD\$ 3,365,534.48 (100%)
Avance de obra 100.07%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORDESTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 9 de mayo de 2023

PROVINCIA: DUARTE

MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE MACORÍS

DISTRITO MUNICIPAL: PRESIDENTE DON ANTONIO GUZMÁN FERNÁNDEZ


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 943.57 metros cuadrados de aceras y 791.50 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS




1. La obra se realizó por Administración del gobierno local.
2. Las aceras y contenes levantado cumplen con los estándares de calidad recomendado por el Programa.


IMÁGENES

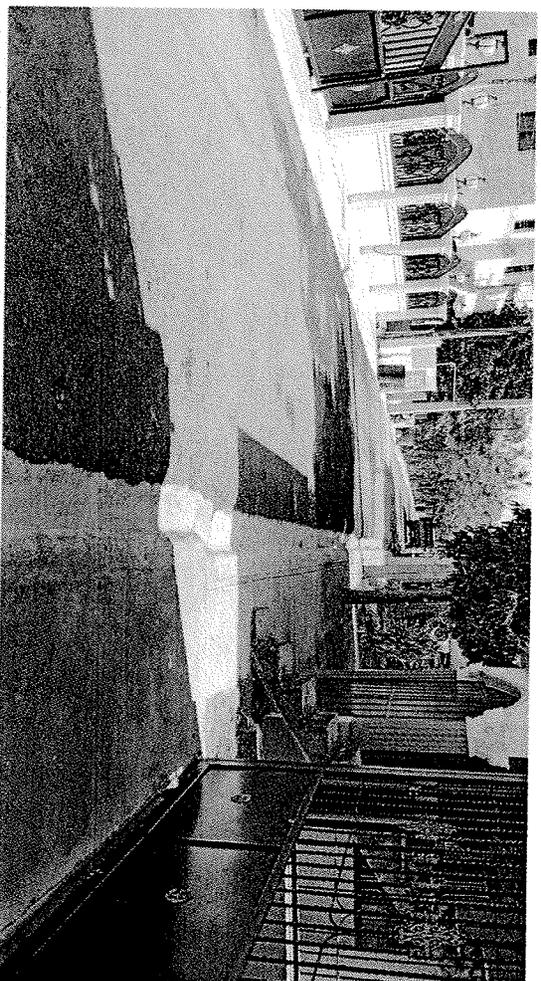




LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

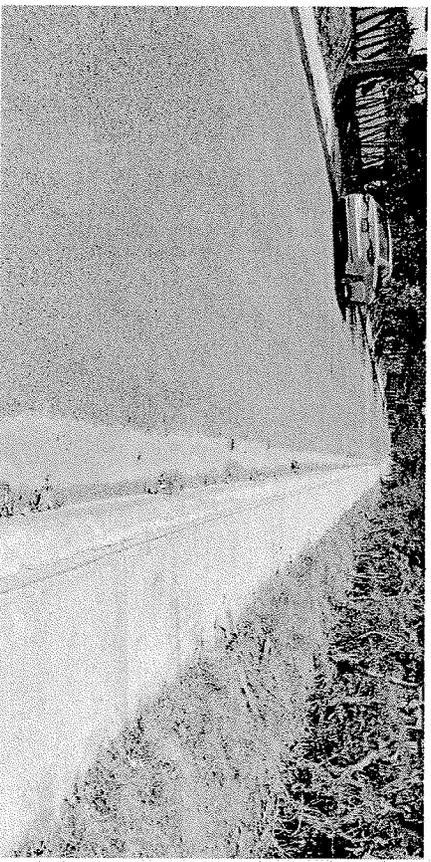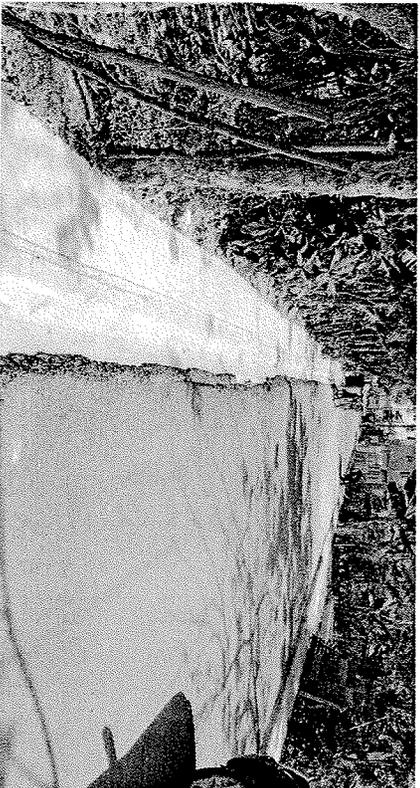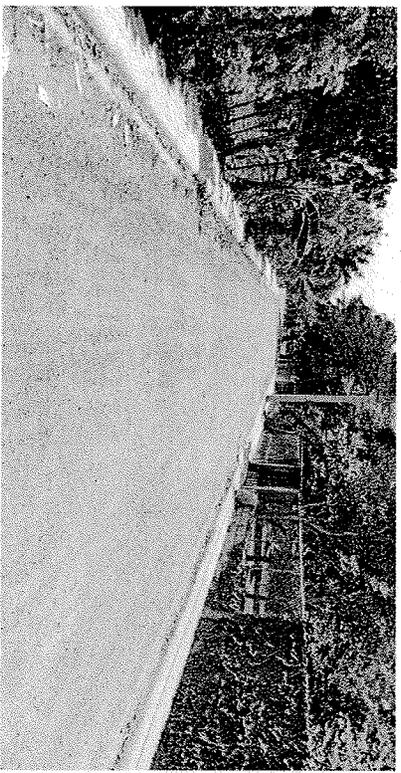





LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

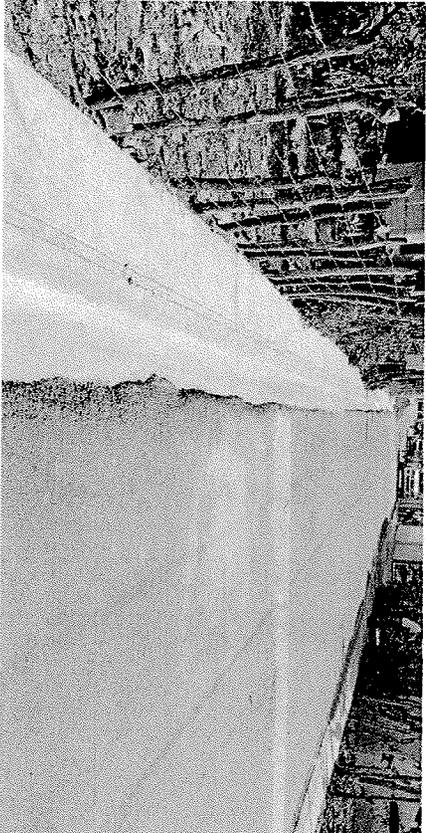

Suministra los datos de este reporte,


ING. DANILLO MERCADO
Técnico


CÉSAR DE LOS SANTOS
Técnico
